



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARauli NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№

5004478713

201 გ.

29.10.2013



5004478713

შპს „გზამშენი-18“-ს დირექტორს ბატონ თეიმურაზ
ჯახვას

(ოზურგეთი ს. შემოქმედი)

ბატონო თეიმურაზ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი
2013 წლის 17 სექტემბრის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1005230013) საფუძველზე, გიგზავნით
საინჟინრო ექსპერტიზის N004879513 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 04 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი ჩიკვაშვილი

ბიუროს უფროსი



004879513

ექსპერტის დასკვნა № 004879513

გაფრთხილება

კირიაც ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოინჟინერინგის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმუშრტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 188-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დანიშნუიი:

ორგანიზაცია: შპს „გზამშენი-18“

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ოზურგეთი ს. შემოქმედი

სახელი და გვარი: თეიმურაზ ჯახვა

საფუძველი: განცხადება

შესრულებული ექსპერტები:

გიორგი მამასახლისი / კირიაც ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოინჟინერინგის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 18 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გეგზავნით დოკუმენტაციას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზამშენი - 18“-ს შორის 2013 წლის 26 აგვისტოს №196 ბელშეკრულებით სოფ. ასკანაში ასფალტობეტონით გზის ორმოული შეკეთების სამუშაოების შესახებ ღირებულებით 12537.00 ლარი.

ვთხოვთ მოგვეცეთ დასკვნა აღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოს შესახებ. ანაზღაურება მოხდება მოქმედი ტარიფების შესაბამისად.

შემოხვლის თარიღი: 17.09.2013წ

გასვლის თარიღი: 29.10.2013წ

დასკვნა

შპს „გზამშენი - 18“-ს მიერ შესრულებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანაში გზის ორმოული შეკეთება ასფალტობეტონით სამუშაოების ღირებულება შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტის მიხედვით შეადგენს 12537,00 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ დღგ-ს ჩათვლით შეადგინა 12537,00 ლარი, რაც ემთხვევა შესრულებული სამუშაოების აქტში ნაჩვენებ ღირებულებას. (იხ. გამოკვლევა, ფოტოვილუსტრაცია და დანართი №1)

გიორგი მამასახლისი

Handwritten signature

გამოკვლევა



004879513

ექსპერტის დასკვნა № 004879513

ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში 2013 წლის 11 სექტემბერს შემოსული №1005230013 დოკუმენტით შპს „გზამშენი - 18“-ს დირექტორმა თეიმურაზ ჯახაევამ წარმოადგინა შპს „გზამშენი - 18“-ს მიერ შესრულებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანას გზის ორმოული შეკეთების სამუშაოების ფორმა №2 ღირებულებით 12537,00 ლარი.

ჩემს მიერ 2013 წლის 22 ოქტომბერს აღნიშნული ობიექტი ადგილზე იქნა შესწავლილი და შევასრულე აზომვითი სამუშაოები. მასალების ერთდროული ღირებულებები გათვალისწინებული იქნა ექსპერტიზის დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი შესყიდვითი მასალების დოკუმენტაციის მიხედვით. სამუშაოების წარმოების დროს შესრულებული ფარული სამუშაოები გათვალისწინებული იქნა ხარჯთაღრიცხვის და ფარული სამუშაოების აქტების მიხედვით. კვლევის პროცესში შესწავლილი იქნა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) და ფარული სამუშაოების აქტები. კვლევის შედეგად დადგინდა:

შპს „გზამშენი - 18“-ს მიერ შესრულებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანაში გზის ორმოული შეკეთება ამჟამინდურ მდგომარეობაში სამუშაოების ღირებულება შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) აქტის მიხედვით შეადგენს 12537,00 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ დღგ-ს ჩათვლით შეადგინა 12537,00 ლარი, რაც უმთხვევად შესრულებული სამუშაოების აქტში ნაჩვენებ ღირებულებას, (იხ. ფოტოვიდეოსტრატეგია და დანართი №1)

გიორგი მამასახლისი

გამოყენებული მასალები

- განცხადება.
- ხელშეკრულება.
- ხარჯთაღრიცხვა.
- შესრულებული სამუშაოთა აქტი (ფორმა №2).
- ფარული სამუშაოების აქტი.
- შესყიდვითი მასალების დოკუმენტაცია.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

ფორმა №2

დაამუშაო: თბილისის მუნიციპალიტეტი
კონტრაქტის დასახელება - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის
№ და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი
საკონტრაქტო ღირებულება: 12 537,00 ლარი და დასახელება: პროგრამის განხორციელების
განხორციელების მოხდომები: შ.პ.ს. „გაზაფხული“-ს მიერ

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

ქოზრგეთი

9 სექტემბერი 2013წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	ერთეულის საზღვრის ფარგლებში				შესრულებული სამუშაო	
			რაოდენობა		საბარჯიანი ღირებულება		რაოდენობა	ღირებულება
			განხ. ერთ.	საბარჯიანი მოსახლეობა	განხ. ერთ.	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	არსებული ან საფარის მოხსნა საბარჯი ნაკლებით	100 კმ²		0,046			0,046	
1.1	მშენებლობის დასახელება	კმ²	160	7,39	4,5	33,26	7,39	33,26
1.2	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	77,5	3,58	14,72	52,7	3,58	52,7
2	ტრანშის შექმნა ქვე-სარგისი ნარგვით	1000 კმ²		0,154			0,154	
2.1	მშენებლობის დასახელება	კმ²	55,8	8,593	4,5	38,67	8,593	38,67
2.2	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	25	3,85	10,17	39,15	3,85	39,15
3	ბიჭვების ქუჩის მოხსნა	1000 კმ²		0,154			0,154	
3.1	მშენებლობის დასახელება	კმ²	21,6	3,326	4,5	14,97	3,326	14,97
3.2	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	0,35	0,0539	12,50	67,38	0,0539	67,38
4	არსებული საფარის გასწორება და დატანა (სისქით 4 სმ)	1000 კმ²		0,154			0,154	
4.1	მშენებლობის დასახელება	კმ²	39,5	5,775	1,5	55,09	5,775	55,09
4.2	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	97,4	15	135,6	203,95	15	203,95
4.3	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	97,4	15	5,3	79,5	15	79,5
4.3	საბარჯი ნაკლებით	კმ²	16,78	2,584	20,54	53,08	2,584	53,08

5	გზის შემსხვრებელი ხაზების მოწოდება შემოტანითი ღირებულებით	1000 ადამ	19	19	19	19	19
5.1	ავტობუსები - 79 ადამ	166	31,54	26,45	834,23	31,54	834,23
5.2	ბრუნა		19	3	57	19	57
5.3	გზისკაფალი ღირებულება 0-40 წელი		180,5	10,17	1835,69	180,5	1835,69
5.4	გზისკაფალი ღირებულების და ხაზების ტრასის მოწოდება		199,5	14,35	2861,83	199,5	2861,83
5.5	კომპანია მსხვრეველი JCB ხაზისგან აღების მოწოდება 4500 და ხაზების ტრასის მოწოდება		23	32,44	746,12	23	746,12
5.6	ავტობუსების ღირებულება 7,000		24	17,52	420,48	24	420,48
	ჯამი				9194,00		9194,00
	გზისკაფალი ღირებულება 8%				735,52		735,52
	გზისკაფალი ღირებულება 7%				9929,52		9929,52
	გზისკაფალი ღირებულება 18%				695,07		695,07
	გზისკაფალი ღირებულება 18%				10624,59		10624,59
	გზისკაფალი ღირებულება 18%				1912,43		1912,43
	გზისკაფალი ღირებულება 18%				12537		12537

საქართველოს მთავრობის
გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განყოფილება



ფაქტობრივი

საქართველოს მთავრობის

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განყოფილება

ფაქტობრივი

საქართველოს მთავრობის

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განყოფილება

დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ. სკანაში გზის ორმოული შეკეთება ასფალტობეტონით
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი
 საკონტრაქტო ღირებულება: 12 537,00 ლარი დღ-გ-ს გათვალისწინებით
 გეგრადიური მოთვარადი: შ.პ.ს. „გზამშენი-18“ - ოზურგეთი თაყაშვილის ქ. №62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

ქობულეთი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით						შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის ხაზგარიშში პერიოდში	
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		რაოდენობა	ღირებულება ლარი	რაოდენობა	ღირებულება ლარი		
			განზ. ერთ.	საბოლოო მონაცემები	განზ. ერთ.	სულ						
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
1	არსებული აზ ხაზის მოხსნა ხანგრძლივად	100 კმ		0,046			0,046					
1.1	შრომითი დანახარჯები	ქ/სთ	160	7,39	4,5	33,26	7,39	33,26	7,39	33,26		
1.2	ხანგრძლივად ნაქონი	მ/სთ	77,50	3,58	14,72	52,70	3,58	52,70	3,58	52,70		
2	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი	1000 კმ		0,154			0,154					
2.1	შრომითი დანახარჯები	ქ/სთ	55,8	8,593	4,50	38,67	8,593	38,67	8,593	38,67		
2.2	ფრაქციული ღირდი	კმ	25,00	3,85	10,17	39,15	3,85	39,15	3,85	39,15		
3	ბეტონის ემულსიის მოხსნა	1000 კმ		0,154			0,154					
3.1	შრომითი დანახარჯები	ქ/სთ	21,60	3,326	4,50	14,97	3,326	14,97	3,326	14,97		
3.2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა ხელით	ღ	0,35	0,0539	1250,00	67,38	0,0539	67,38	0,0539	67,38		
4	აზ ხაზის გაწორება და დატყვანა (სიქით 4 სმ)	1000 კმ		0,154			0,154					
4.1	შრომითი დანახარჯები	ქ/სთ	37,50	5,775	4,50	25,99	5,775	25,99	5,775	25,99		
4.2	აზ ღირებულება	ღ	97,40	15,000	135,60	2033,95	15,000	2033,95	15,000	2033,95		
4.3	აზ ტრენსპორტირება	ღ	97,40	15,000	5,30	79,50	15,000	79,50	15,000	79,50		
1	საბოლოო ხაზით თეომატული (10 გ) გზის შემსწორებული ხაზის მოწყობა შემოტანილი ღირდით	1000 კმ		19,00			19,00					
1.1	აგორებული 79 კმ	მ/სთ	166	31,540	26,45	834,23						
	სრული	კმ		19,00	3,00	57,00						

9 სექტემბერი 2013წ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ფრაქციული ღირსი 0-40 მმ	კმ	9,50	180,50	10,17	1835,69	75	762,75	75	762,75
2.1	ფრაქციული ღირსი და ხრეშის ტრანსპორტირება 20კმ	კმ	9,50	199,50	14,35	2861,83	75	1076,25	75	1076,25
3	კომპანიი ექსკავატორით JCB სახალაგრე არხების მოწყობა 450მ და ზედაპირი გრუნტის ავტომობილებზე დატვირთვა	მ/თ		23,00	32,44	746,12	23,00	746,12	23,00	746,12
4	ავტოთვიმცვლელი 7კმ	მ/თ		24,00	17,52	420,48	24,00	420,48	24,00	420,48
	ჯ ა მ ა	ღარი				9194,00		5444,25		5444,25
	ზედათაგაი ხარჯები 8%	ღარი				735,5		435,54		435,54
	ჯ ა მ ა	ღარი				9929,5		5879,79		5879,79
	კაპიტალი დაგროვება 7%	ღარი				695,1		411,59		411,59
	ჯ ა მ ა	ღარი				10624,6		6291,38		6291,38
	დ. დ. ბ. - 18%	ღარი				1912,4		1132,45		1132,45
	ჯ ა მ ა	ღარი				12537,00		7423,83		7423,83

= დამკვეთი =

= მამწოდებელი =

ინსტრუქტორი, პირილი ჯაფარი

პირი უმჯობესი

უფროსი უფროსი

რამა უფროსი

ხუბერაძე

შ.პ.ს. „გ. ზაქარიაშვილი“-ს

დირექტორი:

თ. ზაქარიაშვილი



დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ. ასკანა (ქვერი) შიგა გზების შეკეთება
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აპრილი 2013 წელი
 საკონტრაქტო ღირებულება: 7 799,00 ლარი დღ.გ.-ს გათვალისწინებით
 გაქვრალური მოთვარადრე: შ.პ.ს. "გამშენი-18" - ოზურგეთი თავისუფლის ქ. №62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

9 სექტემბერი 2013წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	ლიტერატურა
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		რაოდენობა	ლიტერატურა ლარი		
			განხ. ერთ.	საპროექტ. მონაცემები	განხ. ერთ.	სულ				
1	2	3					8	9	10	11
1	გზის შემასწორებელი საფარის მოწყობა შემოტანილი ღირებით საშუალო	100 კმ		17.790			17.790		17.790	
	ავტოგრიდები 79 კმ	მ/სთ	1.66	29.531	26.45	781.11	29.531	781.11	29.531	781.11
	ხრეში			30.000	3.00	90.00	30.000	90.00	30.000	90.00
	ფრაქცული ღირები 0.40მმ	კმ	10.118	180.00	10.17	1830.59	180.00	1830.59	180.00	1830.59
	ფრაქცული ღირების ტრანსპორტირება 20კმ	კმ	10.118	210.00	14.37	3017.69	210.00	3017.69	210.00	3017.69
	ჯამით	ლარი				5719.4		5719.4		5719.4
	შეღებადები ხარჯები 8%	ლარი				457.6		457.6		457.6
	ჯამით	ლარი				6176.9		6176.9		6176.9
	გამდირი დავრთვება 7%	ლარი				432.4		432.4		432.4
	ჯამით	ლარი				6609.3		6609.3		6609.3
	დ. ღ. გ. - 18%	ლარი				1189.7		1189.7		1189.7
	ჯამით	ლარი				7799		7799		7799

= მიმწოდებელი =

შ.პ.ს. "გამშენი-18" სს

დირექტორი:

თ. ჯიბიაძე

დამკვეთი =
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 მერის მოვალეობა
 დ. ღ. გ. - 18%
 ჯამით

დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ.აკანა (მზიანი) შიგა გზების შეკეთება
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი
 საკონტრაქტო ღირებულება: 8 433,00 ლარი დ.დ.გ-ს გათვალისწინებით
 გენერალური მოთვარადე: შ.პ.ს. "გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18" - ოზურგეთი თაქსიშვილის ქ.№62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

კომპანია

№	სამუშაოს დასახელება	განხ. კრთ.	გათვალისწინებული კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		რაოდენობა	რაოდენობა	ღირებულება ლარი	მათ შორის საანგარიშო პერიოდში
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო დირექტულები		რაოდენობა	ღირებულება ლარი				
			განხ.კრთ.	საპროექტ. მონაცემები	განხ.კრთ.	სულ						
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3		15.100			15.100		15.100			
1	გზის შემასწორებელი საფარის მოწყობა შემოტანილი ღირდით საშუალო სისქით	100 კმ										
	აკრედიტებული 79 კმ	მ/სთ	1.66	25.066	26.45	663.00	25.066	663.00	25.066		663.00	
	ხრეში			130.000	3.00	390.00	130.000	390.00	130.000		390.00	
	ფრაქციული ღირდი 0.40მმ	კმ	8.80	132.88	10.17	1351.39	132.88	1351.39	132.88		1351.39	
	ფრაქციული ღირდის ტრანსპორტირება 20კმ	კმ	8.80	262.88	14.37	3780.21	262.88	3780.21	262.88		3780.21	
	გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18	ლარი				6184.6		6184.6			6184.6	
	ზედხადები ხარჯები 8%	ლარი				494.8		494.8			494.8	
	გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18	ლარი				6679.4		6679.4			6679.4	
	გამართული ღირებულება 7%	ლარი				467.6		467.6			467.6	
	გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18	ლარი				7146.9		7146.9			7146.9	
	დ.დ.გ. - 18%	ლარი				1286.4		1286.4			1286.4	
	გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18	ლარი				8433		8433			8433	

= დამკვეთი=

= მიმწოდებელი=

შ.პ.ს. "გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18"
 დამკვეთი
 ხელმოწერა
 დამკვეთი

შ.პ.ს. "გ.ზ.მ.შ.პ.ს.-18"

დირექტორი:

დირექტორი:

კონტრაქტის დასახელება:
და ხელმოწერის თარიღი:
საკონტრაქტო ღირებულება:
დამკვეთი:
შემსრულებელი:

სოფ.სკანაში მდებარე ხეის მოაჯირის შეკეთება
№196 - 26.08.2013წ.
820.80 ლარი დღ-ს გათვალისწინებით
თბილისის მუნიციპალიტეტი
შ.პ.ს. "გ.ზამქერი-18" თბილისი - თაბაგეთი - თაბაგეთის ქ.№62

შესრულებული სამუშაოს შედეგის
აქტი

16 სექტემბერი 2013წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	გათვალისწინებული კონტრაქტით						შესრულებული ფაქტურად									
			რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი			ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	არმატურის მოწყობა ა-12მმ	კვ/მ	40,00	1,1	44,4	2,0	80,0	0,1	4,0	128,4	40,0	1,1	44,4	2,0	80,0	0,1	4,0	128,4
	გლასჟელა 6,5-8მმ	კვ/მ	20,00	0,3	6	2,0	40,0	0,1	2,0	48,0	20,00	0,3	6	2,0	40,0	0,1	2,0	48,0
	ინდივიდუალური კარგების მოწყობა სახელმწიფო სამსახურების	ცალი	7,00	4,0	28	4,0	28,0	0,5	3,5	59,5	7,00	4,0	28	4,0	28,0	0,5	3,5	59,5
	კარგების მოწყობის ხარჯების დაზღვევითი ხარჯების აღსაფასებლად	კვმ	0,12	350,0	42	80,0	9,6	18,1	2,2	53,8	0,12	350,0	42	80,0	9,6	18,1	2,2	53,8
	დ=57 მმ ფილაის მითი	კვ/მ	28,00	5,1	142,8	1,0	28,0	0,5	14,0	184,8	28,00	5,1	142,8	1,0	28,0	0,5	14,0	184,8
	ბეტონის მოწყობის ღირებულება	კვმ	0,70	104,00	72,8	60,0	42,0	18,1	12,7	127,5	0,70	104,00	72,8	60,0	42,0	18,1	12,7	127,5
	ჯამი				336		227,6		38,4	602,0			336		227,6		38,4	602,0
	ჯამი									48,2								48,2
	ხელფასები ხარჯები 8%									650,1								650,1
	ჯამი									45,5								45,5
	ბეტონური დაფორმება 7%									695,6								695,6
	ჯამი									125,21								125,21
	დ. დ. ბ - 18 %									820,80								820,80
	ჯამი																	

= სამუშაო მიღო =

= სამუშაო ჩააბარა =

ინსპექტორის მოძღვარი

შ.პ.ს. "გ.ზამქერი-18"-ს

პატივით

ფოტო (კვლევა)

დირექტორი:

თვითმკურნალობა



[Signature]

[Signature]

ლ. პ. პ. - ლაშა ფორცხაძე

რეზონანსი

ქ. ოზურგეთი

01.11.2013 წ.

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. შ.პ.ს „გზამშენი-18“ მომართვა (რეგისტრირებული 31.10.13 N3332), 26.08.13 N 196 ხელშეკრულებით (სახელშეკრულებო თანხა 29589.80 ლარი) გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების ინსპექტირებისა და ანაზღაურების შესახებ

ინსპექტირების ჯგუფი:

- პაატა ვაშალომიძე(ჯგუფის უფროსი)
- ფილიპე ცელაძე (ჯგუფის წევრი)
- ლაშა ფირცხალაშვილი(ჯგუფის წევრი)
- პავლე მესხიშვილი(ასკანის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული)
- რევაზ გუდაძე (მოწვეული სპეციალისტი)

ინსპექტირების აქტი:

ინსპექტირების ობიექტი ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

1.ასკანის თემში(სოფ.ასკანა) გზის ორმული შეკეთება ასფალტობეტონით მოცულობა შესაბამემა წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 12537 ლარს (იხ. დანართი N 2) რაც იგივე დასტურდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით N004879513

26.08.2013 N 196 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო
შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 29589 (ოცდაცხრაათასხუთასოთხმოცდაცხრა)
ლარს.

ინსპექტირების ჯგუფი:


- პაატა ვაშალომიძე

- ფილიპე ცელაძე

- ლაშა ფირცხალაშვილი

- პავლე მესხიშვილი


-რევაზ გუდაძე

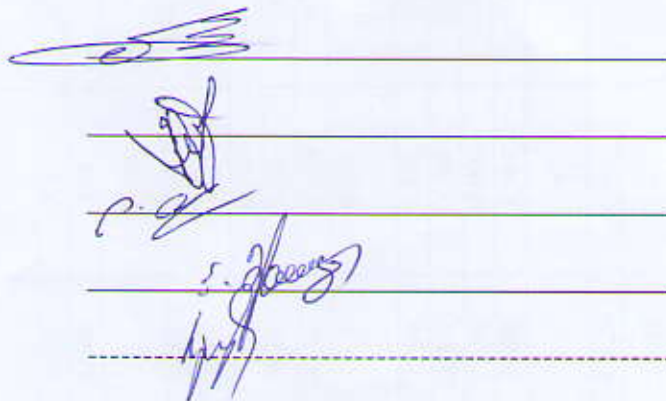

Handwritten signatures of the inspection team members on lined paper.

შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

- თემურ გიორგაძე



Handwritten signature of the person who checked the act.

მიღება ჩაბარების აქტი N 196-3

ქ. ოზურგეთი

04.11.2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღურჯუმელიძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „გზამშენი-18“-ის დირექტორი თეიმურაზ ჯახვა ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 26.08.2013 წ. N196 ხელშეკრულების შესაბამისად და 01.11.2013 წ. N 196-3 ინსპექტირების აქტის საფუძველზე შ.პ.ს „გზამშენი-18“-ის დირექტორმა თეიმურაზ ჯახვამ შეასრულა, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 29589 ლარს

ჩაებაბარე:

თ. ჯახვა



მივიღე :

გ. ღურჯუმელიძე



საბიუჯეტო კოდი 03 04	დასახელება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
ვალდებულების N 2697	მოთხოვნის საფუძველი მიღება-ჩაბარების აქტი
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი: დასახელება: სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	N 196-3 01.11.2013
თანხა ლარებში: 11835,8	თანხა სიტვიერად: თერთმეტი ათას რვაასოცდათხუთმეტი ლარი და 80 თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: დასახელება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	237112799
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი N) დასახელება: შპს გზამშენი 18	237081206
მიმღების ბანკის კოდი: დასახელება: სს "პროგრედიტ ბანკი"	MIBGGE22
ანგარიშის N GE34PC0463600100001256	საბიუჯეტო შემოსულობის სახაზინო კოდი:
გადახდის დანიშნულება:	

პასუხისმგებელი პირი

შემსრულებელი

შემმოწმებელი

თარიღი:

14.11.2013

ბ.ა.

საგადახდო დავალება N 5269

14 ნოემბერი 2013 წ.

გადამხდელი
თბილისის მუნიციპალიტეტი

237112799

გადამხდელის ანგარიში

GE19VT4300000011063303

გადამხდელის ბანკი ვითიბი ჯორჯია თბილისის ფილიალი

ბანკის კოდი

UGEBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადახდის გადახედვებზე
დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი

მიმღები

გზამკენი-18 შპს

237081206

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE34PC0463600100001256

მიმღების ბანკ/სახაზინა პროკრედიტბანკი

ბანკის კოდი

MIBGGE22

გადახდის დანიშნულება
სოფლის პროექტიდამატებითი ინფორმაცია
ხელმ #196

თ ა ნ ხ ა

11835.80

თანხა სიტყვებით

თერთმეტი ათას

რვაასოცდათხუთმეტი ლარი - 80


თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შეძენის თარიღი:

ხელმოწერა:



ხელმოწერები:

ბ. ა.

თარიღი:

14.11.2013

ბ.ა.
