

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-02 8771310

3 ივლისი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 18 ივლისი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 2 4 5 5 2 5 1 3 2
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გზა
დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 4 5 5 3 8 3 3 3
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აჭარის არ მთავრობის საქვეუქ. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და
სამედიკამენტო სასაწყობო მართვის დეპარტ.

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება (თანახმად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტისა #1, 01/07/2014, ხელშეკრულება #51, 25/03/2014)	მომსახურება		30390,9600	4635,9100	0,0000
სულ			30390,96	4635,91	0

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

მ ი ღ ე ბ ა - ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი ს

ა ქ ტ ი

ქ. ბათუმი

107 ივნისი, 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ, შპს "გზა"-ს დირექტორი მალხაზ დუმბაძე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შპს "გზა"-მ 2014 წლის 25 მარტის №51 ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზა „მუხაესტატი-ალამბარი-აჭყვისთავი“ კმ.0+900 - მონაკვეთზე ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები დაასრულა. სამუშაოები შესრულებულია აქტის (ფორმა - №2) შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

“შემსყიდველი”

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრები:

“მიმწოდებელი”

შპს "გზა"-ს დირექტორი

ს. დუმბაძე

ა. გაბაიძე

რ. ბოლქვაძე

ნ. კილაძე

მ. დუმბაძე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმეუწევრო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამედიოორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

მიმდინარე შეკეთება, ზამთრის შენახვა, პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია
(საჭირო სამუშაოების სახეობა მოინიშნოს სახით)

კონტრაქტის დასახელება და ხელმოწერის თარიღი

საავტომობილო გზა: „საავტომობილო გზა „მუხახესტაბელამბარო-აჭყვისტავე კმ0+900“. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №51, 25 მარტი, 2014 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება

30391 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

გენერალური მოიჯარადის დასახელება და მისამართი

შპს "გზა". ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №51

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი №1

1 თველის, 2014 წელი

№	სამუშაოს სახეობა	განზომ. ერთეული	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდო ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
			რაოდ.-ბა	ერთეულის ღირებულება, ლარი	მოდიანი ღირებულება, ლარი	რაოდ.-ბა	ღირებულება, ლარი	რაოდ.-ბა	ღირებულება, ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა L=22,0მ h=2,0-2,8მ										
1	ნგ ჯგ IV გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვითმცვლელზე	1000 კმ	0,165	1300,00	214,5	0,165	214,50	0,165	214,50	
2	ნგ ჯგ IV გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კმ	0,25	1430,00	357,5	0,250	357,50	0,250	357,50	
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 1 კმ-ზე	ტმ	332,5	1,50	498,75	332,500	498,75	332,500	498,75	
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 კმ	0,230	140,00	32,2	0,230	32,20	0,230	32,20	
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100 კმ	0,07	3430,00	240,1	0,070	240,10	0,070	240,10	
6	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100 კმ	0,4130	17700,00	7310,1	0,413	7310,10	0,413	7310,10	

7	კმდლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100 კმმ	0,4600	17850,00	8211	0,460	8211,00	0,460	8211,00
8	კლასმასის საღრენაჟო მილი დ=100მმ	გრძ.მ	9,00	4,84	43,56	9,000	43,56	9,000	43,56
9	ორფენიანი პიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 კმმ	0,700	610,00	427	0,700	427,00	0,700	427,00
10	ხრეშოვანი გრუნტის (ბალასტის) ექსკავტორით ჩაყრა და მოსწორება	1000 კმმ	0,220	27400,00	6028	0,220	6028,00	0,220	6028,00
ჯამი:					23362,71		23362,71		23362,71
ზედნაღები ხარჯები 6%:					1401,76		1401,76		1401,76
ჯამი:					24764,47		24764,47		24764,47
გემიური დაგროება 4%:					990,58		990,58		990,58
ჯამი:					25755,05		25755,05		25755,05
დღგ 18%:					4635,91		4635,91		4635,91
მთლიანი ღირებულება:					30390,96		30390,96		30390,96

საავტომობილო გზებისა და სამედიოორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ტექნიკური ზედამხედველი:

107.2015-5.  ნ. კელაძე

საავტომობილო გზებისა და სამედიოორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ტექნიკური ზედამხედველი:

 რ. ბოლქვაძე

გენერალური მოიჯარაღე: შპს "გზა"

ღირებულორი  მ. ლაშვილი





№ 01/10-138

18 07 2014 წ.

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო

სისტემების მართვის დეპარტამენტის

უფროსს ბატონ კახა შაშიკაძეს

ბატონო, კახა

როგორც მოგეხსენებათ 2014 წლის 25 მარტს შპს „გზა“-სა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს შორის, გაფორმდა ხელშეკრულება №51.

აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოებიდან გამომდინარე გაცნობებთ შემდეგს.

თქვენთვის ცნობილია რომ, ზემოხსენებულ ხელშეკრულებაზე, შპს „გზა“-ს დაქირავებული ყავს ქვეკონტრაქტორი შპს „ავტოგზა“ რომელიც უშუალოდ ასრულებს სამუშაოებს.

- ზემოხსენებული ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 30391 ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 30390,96 ლარს;
- ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს 28 090 ლარს, შპს „გზა“-სა და შპს „ავტოგზას“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულება კი 28 090 შესაბამისად:

1. სხვაობა დღე-ში შეადგენს $4635,91 - 4284,92 = 350,99$ ლარს;
2. შპს „გზა“-ს მიერ გადახდილი ექსპერტიზის დასკვნის საფასური შეადგენს 1235,96 ლარს;
3. შპს „გზა“-ს მიერ გაწეული საზედამხედველო ხარჯები და მოგება 714,01


დანართი 1: ექსპერტიზის დასკვნის საფასურის გადახდის ქვითარი;

დანართი 2: საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

პატივისცემით,

შპს „გზა“-ს

დირექტორი: მალხაზ დუმბაძე



იურიდიული მისამართი: საქართველო, აჭარა, 6010 ლუკა ასათიანის ქ. №51;

(ფაქსი): +995 422 22-22-22; ფაქსი: +995 422 22-33-33


JURIDICAL ADDRESS: 51 STR. LUKA ASATIANI 6010 BATUMI, GEORGIA,

BATUMI. TEL. (FAX): + 995 422 22-22-22; + 995 422 22-33-33; E-MAIL: GZABATUMI@MAIL.RU



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

ექსპერტიზის დასკვნა



WWW.EXPERTIZA.GOV.GE

გ



ს ა ი ა ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ რ ა უ ლ ი ს სა ხ ე ლ ო ბ ი ს სა ს ა მ ა რ თ ლ ო ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ უ ლ ი ბ ი უ რ ო

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№

5003231014

201

17/07/2014



5003231014

შპს „გზა“-ს წარმომადგენელს ბატონ არჩილ ბასილაძეს

(რეგიონი არაა განსაზღვრული)

ბატონო არჩილ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი 2014 წლის 2 ივლისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1004198114) საფუძველზე, გიგზავნით ის N003686214 დასვენას.

დამართი:

ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლადა;

პატონისგან

ტარიელ გიორგაძე

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე



003686214

ექსპერტის დასკვნა № 003686214

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეძარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს „გზა“

თანამდებობა: წარმომადგენელი

მისამართი: რეგიონი არაა განსაზღვრული

სახელი და გვარი: არჩილ ბასილაძე

საღმრთელი: განცხადება

შესრულებული ექსპერტები:

ბიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. კაბოვთ ჩატარით ექსპერტიზა და დაადგინოთ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება წარმოდგენილი ფორმა #2-ს მიხედვით.

შეძახვის თარიღი: 02.07.2014წ

გასვლის თარიღი: 17.07.2014წ

დასკვნა

შ.პ.ს. „გზა“-ს მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხაესტატე-ალამბარი- აჭყვისთავ-ში სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი-ს მიხედვით დ.გ.-ს გათვალისწინებით შეადგენა 28090,0 ლარს, რომელიც შედგება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

იხ. დანართი N 1- 02 ფურცლად.

იხილეთ კვლევითი ნაწილი.

ბიძინა მურადაშვილი

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია შ.პ.ს. „გზა“-ს მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხაესტატე-ალამბარი- აჭყვისთავ-ში საყრდენი კედლის სამშენებლო სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევე ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული



003686214

ექსპერტის დასკვნა № 003686214

მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

2014 წლის 11 ივნისს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა, დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები. იმ სამუშაოებზე, რომლებიც განეკუთვნებიან ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებზედაც არ იქნა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულია წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. მაგრამ აღსანიშნავია ის რომ სამუშაო რომელზედაც დანიშნულია ექსპერტიზა უმეტესად წარმოადგენს ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, ხოლო წარმოდგენილ ფარულ სამუშაოთა აქტებში დაფიქსირებული მოცულობები ემთხვევა შესრულებულ სამუშაოში დაფიქსირებულ მოცულობას, ექსპერტიზის წინაშე წარმოდგენილ იქნა მასალთა შესყიდვების დოკუმენტაცია და ამ მასალთა შესყიდვების დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული მასალთა ერთეული ღირებულებები ემთხვევა შესრულებულ სამუშაოთა აქტში დაფიქსირებულ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს.

იხ დანართი N1.

შპს „გზა“-ს მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მუხავესტატე-ალამბარი- აჭყვისთავ-ში სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი-ს მიხედვით დ.გ.-ს გათვალისწინებით შეადგენს 28090,0 ლარს, რომელიც შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 1- 02 ფურცლად.

ბიძინა მურადაშვილი

გამოყენებული მასალები

გარეგნულად .

შესრულებული სამუშაოების აქტი.

მასალთა შესყიდვების დოკუმენტაცია .

ფარულ სამუშაოთა აქტები.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე


ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



003686214

ექსპერტის დასკვნა № 003686214

ფოტოილუსტრაცია

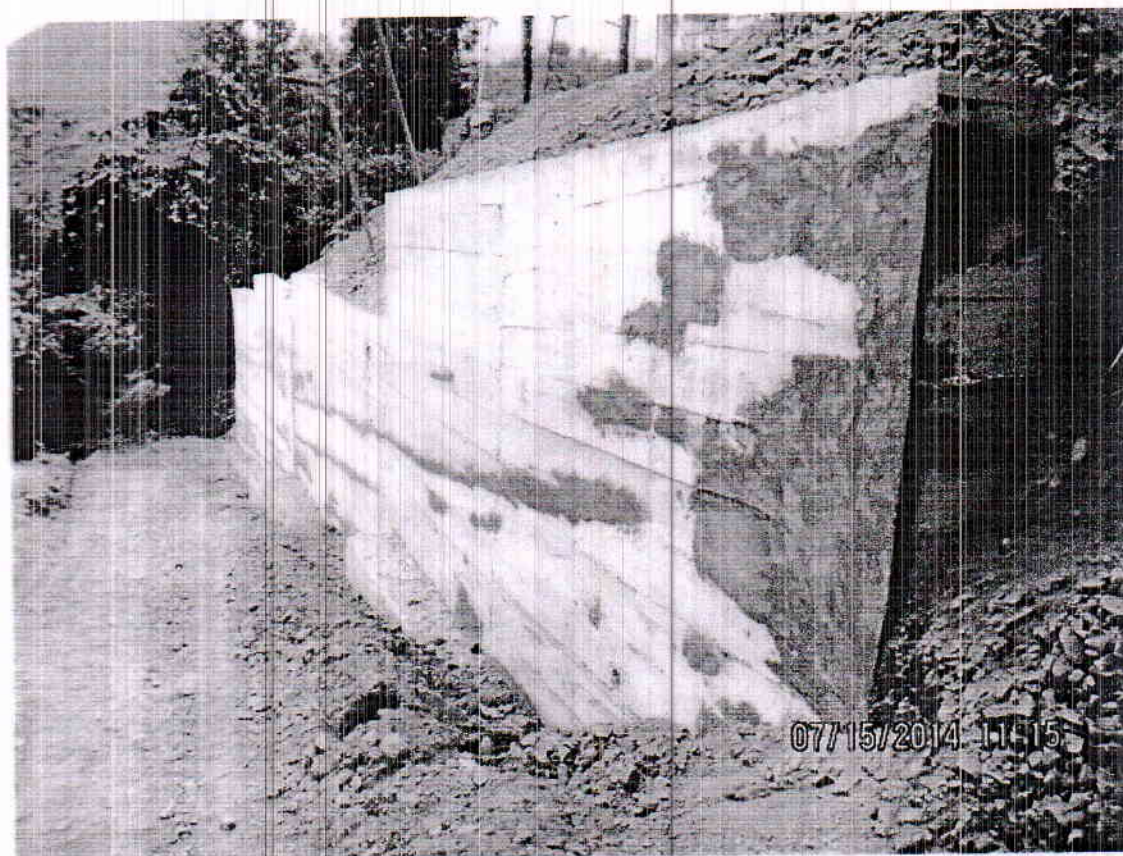


ფოტო 1



003686214

ექსპერტის დასკვნა № 003686214

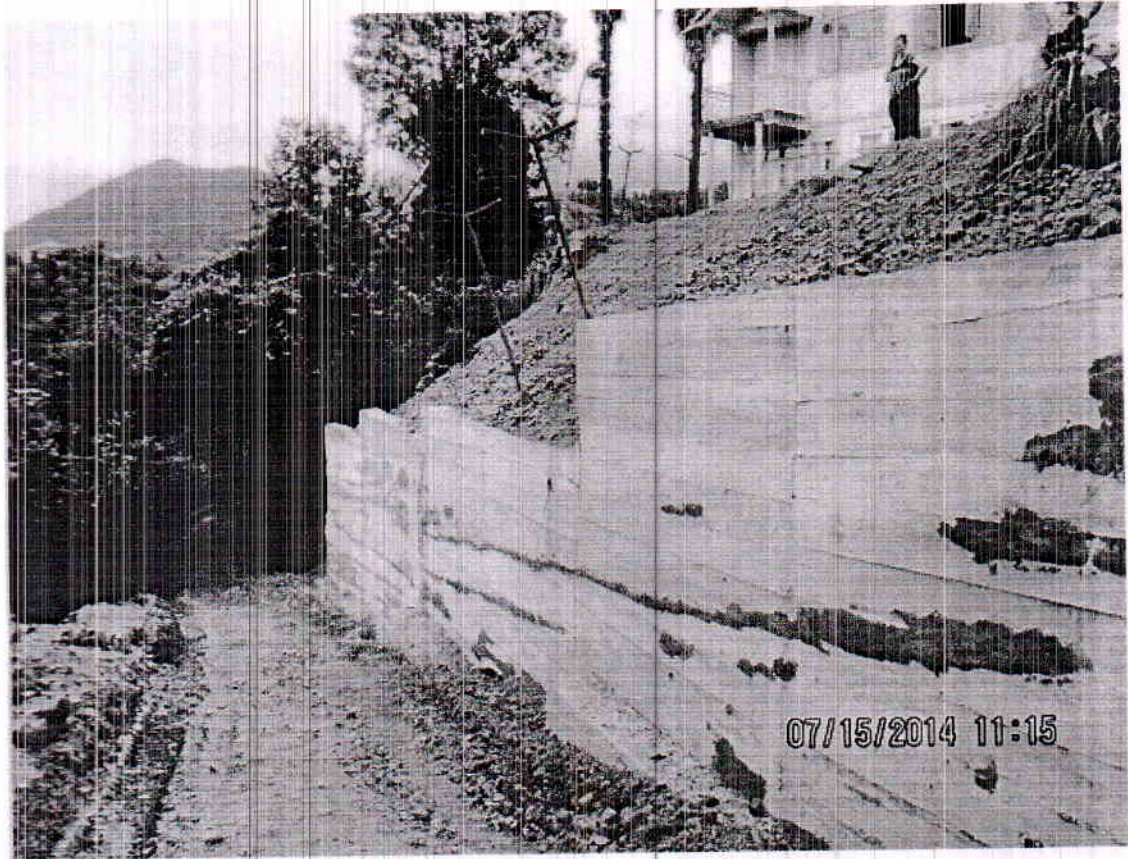


ფოტო 2



003686214

ექსპერტის დასკვნა № 003686214

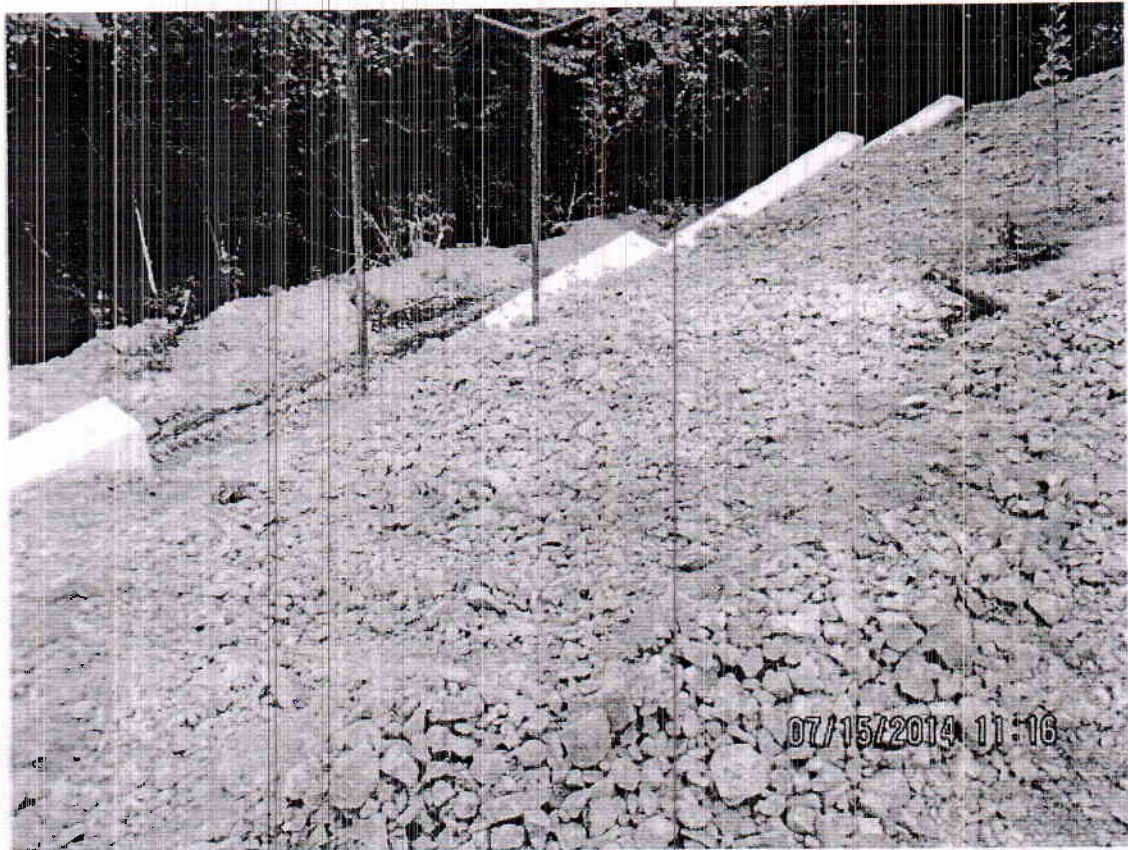

ფოტო 3

დამკვეთი შპს "გ.ზ.ს."

შემსრულებელი შპს "ავტოგზა"

ხელშეკრულება 26 მარტი 2014 წელი

სახელშეკრულებით დარიცხვები 28090,00 ლარი

საავტომობილო გზა: "შუხაესტან-ალამბარი-აგვისთავი" კმ0+900
ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა L=22,0მ, H=2,0-2,8მ

შსსრულმშპ-ს სამუშაოს აბონი №14

01 ივლისი 2014წ.

ფორმა №2

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რეაქციის ზო	ხედილობა		მასალა		სამუშაოების და ტრანსპორტი		
				ერთ. ფაქტ	სულ	ერთ. ფაქტ	სულ	ერთ. ფაქტ	სულ	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზ. ზრ. IV გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიმბეცვლებზე	1000 მ ³	0.165	112,00	18,48			1790,00	295,35	313,83
2	გზ. ზრ. IV გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ ³	0.25	1300,00	325,00					325,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში I კმ-ზე	6	332,5	0,94	312,55			1,51	502,08	814,63
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0.230	16,90	3,89			269,57	62,00	65,89
5	ხრეშოვის ბალიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100 მ ³	0.07	1390,00	97,30	424,00	29,68	705	49,35	176,33
6	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100 მ ³	0.4130	1225,00	505,93			1470,00	607,11	1112,04
	ბეტონი B-18.5	მ ³	42,13	2,00	84,26	80,50	3391,47	40,00	1685,20	5160,93
	ღებრისანი	კმ	12,00			3,00	36,00			36,00
	არმატურა N10	კმ	38,00			1,17	44,46			44,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მშენებლის ტექნიკის მოწყობის მიზნით	100 მ³	0,4600	2940	1352,40			570,00	262,20	1614,60
7	ბეტონი B-18,5	მ³	46,69	2	93,38	80,50	3758,55	40,00	1867,60	5719,53
	ლურჯის	მ³	15,00			3,00	45,00			45,00
	ხის მასალა	მ³	1,034	1,20	1,24	384,00	397,06	5,4	5,58	403,80
	არმატურა №10	მ³	42,00			1,17	49,14			49,14
8	პლასტიკის საღებავი მთლი და=100/10	კგ/მ²	9,00			2,08	18,72			18,72
9	თრეკიანი მიღრობილი (კაბა ბიტუმი)	100 მ²	0,70	250,00	175,00	187,50	131,25			306,25
10	ბრეშინი გრუნტის (ბაღდატის)	1000 მ³	0,220	150,00	33,00	4240	932,80	17100,00	4420,95	5386,75
	მასალის მიღრობილი (კაბა ბიტუმი)									
	სულ:									21593,87
	ხედავები ხარჯები 6%:	6%								1295,63
	ჯამი:									22889,50
	გეგმიური დაგროვება 4%:	4%								915,58
	სულ ჯამი:									23805,08
	დღგ 18%									4284,92
	ჯამი									28090,00

სამუშაო ნაბიჯი

სამუშაო მთლი

შპს "საქართველოს მშენებლობა"

შპს "გზა-ს დონორი"



რ. ცეცხლაძე

რ. ლუგვანიძე
