

შპს "რეალექსპერტი"

მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23

ტელ: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"

ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA

TEL: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

Email: realekspert2015@gmail.com

სამშენებლო-საინჟინრო სამსახური ინსპექტირების

ორგანო

საქ GAC

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა
GAC-IB-0115

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს
A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო
მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. #23ა
შეესადა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აქრედიტებული შპს-ის სფერო 1. ინსპექტის სარეალობების ინსპექტირება 2. მუშაობის სარეალობების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის ინსპექტირება) 3. მიწის რეალიტატორების შეფასების, შეზღუდული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სატრანსპორტო, საინჟინერო სამუშაოების ინსპექტირება 4. ინსპექტის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური შეფასების ინსპექტირება 5. ინსპექტის სფეროს აკრედიტაციის 6. ინსპექტის სარეალობების განმარტების ადაპტაციის ინსპექტირება 8. სამშენებლო ინჟინერის პროექტის შერჩევა, რევიზია, საკვალიფიკაციო ცვლელის და სხვა სახეობის ინსპექტირება 9. პროექტის ნაშლის მიწვევა დასრულების შემთხვევაში შეთანხმების შედგენის ინსპექტირება, მათ შორის სამშენებლო-ინჟინერო კლდედასა და კონსტრუქციული ნაშლის არქიტექტორული ნაშლის
სს. დანართი - „აკრედიტაციის სფერო“
სს. დანართი - „საინსპექტირების აკრედიტაციის სფერო“

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორის

რეგისტრაციის თარიღი
11 ივლისი 2017 წ.

ძალაშია
20 ივლისი 2020 წ.

საქ GAC

0186 თბილისი, ალ. ვახტანგის ქ. #23ა-120

დასველი შპს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
სამშენებლო: 508 კომპლ. ხელის ჩანაწერი: 06 08 3938

ინსპექტირების ანგარიში

ქ.თბილისი


28.07.2017 წ.

ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.700.17

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

ინსპექტირების ობიექტი: ქ.ბორჯომში, მესხეთის ქ. №133-ში მდებარე სანატორიუმში „ბორჯომი“-ს წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.700.17

დამკვეთი: ი.მ. „კახა დათაშვილი“, ს/კ 59001013895.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მამუკა ჩინჩალაძე.

ტექნიკური მენეჯერი: დავით გელიაშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის -- ფორმა №2-ის ინსპექტირება.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №2017/158, 16.05.2017წ. (SMP170001110), ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოს აქტი - ფორმა №2, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტი, წერილობითი ნებართვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ათვისების შესახებ, სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები, ფარული სამუშაოთა აქტები.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 14.07.2017წ. – 28.07.2017წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

ქ.ბორჯომში, მესხეთის ქ. №133-ში მდებარე სანატორიუმი „ბორჯომი“-ს წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ი.მ. „კახა დათაშვილი“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 47279,60 (ორმოცდაშვიდი ათას ორას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით ნაცვლად წარმოდგენილი 52843,99 (ორმოცდათორმეტი ათას რვაას ორმოცდასამი ლარი და 99 თეთრი) ლარისა დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 5564,39 (ხუთი ათას ხუთას სამოცდაოთხი ლარი და 39 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოთა მოცულობების, მასალათა ერთეული ღირებულებისა და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტის დაკორექტირებით.

დანართი: ფორმა №2, 5 (ხუთი) ფურცელი, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შერულების აქტი, 1(ერთი) ფურცელი, ფარული სამუშაოთა აქტები, 14 (თოთხმეტი) ფურცელი, ფოტოილუსტრაცია, 1 (ერთი) ფურცელი.



გამოკვლევა

განაცხადის თანახმად დასადგენია ი.მ. „კახა დათაშვილი“-ს მიერ შესრულებული ქ.ბორჯომში, მესხეთის ქ. №133-ში მდებარე სანატორიუმი „ბორჯომი“-ს წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა №2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილი იქნა ფორმა №2 თანხით 51217,16 (ორმოცდათერთმეტი ათას ორას ჩვიდმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარი დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტი თანხით 1626,83 (ათას ექვსას ოცდაექვსი ლარი და 83 თეთრი) ლარი დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით, ჯამური თანხით 52843,99 (ორმოცდათორმეტი ათას რვაას ორმოცდასამი ლარი და 99 თეთრი) ლარი დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით. წარმოდგენილი იქნა ასევე ხარჯთაღრიცხვა, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №2017/158, 16.05.2017წ. (SMP170001110), წერილობითი ნებართვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ათვისების შესახებ, სასაქონლო ზედნადები, შრომითი ხელშეკრულებები, ფარული სამუშაოთა აქტები.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევო ობიექტი, სადაც დამკვეთის თანდასწრებით განვახორციელე შესრულებული ხილული სამუშაოს აზომვები. ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს, რის გამოც ინსპექტირებით ისინი დაკორექტირდა (იხ. დანართი, გამოქვეყნულ ფერში). ხოლო ის სამუშაოები, რომლებიც მიეკუთვნება ფარული სამუშაოთა კატეგორიას, გაზიარებული იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებიდან, რომლებიც შეთანხმებულია სამშენებლო სამუშაოების დამკვეთთან. ფარული სამუშაოთა აქტები თან ერთვის ინსპექტირების დასკვნას. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი ფორმა №2-ში 22-ე პუნქტში მითითებული სამუშაო განეკუთვნება ფარული კატეგორიის სამუშაოებს. ვინაიდან დამკვეთმა არ წარმოადგინა ფარული სამუშაოთა აქტი აღნიშნულ სამუშაოზე და

ინსპექტირებისას მისი მოცულობის დადგენა ვერ მოხერხდა, მასზე ინსპექტირებამ ვერ იმსჯელა და ამ სამუშაოს ღირებულების -- 2028,73 (ორი ათას ოცდარვა ლარი და 73 თეთრი) ლარის დღგ-სა და დანარიცხების გარეშე ჩათვლის საკითხი არის სამშენებლო სამუშაოების შემსყიდველის პრეროგატივა.

აგრეთვე შესწავლილი იქნა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია. ფორმა №2-ში და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტში ნაჩვენები მასალათა ერთეული ღირებულებები შედარებული იქნა წარმოდგენილი სასაქონლო ზედნადებების ანალოგიურ მონაცემებს. დადგინდა, რომ ფორმა №2-ში და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტში ნაჩვენები ზოგიერთი მასალის ღირებულება მეტია სასაქონლო ზედნადებში ნაჩვენებ მონაცემზე, რის გამოც იგი ინსპექტირებით დაკორექტირდა. (იხ. დანართი, გამუქებულ ფერში). იმ მასალათა ერთეული ღირებულებები, რომელთა ზედნადებებიც ვერ იქნა წარმოდგენილი, გაზიარებული იქნა „სამშენებლო რესურსების ფასები“-ს (სრფ) კრებულის მონაცემების მიხედვით.

ფორმა №2-ში და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტში ნაჩვენები შრომითი დანახარჯები შედარებული იქნა წარმოდგენილ შრომით ხელშეკრულებებში მითითებულ თანხებს, ისინი შეესაბამებიან ერთმანეთს.

რაც შეეხება სამშენებლო მექანიზმების ფასებს, ისინი წარმოდგენილ ფორმა №2-ში მოცემულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ 2017 წელს გამოცემული მეთოდური ცნობარის შესაბამისად.

გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტში სატრანსპორტო ხარჯისა და დღგ-ს დაანგარიშებისას დაშვებულია შეცდომა, რის გამოც ისინი ინსპექტირებით დაკორექტირდა.

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქ.ბორჯომში, მესხეთის ქ. №133-ში მდებარე სანატორიუმი „ბორჯომი“-ს წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ი.მ. „კახა დათაშვილი“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 47279,60 (ორმოცდაშვიდი ათას ორას სამოცდაცხრამეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით ნაცვლად წარმოდგენილი 52843,99 (ორმოცდათორმეტი ათას რვაას ორმოცდასამი ლარი და 99 თეთრი) ლარისა დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 5564,39 (ხუთი ათას ხუთას სამოცდაოთხი ლარი და 39 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოთა მოცულობების, მასალათა ერთეული ღირებულებისა და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტის დაკორექტირებით.

ფორმა №2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 46447,18 (ორმოცდაექვსი ათას ოთხას ოროცდაშვიდი ლარი და 18 თეთრი) ლარს დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით ნაცვლად წარმოდგენილი 51217,16 (ორმოცდათერთმეტი ათას ორას ჩვიდმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარისა დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების აქტის მიხედვით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება შეადგენს 832,42 (რვაას ოცდათორმეტი ლარი და 42 თეთრი) ლარს დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით ნაცვლად წარმოდგენილი 1626,83 (ათას ექვსას ოცდაექვსი ლარი და 83 თეთრი) ლარისა დღგ-სა და დანარიცხების ჩათვლით.



დანართი: ფორმა №2, 5 (ხუთი) ფურცელი, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შერულების აქტი, 1(ერთი) ფურცელი, ფარული სამუშაოთა აქტები, 14 (თოთხმეტი) ფურცელი, ფოტოილუსტრაცია, 1 (ერთი) ფურცელი.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: მუქური მანძილზომი - 001, STANLEY TLM 210, №202741365; საზომი ლენტის (რულეტი) №2 - 003, LIANGJIN; ფოტოაპარატი 004.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია: სამშენ. წესები და ნორმები; „სამშენებლო რესურსების ფასები“-ს (სრფ) კრებული; მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ 2017 წელს გამოცემული მეთოდური ცნობარი.

შემსრულებელი ინსპექტორი: მამუკა ჩინჩალაძე

ტექნიკური მენეჯერი: დავით გელიაშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



ბელშეკრულება: 16.05. 2017 წ. # 218
 შესყიდველი: საჯარო. ოკუპირებ. ტერიტორიებიდან იბულ.
 გადაადგ. პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
 მიმწოდებელი: ი.მ. " კახა დათაშვილი"

ქ. ბორჯომში მესხეთის ქ. # 33-ში მდებარე სანატორიუმ მ " ბორჯომის" წყლისა და კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფასთა კრებული

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განხ	წორმბა		ხეღვახი		მასალა		სამშ		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1		სადემონტაჟო სამუშაოები	გრმ.მ.		750		713,7		0,0	0	504	1217,70
		დაზიანებული წყლის ლითონის მიღების შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,61	457,5	1,56	713,7	0	0,0			713,70
		მანქანები	ლარი	0,21	157,5	0	0	0	0,0	3,2	504	504,00
2		დაზიანებული ქუროების დემონტაჟი	ც		140		169,092		0,0	94,08	263,17	263,17
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,61	85,4	1,98	169,092		0,0	0	0	169,09
		მანქანები	ლარი	0,21	29,4		0	0,00	0,0	3,2	94,08	94,08
		სამონტაჟო სამუშაოები			0		0		0,0	0	0	0,00
4	16-6-1	მილი წყალსადენის პოლიპროპილენის (ფიტინგები			0		0		0,0	0	0	0,00
		თბოიზოლაცია) 10 ატმ. დ-63*20 მმ	გრმ.მ.		476		815,9116		2205,5	31,9872	3053,40	3053,40
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,61	290,36	2,81	815,9116		0,0	0	0	815,91
		მანქანები	ლარი	0,021	9,996		0	0,00	0,0	3,2	31,9872	31,99
		მილის ლირბულება დ-63 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	80		0	6,44	515,2	0	0	515,20
		კაუჩუკის გარსაცმი დ-65 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	80		0	3,22	257,6	0	0	257,60
		მილის ლირბულება დ-40 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	164		0	3,00	492,0	0	0	492,00
		კაუჩუკის გარსაცმი დ-42 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	164		0	1,44	236,2	0	0	236,16
		მილის ლირბულება დ-32 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	150		0	1,99	298,5	0	0	298,50
		კაუჩუკის გარსაცმი დ-32 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	150		0	1,31	196,5	0	0	196,50
		მილის ლირბულება დ-20 მმ	გრმ.მ.	პროექტ	80		0	0,76	60,8	0	0	60,80
		სამაგრი (63-20მმ)	ც	პროექტ	75		0	1,31	98,3	0	0	98,25
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,156	74,256		0	0,68	50,5	0	0	50,49
5	საბაზ	მაგისტრალური წყლის და კანალიზაციის მილების შეფუთვა ფილგანნი მინაბამ	კვ.მ		204		456,8564		368,6	789,888	1615,33	1615,33
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,61	124,44	2,31	287,4564		0,0	0	0	287,46
		მანქანები	ლარი	1,21	246,84		0	0	0,0	3,2	789,888	789,89
		ფოლიანი მინაბამა	კვ.მ	1,05	214,2		0	1,66	355,6	0	0	355,57
		სკოჩი	ც	პროექტ	20	8,47	169,4		0,0	0	0	169,40
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,11	22,44		0	0,58	13,0	0	0	13,02

6	16-12-	ვენტილურების და ფიტინგების მოწყობა	გ	კაც/სთ	0,323	640	1304,4032	792,1	266,24	2362,69	ფარული აქტი
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,323	206,72	6,31	1304,4032	0,0	0	1304,40	
		მანქანები	ლარი	0,13	83,2		0	0,0	3,2	266,24	
		ვენტილი დ-63	ც	პროექტ	2		0	10,17	0	20,34	იყო 12
		ვენტილი დ-40	ც	პროექტ	16		0	5,3	0	84,80	იყო 6,25
		ვენტილი დ-20	ც	პროექტ	142		0	1,1	0	156,20	იყო 1,3
		სამკაპი 63*63	ც	პროექტ	2		0	3,98	0	7,96	იყო 4,7
		სამკაპი 63*40*63	ც	პროექტ	16		0	3,22	0	51,52	იყო 3,8
		სამკაპი 40*20*40	ც	პროექტ	90		0	0,64	0	57,60	იყო 0,75
		სამკაპი 32*20*32	ც	პროექტ	72		0	0,34	0	24,48	იყო 0,4
		მუხლი დ-63 მმ	ც	პროექტ	10		0	2,71	0	27,10	იყო 3,2
		მუხლი დ-40 მმ	ც	პროექტ	40		0	0,72	0	28,80	იყო 0,82
		მუხლი დ-32 მმ	ც	პროექტ	20		0	0,45	0	9,00	
		ქურო დ-63 მმ	ც	პროექტ	28		0	1,78	0	49,84	იყო 2,1
		ქურო დ-40 მმ	ც	პროექტ	20		0	0,42	0	8,40	იყო 0,5
		ქურო დ-32 მმ	ც	პროექტ	20		0	0,34	0	6,80	იყო 0,4
		გადამყვანი 40*32 მმ	ც	პროექტ	20		0	0,45	0	9,00	
		ამერიკანკა დ-20 მმ შიდა ხრახნით	ც	პროექტ	142		0	1,01	0	143,42	იყო 1,2
		მილტუქი 100*63	ც	პროექტ	1		0	22,88	0	22,88	
		წებოვანი პაკლი	ც	პროექტ	6		0	12,71	0	76,26	
		პლასტმასის ბუფი	ც	პროექტ	15		0	0,51	0	7,65	
7	16-6-2	მილი კანალიზაციის პლასტმასის ფითინგებით დ-160 მმ	გრძ.მ.		110		396,96	0,0	0	0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,583	64,13	6,19	396,96	0,0	0,00	1154,64	ფარული აქტი
		მანქანები	ლარი	0,046	5,06		0,00	0,0	3,2	396,96	
		მილი პლასტმასის საკანალიზაციო დ-160 მმ	გრძ.მ.	1	110		0,00	5,16	0,00	567,60	იყო 6,53
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,208	22,88		0,00	7,6	0,00	173,89	
8	16-6-2	მილი კანალიზაციის პლასტმასის ფითინგებით დ-100 მმ	გრძ.მ.		133		417,16	0,0	0,00	0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,583	77,54	5,38	417,16	0,0	19,58	889,13	ფარული აქტი
		მანქანები	ლარი	0,046	6,12		0,00	0,0	0,00	417,16	
		მილი პლასტმასის საკანალიზაციო დ-100 მმ	გრძ.მ.	1	133		0,00	3,26	0,00	433,58	იყო 4,83
		დანარჩენი ხარჯები	ლარი	0,208	27,66		0,00	0,68	0,00	18,81	
9	22-23-	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა	ც		159		1804,20	768,4	153,66	2726,27	ფარული აქტი
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,88	1252,9	1,44	1804,20	0,0	0,00	1804,20	
		მანქანები	ლარი	0,302	48,018		0,00	0,0	153,66	153,66	
		რევიზია დ-150 მმ	ც	პროექტ	4		0,00	7,2	0,00	28,80	

																				იყო 243,39		
	ვემენტის ხსნართი სისქით 3-სმ																					
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,647	341,04	2,63		0,00	896,95				0,00	896,95							0,0	0,0	
	მანქანები	ლარი	0,069	14,29			0,00					0,00	45,72		3,2					0,0	45,72	
	ქვიშა-ვემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,038	7,93			0,00					80,51	638,51							0,0	638,51	
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,003	0,6212			0,00					3,8	2,36							0,0	2,36	
	შეკიდული ხონის მთქვობა	გრ.მ.მ.		101			1303,41					224,30	1647,29							119,6	1647,29	ფარული აქტი
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,89	89,89	14,5		1303,41					0,00	1303,41							0,0	1303,41	
	მანქანები	ლარი	0,37	37,37			0,00					0,00	119,58		3,2					0,0	119,58	
	ლოთიონის რეზინი დრო სიგრძით 2 მ	ც	პროექ	25			0,00				2,12	53,00	53,00							0,0	53,00	იყო 5,51
	ზოლოვანა 20*3	გრ.მ.მ.	პროექ	30			0,00				0,76	22,80	22,80							0,0	22,80	იყო 3,14
	სხვა ხარჯები	ლარი	პროექ	15			0,00				9,9	148,50	148,50							0,0	148,50	
	17 10*10 შეკიდული ხონის მეფუთვა თამამრმუჯოს						0,00					0,00	0,00							0,0	0,00	
	ფილეებით	კვ.მ.		269,52			910,98					1268,02	2194,78							15,8	2194,78	იყო 300
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	269,52	3,38		910,98					0,00	910,98							0,0	910,98	
	მანქანები	ლარი	0,018	4,9322			0,00					0,00	15,78		3,2					0,0	15,78	
	თამამრმუჯო (კომპლექტი)	კვ.მ	1,05	282,996			0,00				3,82	1081,04	1081,04							0,0	1081,04	იყო 5,76
	სკკალი თამამრმუჯოს	სკ	0,037	9,972			0,00				4,66	46,48	46,48							0,00	46,48	
	უდ პროფილი	გრ.მ.მ.	პროექ	240			0,00				0,48	115,20	115,20							0,0	115,20	იყო 0,88
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,0269	7,25			0,00				9,9	71,78	71,78							0,0	71,78	
	18 9*14* მეტალბოლასტმასის კარებების მოწყობა						150,80					503,91	659,91							5,2	659,91	
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,72	11,97	12,6		150,80					0,00	150,80							0,0	150,80	
	მანქანები	ლარი	0,37	1,63			0,00					0,00	5,21							0,0	5,21	
	კარის ბლოკის დირექტორები	კვ.მ	1	4,40			0,00				114,41	503,40	503,40							0,0	503,40	
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,03	0,13			0,00				3,8	0,50	0,50							0,0	0,50	
	19 23*12 საკანალიზაციო ქის რ/ზ რგოლის დ-10 მოწყობა						75,60					46,97	138,82							16,3	138,82	
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,6	12,6	6		75,60					0,00	75,60							0,0	75,60	
	მანქანები	ლარი	5,08	5,08			0,00					0,00	16,26		3,2					0,0	16,26	
	ანაკრები რ/ზ დ-1000 მმ რგოლი	ც	0	0			0,00				118,64	0,00	0,00							0,0	0,00	
	თუჯის ხუფი ჩარჩოთი	ც	0	0			0,00				296,61	0,00	0,00							0,0	0,00	იყო 1
	სხვა ხარჯები	ლარი	7,01	7,01			0,00				6,7	46,97	46,97							0,0	46,97	
	გაწმენდითი სამუშაოები						0,00					0,00	0,00							0,0	0,00	
	დაზიანებული საკანალიზაციო და წყალ-სადენი მილების დემონტაჟი და ამოზიდვა	გრ.მ.მ		550			980,38					0,00	1156,38							176,0	1156,38	ფარული აქტი
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,15	632,5	1,55		980,38					0,00	980,38							0,0	980,38	
	მანქანები	ლარი	0,1	55			0,00					0,00	176,0		3,2					0,0	176,0	

ქ.პორუჯომში, მესხეთის ქ. #33ა-ში მდებარე სანატორიუმი "ბორჯომი"-ის წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფასთა კრებულში გათვალისწინებულ ხარჯებზე

№	სამუშაოს დასახელება	ტანზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	არსებული დაზიანებული ჩამკეტი ურდულის დემონტაჟი	ც	1	0	0	80	80	80
								0
1	ჩამკეტი სარკველი თუჯის დ-150მმ PN-16 მონტაჟი	ც	1,00	0,00	0	250,00	250	250
	ჩამკეტი სარკველი თუჯის დ-150მმ PN-16	ც	1,00	187,00	187	0,00	0	187
	ფოლადის მილტუჩი დ-150 მმ	ც	2,00	21,18	42,36	0,00	0	42,36
	შუასადები რეზინის	ც	2,00	2,54	5,08	0,00	0	5,08
	ქანჩი M-20	კვ	0,50	4,20	2,1	0,00	0	2,1
	ქანჩი M-20*80	კვ	3,50	4,20	14,7	0,00	0	14,7
	ჯამი:				251,24			581,24
	სატრანსპორტო ხარჯი:	5%						12,56
	ჯამი:							593,80
	ზედნადები ხარჯები:	10%						59,38
	ჯამი:							653,18
	გემპიური დაგროვება:	8%						52,25
	ჯამი:							705,44
	დ.ღ.	18%						126,98
	ჯამი:							832,42

ინსპექტორი

მ.ჩინჩალაძე

საქართველოს თავდაცვითი ტერიტორიული დაცვის
დამკვეთი საქართველოს ნავთობის, გაზისა და ელექტროენერჯის საზოგადოებრივი
მოიჯარადრე ი.შ. "საქსაგაზი"
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 1.

ქალაქი ზახტოში "18" მაისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნივთების დაზიანებისა და აღდგენის
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ.ზახტოში სკოლის შენობა

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. "საქსაგაზი"-ს

დ. ბერიძე (გარი.ინჟინერი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი

(გარი. ინჟინერი, თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. "საქსაგაზი"-ს მიერ შესრულებული

(საშ.სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნივთების აღდგენა

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით დემონტაჟი 85 მ³

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია (სა.პროექტო ორგანიზაციის დასახელება)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი (მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:


ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)


სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:



/ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: 

/ხელმოწერა/



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
დამკვეთი კაპიტალიზაციის მინისტრის განკარგულებაში
მოიჯარადრე ი.შ. იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
ხელშეკრულება 16.05.2017. № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 2

ქალაქი თბილისი "23" მაისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნაგებობის კაპიტალიზაციის
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ.თბილისში ს.წინააღმდეგარის ქ.თბილისი

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. იუსტიციის მინისტრის

დ.ხ. ქაიხაძე კახა დავითაძე
(გარი.ინიციალი. თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი ჯიბუაძე
(გარი. ინიციალი. თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. იუსტიციის მინისტრის მიერ შესრულებული
(სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალეობა და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:
1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება ნაგებობის სარკინოვანი აგების
შეკეთების გარეშე შ 3-100
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით _____

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება)
3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია _____

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)
4. სამუშაოს დათვალეობის თარიღი _____

კომისიის გადაწყვეტილება:
სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: ი.შ. იუსტიციის მინისტრის /ხელმოწერა/
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: გიორგი ჯიბუაძე /ხელმოწერა/

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
დამკვეთი კადასტრული სამსახური, გენერალის და ექსპერტული სამსახური
მოიჯარადრე ი.შ. კახა დამაძვია
ხელშეკრულება 16.05.2017. № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 3

ქალაქი თბილისი

"24" მარტი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნაგებობის რეკონსტრუქციის
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ. თბილისში ს. მამიაძის ქუჩა

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. კახა დამაძვია"-ს

დიხუაძის კახა დამაძვია
(გვარი, ინიციალი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი კობეცაძე
(გვარი, ინიციალი, თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. კახა დამაძვია"-ს მიერ შესრულებული
(სასამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება გენერალის და ექსპერტული სამსახური

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით ტექნიკური - 1/10

კახა დამაძვია
(სა.ოპერო ორგანიზაციის დასახელება)

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია ქანხის გრაფიკი
(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი _____

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ჯერ კარგად
ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი: [Signature] /ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: [Signature] /ხელმოწერა/

[Signature]

საქართველოს თვითმმართველობის ადგილობრივი დონის
დამკვეთი გუდაუბერიძე ნინო, გ. ნახუცხისა და ევთიშვილია სამხრეთი
მოიჯარადრე ი.შ. აკახაძე
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2517/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 4

ქალაქი თბილისი "25" მაისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება საქონლის რეგისტრაციის დასახელებების
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ. თბილისი, ს. ნახუცხისა და ევთიშვილის ქ. 158

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. აკახაძე

ი.შ. აკახაძე
(გვარი, ინიციალი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი გომიძე

(გვარი, ინიციალი, თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. აკახაძე მიერ შესრულებული

(სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზე, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება დაზიანებული სახურავის
შემოწმების და შეკეთების სამუშაოები 1300 ლ.
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით —

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება) ბუჯაგია

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია —
(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი —

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:

ი.შ. აკახაძე

/ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი:

გიორგი გომიძე

/ხელმოწერა/

საქართველოს თვითმმართველი ტერიტორიების აქტიურობის
დამკვეთი კახეთის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაცია
მოიჯარადრე ი. შ. ი. კახეთის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაცია
ხელშეკრულება 16-05-2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 5.

ქალაქი სოხუმი "24" მაისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნაგებობის კაპიტალური
ობიექტისა და შენობების დასახელება 7 ბინათმცხველი კაპიტალი

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი. შ. ი. კახეთის რეგიონული

ადმინისტრაცია კახეთის რეგიონული
(გეარო.ინჟინერი. თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი გომიანიძე
(გეარო. ინჟინერი. თანამდებობა)

მოახდინა ი. შ. ი. კახეთის რეგიონული მიერ შესრულებული
(საქმ სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება შენიშნული ნაგებობის
ბინათმცხველი 2,56 მ²
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით —

(სა.ოპერო ორგანიზაციის დასახელება)
3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია —

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)
4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი —

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:

/ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი:

/ხელმოწერა/

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
დასაქმებული გაბრიელა მინა, გენდერული და ექსპერტული საბინძორო
მოიჯარადრე ი. შ. იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
ხელშეკრულება 16.05.2017. № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 6.

ქალაქი თბილისი "28" მაისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება ჩვენს წყალსადენს განვიხილავს ხელოვნური
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ. თბილისში ს. სტოვბეხევი ქობულაძის

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი. შ. იუსტიციის მინისტრის

გაბრიელა მინა

იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
(გეარო. ინჟინერი, თანამდებობა)

დასაქმების ტექნიკური ზედამხედველი

გიორგი გოსვლიშვილი

(გეარო. ინჟინერი, თანამდებობა)

მოახდინა

ი. შ. იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
(საშ. სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

მიერ შესრულებული

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება საგანგებო დ-150 მმ
ზიდი მონტაჟი ვითინგის 110 გზა.
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით

(სა. პროექტო ორგანიზაციის დასახელება)

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)


სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის

წარმომადგენელი:



/ხელმოწერა/

დასაქმების ტექნიკური ზედამხედველი:



/ხელმოწერა/



საქართველოს ოჯახისთვის სტრატეგიული მიზანმიმართული
დამკვეთი კადასტრული სამსახური, გნსახუნისა და ექსპლუატაცია სამონტაჟო
მოიჯარადრე ი.შ. კაცია ურბანი
ხელშეკრულება 16.05.2017. № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 8

ქალაქი თბილისი "10" ივნისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშვნა-საღებავი ნაგებობის კადასტრული
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ.თბილისის ს.სტოგოვიძის ქ.თბილისი

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. კაცია ურბანი

მ.შ. კაცია ურბანი (გეარ.ინჟინერი, თსსამშენობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი კობლავაძე
(გეარ. ინჟინერი, თსსამშენობა)

მოახდინა ი.შ. კაცია ურბანი მიერ შესრულებული
(სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზე, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება შენიშვნის მიხედვით

მ.შ. კაცია ურბანი @ 20-63 82 476 ზ.შ.წ.

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია შტატივები
(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი: ი.შ. კაცია ურბანი /ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: გიორგი კობლავაძე /ხელმოწერა/

საქართველოს იუსტიციის სპეციალური სერვისების განყოფილება
დამკვეთი კადასტრული სამსახური, უნდა შეესაბამებოდეს ელექტრონულ საბინაო
მოიჯარადრე ი.შ. იუსტიციის დამსახურები
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 9

ქალაქი თბილისი "10" ივნისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება საქონლის მფლობელის განმარტების დასახელება
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ. თბილისში ს. სტოგბუხის ქ. 640/159

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. იუსტიციის დამსახურები
თხევანი კახა დამაძვინი
(გეარ.ინჟინერი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი თოსტი გობაძე
(გეარ. ინჟინერი, თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. იუსტიციის დამსახურები მიერ შესრულებული
(სამშ. სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზე, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება კვანთიქის რეკონსტრუქცია
ბონკინი 640/159 კადა
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია ქვი
(სა.ოიექტი ორგანიზაციის დასახელება)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი _____
(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი: ი.შ. /ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: ქ. გობაძე /ხელმოწერა/

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დადგენილი წესის, განსაკუთრებით ექსპლუატაციის საშუალებების მოიჯარადრე ი.შ. იუსტა მარტიშვილი
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი №10

ქალაქი სოხჯოში "12" ივლისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება სოხჯოში ნიჟარ-სადრე ვანდიანის ჰესტიდგენის
ობიექტისა და შენობების დასახელება სოხჯოში სექციონებზე ელექტროსისტემა

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. იუსტა მარტიშვილი"-ს

დოქტორი კახა იუსტიშვილი
(გეო.ინჟინერი. თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გოჩა გომედიშვილი
(გეო. ინჟინერი. თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. იუსტა მარტიშვილი"-ს მიერ შესრულებული
(სამშ.სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:
1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება სოხჯოში ნიჟარ-სადრე ვანდიანის ჰესტიდგენის ელექტროსისტემა 159 კვ.

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით ---

(სა.პროექტო ორგანიზაციის დასახელება)
3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია ---

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)
4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი ---

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად. წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: --- /ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: --- /ხელმოწერა/

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში
დამკვეთი კვანდაკის მხარე, ვინაიდან და ექსპერტის საბინძო
მოიჯარადრე ი.მ. კახაია
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი № 11.

ქალაქი სოხი

"18" ივლისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება მუხა წყალ-საფარ კონსტრუქციის გადართობის
ობიექტისა და შენობების დასახელება სოხში სანაპირო ქუჩის

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.მ. კახაია

დ. ხუციშვილი
(გეარ.ინჟინერი, თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი კობახიძე
(გეარ. ინჟინერი, თანამდებობა)

მოახდინა ი.მ. კახაია მიერ შესრულებული
(სამშ. სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზე, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება მუხა წყალ-საფარის მუხა და
კონსტრუქციის შეკეთების მიზნით
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით მიმართული 2017 წ.

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია
(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი
(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შეძგევი სამუშაოების გაგრძელება.

(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:

/ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი:

/ხელმოწერა/

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის
 დამკვეთი კადასტრის სამსახური ნ. შ. ა. ცხ. დამსახურები
 მოიჯარადრე ი. შ. ა. ცხ. დამსახურები
 ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი №12

ქალაქი ზოხჯოში

"22" ივლისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შუბი ხეივანის განლაგების ხეხილბაგისა
 ობიექტისა და შენობების დასახელება + ზოხჯოშის სკოლაზე ჯოხჯოში

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი. შ. ა. ცხ. დამსახურები"-ს

დოქტორი კახა დამსახურები
(გეოგრაფიული თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი ზოხჯო ჯოხჯოშელი
(გეოგრაფიული თანამდებობა)

მოახდინა ი. შ. ა. ცხ. დამსახურები"-ს მიერ შესრულებული
(სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:
 1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება შუბი ხეივანის განლაგების ხეხილბაგისა
220 ფა. 7.

2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით _____

(სა. პროექტო ორგანიზაციის დასახელება)
 3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია _____

(მასალის, კონსტრუქციის ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)
 4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი _____

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
 წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
 წარმომადგენელი: ხ. ცხ. /ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი: ქ. ცხ. /ხელმოწერა/

საქართველოს თვითმმართველ ტერიტორიებზე
დამკვეთი კახეთის მხარე, გნსსსსს და უმთავრესად საბუნების
მოიჯარადრე ა.შ. ი.კ.ს. შ.ს.შ.შ.შ.
ხელშეკრულება 16.05.2017 № 2017/153

ფარული სამუშაოების აქტი №13

ქალაქი ზოიჯოში "28" ივლისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება ზოიჯოში-საფრანგული კანალიზაციის ხაზი დასრულება
ობიექტისა და შენობების დასახელება ზოიჯოში სასტუმროს სანდოვანო ქობულაძის

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი.შ. ი.კ.ს. შ.ს.შ.შ.შ.

დ.ხ.ქ.შ.შ. (გარი.ინიციალი. თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი კობლაძე
(გარი.ინიციალი. თანამდებობა)

მოახდინა ი.შ. ი.კ.ს. შ.ს.შ.შ.შ. მიერ შესრულებული
(საშ.სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:

1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება ზოიჯოში-საფრანგული კანალიზაციის ხაზი დასრულება
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით 32,9 მ³

(სა.პროექტო ორგანიზაციის დასახელება)

3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება, მარკა, ტიპი)

4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი

კომისიის გადაწყვეტილება:

სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:

ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.


(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:



/ხელმოწერა/

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი:



/ხელმოწერა/



საქართველოს თვითმმართველი ტერიტორიების ერთიანი აქტით
დამკვეთი ვაჭარაშვილი ნინო, გენერალის და ეზოველია საბუნების
მოიჯარადრე ი. შ. იკნა ურბნაძე
ხელშეკრულება 16.05.2017. № 2017/158

ფარული სამუშაოების აქტი №14

ქალაქი ზოხვიძი "5" ივლისი 2017წ.

სამუშაოს დასახელება შენიშვნა: ნაკრ-საღრმე გარეუბანში ქატივითა
ობიექტისა და შენობების დასახელება ქ. ზოხვიძის სკოლებზე ქობულა

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ი. შ. იკნა ურბნაძე"-ს
დ. ხუტაძე კახა ურბნაძე
(გუარ. ინჟინერი. თანამდებობა)

დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი გიორგი ურბნაძე
(გუარ. ინჟინერი. თანამდებობა)



მოახდინა ი. შ. იკნა ურბნაძე"-ს მიერ შესრულებული
(სამშ. სამონტაჟო ორგანიზაციის დასახელება)

სამუშაოების დათვალიერება და შეადგინა აქტი მასზედ, რომ:
1. შესრულებული ფარული სამუშაოს დასახელება გასვლელი მოედანი
ქ. ზოხვიძის ნ. სკოლებზე სერვისი 3, 28, 93
2. სამუშაოები შესრულებულია პროექტით







(სა. პროექტ ორგანიზაციის დასახელება)
3. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია

(მასალის, კონსტრუქციის, ნაკეთობის დასახელება. მარკა, ტიპი)
4. სამუშაოს დამთავრების თარიღი

კომისიის გადაწყვეტილება:
სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმების, წესებისა და პროექტის შესაბამისად.
წინამდებარე აქტის №1 პუნქტში მითითებული სამუშაო მიღებულია და ხარისხი ფასდება:
ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია შემდეგი სამუშაოების გაგრძელება.
(სამუშაოსა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო სამონტაჟო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი:  /ხელმოწერა/
დამკვეთის ტექნიკური ზედამხედველი:  /ხელმოწერა/



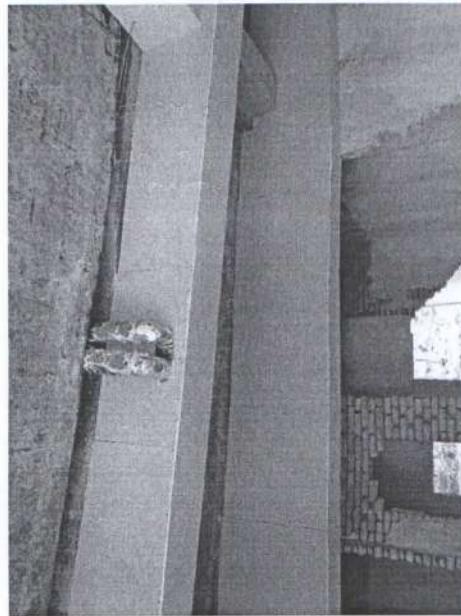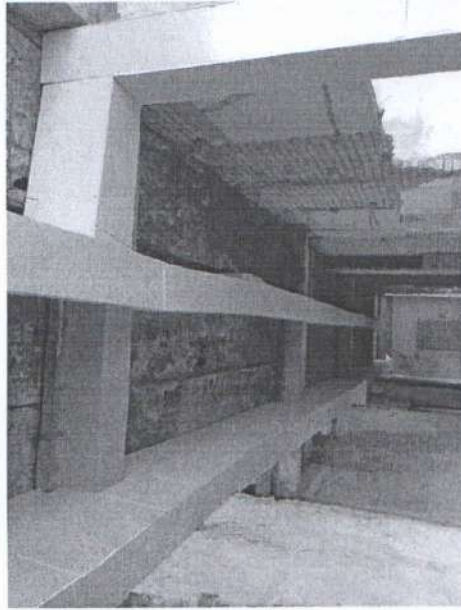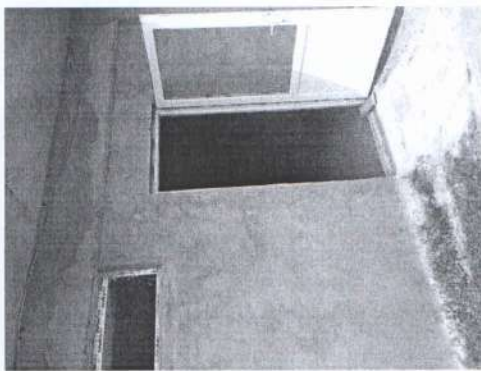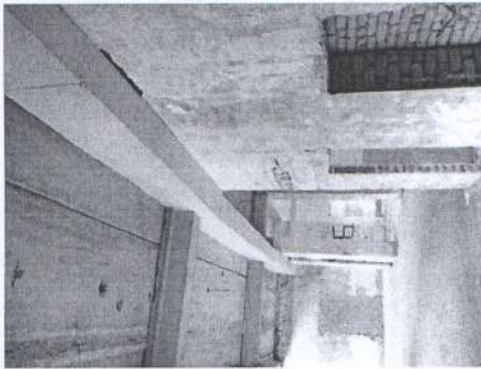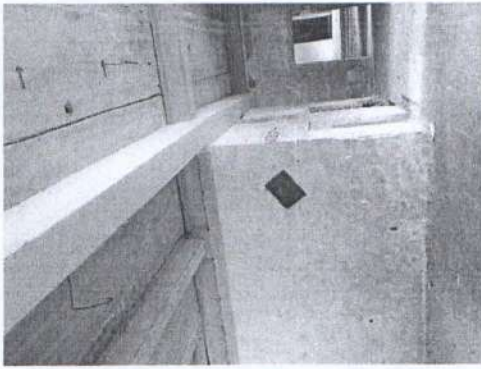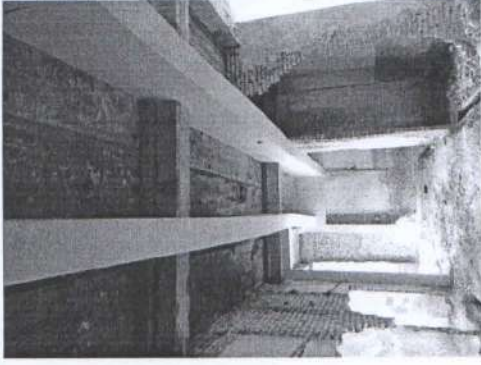

Handwritten signature in blue ink.

