

დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 კონტრაქტის დასახელება – ქოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩიდან რამიშვილის ქუჩაზე გამავალი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და ხელმოწერის თარიღი: – ხელშეკრულება №60 - 20 თებერვალი 2014წელი.
 საკონტრაქტო ღირებულება: 34 646,13 ლარი დ.დ.გ-ს გათვალისწინებით
 გენერალური მოთვარადრე: შ.პ.ს. „გამშენი-18“ - ოზურგეთი თაყაიშვილის ქ.№62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

27 თებერვალი 2014წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით			შესრულებულია ფაქტურად	
			რაოდენობა	ერთეულის ფასი	მოთხმენი ღირებულება	რაოდენობა	მოთხმენი ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ქიშპი-ხრეში	კმ	8,00	11,98	95,84	8,00	95,84
2	ხის ქარგილის მოწყობა	კმ	0,50	450,00	225,00	0,50	225,00
3	მოაჯირის ცოკლისა და კედლის მოწყობა ბეტონით	კმ	3,50	182,00	637,00	3,50	637,00
4	80X60 მმ 45მ და 20X40 მმ 66მ კვადრატული მიღებით მოაჯირის მოწყობა	გრ/მ	33,00	16,00	528,00	33,00	528,00
5	მოაჯირის შეღებვა	კმ	6,00	6,92	41,52	6,00	41,52
6	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით 90,0X0,05 მ (ტროტუარი)	კმ	4,75	349,52	1660,22	4,50	1572,84
7	საფარის დატკეპვა	მ/სთ	8,00	34,64	277,12	8,00	277,12
8	კედლის შეღებვა	კმ	82,00	6,50	533,00	82,00	533,00
9	80X60 მმ კვადრატული მილით 26,4 მ, 100X100X8 მმ 8,2 მ კუთხოვანათა ცხაურის თავის მოწყობა (4,1X0,66 მ)	ც	1,00	360,00	360,00	1,00	360,00
10	გრეიდერის მუშაობა	მ/სთ	16,00	26,45	423,20	16,00	423,20
11	მქსკავატორის (JCB) მუშაობა	მ/სთ	16,00	34,28	548,48	16,00	548,48
12	აშე 10 ტ (ჯიხურების გადადგმა-გადმოღება)	მ/სთ	8,00	26,00	208,00	8,00	208,00
13	ფრაქციული ღორღის 0-40 შეტანა ზიდვა 10კმ	კმ	45,00	21,19	953,55	45,00	953,55
14	საფუძვლის დატკეპვა	მ/სთ	8,00	34,64	277,12	8,00	277,12
15	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით 935,0X0,05 მ (სასტუმროს ეზო)	კმ	47,50	349,52	16602,20	46,75	16340,06
16	ასფალტობეტონის დამკეპი	მ/სთ	16,00	21,45	343,20	16,00	343,20
17	საფარის დატკეპვა	მ/სთ	16,00	34,64	554,24	16,00	554,24

1	2	3	4	5	6	7	8
18	გზის დაზაზვა	კპ	20,00	10,50	210,00	20,00	210,00
19	დამხმარე მუშახელი	კ/სთ	110,00	4,60	506,00	110,00	506,00
20	საამშენებლო ნარჩენის გატანა 10 კმ-ზე	კპმ	50,00	8,48	424,00	50,00	424,00
	ჯ ა მ ი	ლარი			25407,69		25058,17
	ზედსაღები ხარჯები 8%	ლარი			2032,62		2004,65
	ჯ ა მ ი	ლარი			27440,31		27062,82
	გვერდითი დაკრძევა 7%	ლარი			1920,82		1894,40
	ჯ ა მ ი	ლარი			29361,13		28957,22
	დ. ღ. ბ. - 18%	ლარი			5285,00		5212,30
	ჯ ა მ ი	ლარი			34646,13		34169,52

= სამუშაო მიიღო =

= სამუშაო ჩააბარა =

ინსპექტირების მობილური ჯგუფი:

შ.პ.ს. „გ. ზამშენი-18“-ს

დირექტორი: _____



ქ. ოზურგეთი

27.02.2014

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. შ.პ.ს. „გზამშენი-18“-ის დირექტორის თეიმურაზ ჯახვას მომართვა (რეგისტრირებული 27.02.2014წ N 646) 20.02.2014 N60 ხელშეკრულებით (სახელშეკრულებო თანხა 34646.10 ლარი) გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების ინსპექტირებისა და ანაზღაურების შესახებ

ინსპექტირების ჯგუფი:

- თეიმურაზ ჩაველეშვილი (ჯგუფის უფროსი)
- ავთანდილ ჩხაიძე (ჯგუფის წევრი)
- კახაბერ კვაჭანტირაძე (ჯგუფის წევრი)
- რევაზ გუდაძე (ჯგუფის წევრი)
- ლევან მგელაძე (ქ. ოზურგეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული)

ინსპექტირების აქტი:


ინსპექტირების ობიექტები ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

1. ქ. ოზურგეთი გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩიდან რამიშვილის ქუჩაზე გამავალი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების მოცულობა შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეესაბამება ფორმა N 2 -ით მოცემულ სამუშაოთა საერთო ღირებულებას და შეადგენს 34169,52 ლარს (იხ. დანართი N 2)

20.02.2014 N60 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების
საერთო ღირებულება შეადგენს 34169,52 ლარს.

ინსპექტირების ჯგუფი:

- თეიმურაზ ჩავლეშვილი
- ავთანდილ ჩხაიძე
- კახაბერ კვაჭანტირაძე
- რევაზ გუდაძე
- ლევან მგელაძე

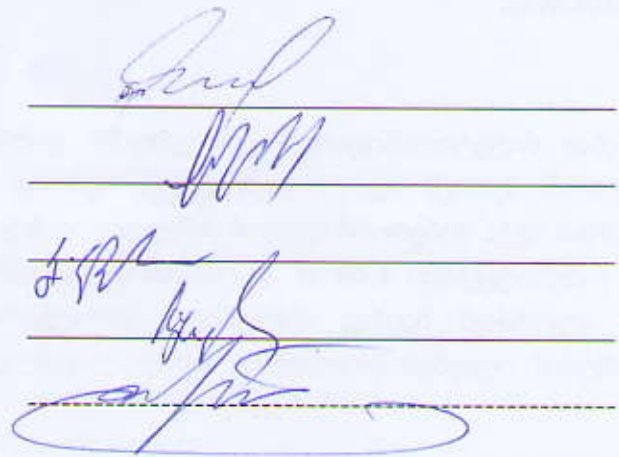

შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

- თემურ გიორგაძე



მიღება ჩაბარების აქტი N 60-1

ქ. ოზურგეთი

28.02.2014

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღურჯუმელიძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „გზამშენი 18“-ის დირექტორი თეიმურაზ ჯახვა ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 20.02.2014 N60 ხელშერულების შესაბამისად და 27.02.2014 წ. N 60-1 ინსპექტირების აქტის საფუძველზე შ.პ.ს „გზამშენი 18“-ის დირექტორმა თეიმურაზ ჯახვამ შეასრულა ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 34169,52 ლარს.

ჩავაბარე:

თ. ჯახვა

მივიღე :

გ. ღურჯუმელიძე

ს ა გ ა დ ა ხ ლ ო დ ა ვ ა ლ ე ბ ა N 1449

28 თებერვალი 2014 წ.

გადამხდელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

237112799

გადამხდელის ანგარიში

GE19VT4300000011063303

გადამხდელის ბანკი ვითიბი ჯორჯია ოზურგეთის ფილიალი

ბანკის კოდი

UGEBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადახდის გადამხდელზე
დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი

მიმღები

გვამშენი-18 შპს

237081206

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE34PC0463600100001256

მიმღების ბანკი/საზინა

პროკრედიტბანკი

ბანკის კოდი

MIBGGE22

გადახდის დანიშნულება

სტიქია

დამატებითი ინფორმაცია

ხელმ #60 განკ #1016

თ ა ნ ხ ა

34169.52

თანხა სიტყვებით

ოცდაათოთხმეტი ათას

ასსამოცდაცხრა ლარი - 52 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

ხელმოწერა:

შტამპის ადგილი

ხელმოწერები:

5/11

მ. ა.

