

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დსაბარო NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1	გა-02 8140309
---	---------------

3	ივნისი	2014
---	--------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვით, წელი)

4	27	ივნისი	2014
---	----	--------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვით, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	2	4	5	4	2	5	3	9	3		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს გზები
-----	-----------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	4	5	5	3	8	3	3	3		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	აჭარის არ მთავრობის საექვეუწ. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და სამედიკინური სისტემების მართვის დეპარტ.
-----	---

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშ.#60 25.03.2014 აქტი #1 თხილნარი ზედა თხილნარი ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა	მომსახურება		40456,9000	6171,3900	0,0000
სულ			40456,9	6171,39	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ხელშეკრულება # 60

ხელმოწერის თარიღი: 25 მარტი 2014 წელი

საგანი: საავტომობილო გზა "თხილნარი - ზედა თხილნარი" - კმ0+900 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

მიმწოდებელი: შპს "გზები"

საკონტრაქტო თანხა 40 457,00 ლარი

დღგ-ს ჩათვლით


გადახდა ნებადართულია

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

უფროსის მოადგილე /ს. დუმბაძე/

მთ. ბუღალტერი

/ზ. ანანიძე/

„“ „11.06.14“

„“ „11.06.14“

ხელმოწერა

თარიღი

ხელმოწერა

თარიღი

2014 წლის ივნისის თვის შესრულებულ სამუშაოთა ანაზღაურების სერტიფიკატი

#	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაოს დაწყებიდან საანგარიშო თვის ჩათვლით	საანგარიშო თვეში	შენიშვნა
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ-ს გარეშე	34 285,51	34 285,51	
2	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	6 171,39	6 171,39	
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება	40 456,90	40 456,90	
4	საავანსო თანხის გამოქვითვა 20 %			
9	ასანაზღაურებელი თანხა	40 456,90	40 456,90	

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების უფროსი

 /ა. გაბაიძე/
11.06.14წ

შპს "გზების" დირექტორი

/ი. აბაშიძე/



მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ბათუმი

11 ივნისი 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „გზების“ დირექტორი ირაკლი აბაშიძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „გზების“ 2014 წლის 25 მარტის #60 ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელა საავტომობილო გზა : "თხილნარი -ზედა თხილნარი" - კმ0+900 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები თანხით 40 456,90 (ორმოცი ათას ოთხასორმოცდათექვსმეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. სამუშაო შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების არსებული სტანდარტებისა შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

„შემსყიდველი“

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრი:

წევრი:

წევრი:

ს. დუმბაძე

ა. გაბაიძე

შ. ქათამაძე

ზ. ასამბაძე

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „გზების“ დირექტორი

ი. აბაშიძე

სავტომობილო გზა : "თბილისი - ზედა თბილისი" - კმ0+900 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულება # 60 25 მარტი 2014 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება

40 457,00 (ორმოცი ათას ოთხას ორმოცდახუთი ლარი და 00 თეთრი)

გენ. მოიჯარადის დასახელება და მისამართი: შპს "გზები" ს/კ 245 425 393 ბათუმი, აკაკი შანიძის I შეს. # 4

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი # 1

9 ივნისი 2014 წელი

№	შოფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთ.განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				ერთეულის	საკონტრაქტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	1-11-6	კედლის ფუნდამენტების ქვაბულის მოწყობა VI ჯგ. ლოდნარი გრუნტის დამუშავება მდ.კალაპოტში, ექსკავატორით V-1,0მ ³ შრომის დანახარჯი ექსკავატორი	1000 მ ³		0,190		433,56
			კაც/სთ	16	3,04	4,60	13,98
			მან/სთ	43,08	8,19	51,26	419,57
2	1-84-2	კედლის ფუნდამენტების მოსაწყობად კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სამტრედიის რაიონში.	მ ³		20,00		1 444,78
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,12	82,40	4,60	379,04
		სამტრედიის რაიონში მოძრავ კომპრესორზე	მან/სთ	1,3	26,00	40,99	1 065,74
3	სნ და V IV-2-82 1-88-2	წყლის ამოღება ქვაბულის დამუშავების დროს, 60მ ³ /სთ წყლის შემოდინების დროს	100 მ ³		2,10		864,30
		წყლის ტუმბო წარმადობით 63მ ³ /სთ	მან/სთ	51	107,10	8,07	864,30

4	30-3-2	ხრეშოვანი ბაღიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ შრომის დანახარჯი სხვა მანქანები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა	100 მ³ კაც/სთ ლარი მ³	2,12 0,15 0,71 110	0,07 0,15 0,71 7,70	4,6 3,20 26,82	209,43 0,68 2,26 206,48
5	30-5-1	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5 შრომის დანახარჯი ამწე პეკემოვლიან სვლაზე სხვა მანქანები ბეტონი B-18.5 ხის მასალა ნაჭედი სამშენებლო სხვა მასალა	100 მ³ კაც/სთ მან/სთ ლარი მ³ მ³ კმ ლარი	350,9 42,8 83,8 102 3,7 51,5 43,9	0,5240 183,87 22,43 43,91 53,45 1,94 26,99 23,00	4,60 27,66 3,20 118,42 430,27 4,50 3,20	8 965,44 845,81 620,34 140,52 6 329,53 834,20 121,44 73,61
6	37-64-3	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5 შრომის დანახარჯი ამწე პეკემოვლიან სვლაზე სხვა მანქანები ბეტონი B-18.5 ხის მასალა ნაჭედი სამშენებლო სხვა მასალა	100 მ³ კაც/სთ მან/სთ ლარი მ³ მ³ კმ ლარი	518 9,6 23,1 101,5 3,01 49 61,2	0,8200 424,76 7,87 18,94 83,23 2,47 40,18 50,18	4,60 27,66 3,20 118,42 430,27 4,50 3,20	13 492,06 1 953,90 217,74 60,61 9 856,43 1 061,99 180,81 160,59
7		პლასმასის სადრენაჟო მილი დ=100მმ	გრძ/მ	1	10,00	4,50	45,00
8	30-51-3	ორფენიანი პოდროზოლაცია ბიტუმით შრომის დანახარჯი სხვა მანქანები ბიტუმი	100 მ² კაც/სთ ლარი ტნ	56,4 4,09 0,225	0,72 40,61 2,94 0,16	4,60 3,20 1020,00	422,52 186,80 9,42 165,24

	სხვა მასალა	გარი	26,5	19,08	3,20	61,06
9	1-22-15 სრეშოვანი გრუნტის (ბაღასტის) ექსკავატორით V-0,5მ³ დატვირთვით ავტოვიომცვლელზე შრომის დანახარჯი ექსკავატორი V-0,5 მ³ სხვა მასალა	1000 მ³ მ-ს მ-ს გარი	20 44,8 2,1	0,280 5,60 12,54 0,59	4,6 18,4 3,2	258,45 25,76 230,81 1,88
10	სრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტ	280*1,75	490,0	7,35	3 601,50
11	1-11-15 სრეშოვანი გრუნტის (ბაღასტის) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება შრომის დანახარჯი ექსკავატორი V=0,5 მ³	1000 მ³ კაც/სთ მან/სთ	16,5 37	0,280 4,62 10,36	4,60 18,40	211,88 21,25 190,62
სულ:						
ზედნადები ხარჯები 8%:						
ჯამი:						
გეგმიური დაგროვება 6%:						
სულ ჯამი:						
დღგ 18 %						
სულ ჯამი						
მიმწოდებლის დასახელება						
/ზ.ასამბაძე/						

საავტომობილო გზების და სამელიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური
განყ.მთ. სპეციალისტები ტექ.ზედამხედველები

11.06.14

ზ.ქათამაძე/




შპს "გზების" სამშენებლო უბნის უფროსი:



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

ექსპერტიზის დასკვნა

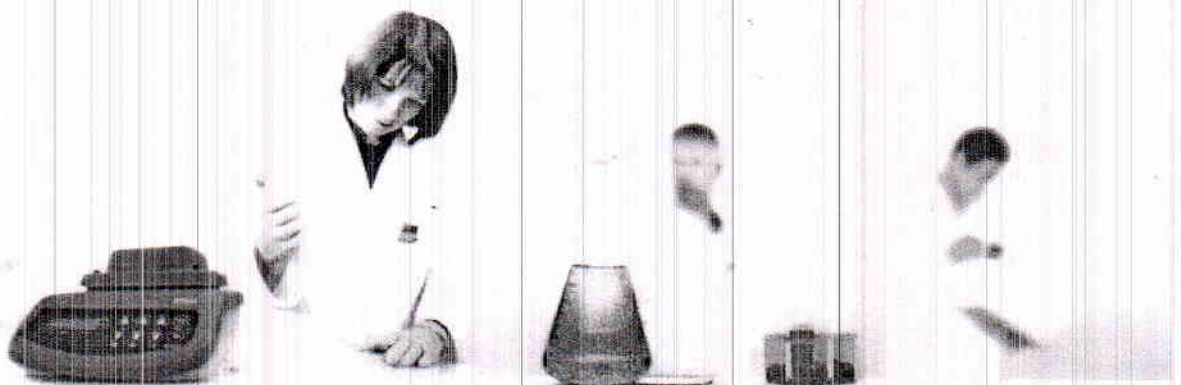

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

5002734114

2016

19/06/2014



5002734114

შპს „გზები“-ს წარმომადგენელს ბატონ თენგიზ ხაბაძეს

(ბათუმი შ.ხიმშიაშვილის ქ. N 41 ბ. 49)

ბატონო თენგიზ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი 2014 წლის 10 ივნისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1003651414) საფუძველზე, გიგზავნით ის 201406126314 დასკვნას.

დღენათი:

ექსპერტის დასკვნა 05 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტყეშელაშვილი გიორგი

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



003126314

ექსპერტის დასკვნა № 0031.26314

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დანიშნულება:

ორგანიზაცია: შპს „გზები“

თანამდებობა: წარმომადგენელი

მისამართი: მთელი შ.ხიშიაშვილის ქ. N 41 ბ. 49

სამელი და გვარი: თენგიზ ხაბაძე

საქონელი: განცხადება

შეპროექტებული ექსპერტები:

ბიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. კომპლექსური ჩატარებით ექსპერტიზა და დაადგინოთ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიმდინარე და ჯამური ღირებულება

შესრულების თარიღი: 10.06.2014წ

გასვლის თარიღი: 19.06.2014წ

დასკვნა

შპს „გზები“-ს მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში "თხილნარი-ზედა თხილნარი" ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი N 1-ის მიხედვით დ.დ.გ. გათვალისწინებით შეადგენს 40456,90 ლარს, რომელიც შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

ამოღებული კვლევითი ნაწილი.

თხილნარი N 1-03 ფურცლად.

ბიძინა მურადაშვილი

გამოკვლევა

განცხადებამ თანახმად დასადგენია შ.პ.ს. „გზები“-ს მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში "თხილნარი-ზედა თხილნარი"-ში ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ექსპერტმა კვლევა წარმოადგენილი მასალების და გამოსაკვლევო ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთმედარების მეუოდით.



003126314

ექსპერტის დასკვნა № 003126314

22.4 წლის ივნისში ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა, დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები. იმ სამუშაოებზე, რომლებიც განეკუთვნებიან ფარულ სამუშაოეთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებზედაც არ იქნა წარმოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულია წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. მაგრამ აღსანიშნავია ის რომ სამუშაო რომელზედაც წარმოდგენილია ექსპერტიზა წარმოადგენს ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, ხოლო წარმოდგენილ ფარულ სამუშაოთა აქტებში დაფიქსირებული მოცულობები ემთხვევა შესრულებულ სამუშაოში დაფიქსირებულ მოცულობას, ექსპერტიზის წინაშე წარმოდგენილ იქნა მასალათა შესყიდვების დოკუმენტაცია და ამ მასალათა შესყიდვების დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული მასალათა ერთეული ღირებულებები მეთხვევა შესრულებულ სამუშაოთა აქტში დაფიქსირებულ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს. იხ დანართი N1.

22.5 "გზები"-ს მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში "თხილნარი-ზედა თხილნარი" ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი N 1-ის მიხედვით დ.დ.გ. გათვალისწინებით შეადგენს 40456,90 ლარს, რომელიც შეესაბამება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

იხ დანართი N 1- 03 ფურცლად.

ბიძინა მურადაშვილი

გ. პიჩე

გამოყენებული მასალები

განმარტება .

შესრულებული სამუშაოების ჩაბარების აქტი.

მასალა შესყიდვების დოკუმენტაცია .

ფარულ სამუშაოთა აქტები.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

თ. თ.

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

თ. თ.

აკარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და საავტომობილო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დანართი N1

კონტრაქტის დასახელება:

საავტომობილო გზა : "თბილისი - ზედა თბილისი" - კმ0+900 მონაკვეთზე
ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

ხელმოწერის თარიღი:

ხელშეკრულება # 60 25 მარტი 2014 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება

40 457,00 (ორმოცი ათას ოთხას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 00 თეთრი)

გენ. მოთვარადის დასახელება და მისამართი: შპს "გზები" ს/კ 245 425 393 ბათუმი, აკაკი შანიძის I შეს. # 4

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი # 1

9 ივნისი 2014 წელი

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ერთ-განზ	რაოდენობა		ღირებულება	
				ერთეულის	საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8.00
1	1-11-6	კედლის ფუნდამენტების ქვაბულის მოწყობა VI ჯგ. ლოდნარი გრუნტის დამუშავება მდ.კალაბოტში, ექსკავატორით V-1,0მ³ შრომის დანახარჯი ექსკავატორი	1000 მ³		0.190		433.56
2	1-84-2	კედლის ფუნდამენტების მოსაწყობად კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სამტრედი ჩაქუჩით.	მ³	16 43.08	3.04 8.19	4.60 51.26	13.98 419.57
					20.00		1,444.78
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.12	82.40	4.60	379.04
		სამტრედი ჩაქუჩი მოძრავ კომპრესორზე	მან/სთ	1.3	26.00	40.99	1,065.74
3	16 და V IV-2.82 1-84-2	წყლის ამოტუმბვა ქვაბულის დამუშავების დროს, 600მ³/სთ წყლის შემიღების დროს	100 მ³		2.10		864.30

		წელის ტუმბო წარმადობით 63მ³/სთ	მანქ/სთ	51	107.10	8.07	864.30
4	30-3-2	სრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100 მ³		0.07		233.80
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.12	0.15	4.6	0.68
		სხვა მანქანები	ლარი	10.1	0.71	37.67	26.63
		ქვიშა-სრეშოვანი მასალა	მ³	110	7.70	26.82	206.48
5	30-5-1	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100 მ³		0.5240		9,620.73
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	350.9	183.87	4.60	845.81
		ამწე პნეუმოფლიან სელაზე	მან/სთ	42.8	22.43	27.66	620.34
		სხვა მანქანები	ლარი	83.8	43.91	38.78	1,702.88
		ბეტონი B-18.5	მ³	102	53.45	101.69	5,435.13
		ხის მასალა	მ³	3.7	1.94	423.73	821.53
		ნაჭედი სამშენებლო	კმ	51.5	26.99	4.50	121.44
		სხვა მასალა	ლარი	43.9	23.00	3.20	73.61
6	37-64-3	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100 მ³		0.8200		12,736.10
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	518	424.76	4.60	1,953.90
		ამწე პნეუმოფლიან სელაზე	მან/სთ	9.6	7.87	27.66	217.74
		სხვა მანქანები	ლარი	23.1	18.94	37.67	713.55
		ბეტონი B-18.5	მ³	101.5	83.23	101.69	8,463.66
		ხის მასალა	მ³	3.01	2.47	423.73	1,045.85
		ნაჭედი სამშენებლო	კმ	49	40.18	4.50	180.81
		სხვა მასალა	ლარი	61.2	50.18	3.21	160.60
7		პლასმასის სადრენაჟო მილი დ=100მმ	გრძ/მ	1	10.00	4.50	45.00
8	30-51-3	ორივენიანი პოდროზოდაცია ბიტუმით	100 მ²		0.72		498.82
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	56.4	40.61	4.60	186.80
		სხვა მანქანები	ლარი	4.09	2.94	37.67	110.93

