

მიღება-ჩაბარების აქტი №236

30 მაისი 2018 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგებელი კახაბერი ლაბუჩიძე და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი +“-ს დირექტორი აზმიფ ბადოიანი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა მიაწოდა და შემსყიდველმა მიიღო მხარეებს შორის 2018 წლის 4 აპრილს გაფორმებული №02.09.16/10/074 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რაიონის ტერიტორიაზე, მ. აბრამიშვილის ქუჩა N37-ში მდებარე შენობის ფასადიდან დაზიანებული-ავარიული ფილებისა და ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნის სამუშაოები, ღირებულებით 13 391,16 (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი) ლარი. შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტი - ფორმა N2 დადასტურებულია გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი სპეციალისტის რამაზ თაბაგარის ხელმოწერით. ხელშეკრულების მე-5 პუნქტის 5.2 ქვეპუნქტის თანახმად, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილია აკრედიტირებული პირის შპს „რეალექსპერტი“-ს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ღირებულების (ერთეულის ფასების) ფაქტიურ დანახარჯებთან შესაბამისობის შესახებ, რომლის თანახმადაც, შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულებამ შეადგინა 13 330,57 (ცამეტი ათას სამას ოცდაათი ლარი და 57 თეთრი) ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულების ჩათვლით. ვინაიდან, ექსპერტიზის დასკვნას ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა, შპს „მშენებელი +“-ზე ჩასარიცხი თანხის ოდენობა შეადგენს 13 330,57 (ცამეტი ათას სამას ოცდაათი ლარი და 57 თეთრი) ლარს.

აქტი შედგენილია 3 (სამი) ეგზემპლარად და სამივეს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

ისნის რაიონის გამგებელი



კ. ლაბუჩიძე

ბ.ა


შპს „მშენებელი +“-ს  
დირექტორი

ა. ბადოიანი

ბ.ა



შპს „რეალექსპერტი“  
მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23  
ტელ: +995 322 99 55 56  
+995 599 55 16 23  
ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"  
ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA  
TEL: +995 322 99 55 56  
+995 599 55 16 23  
Email: realekspert2015@gmail.com



სსიპ ისო/ივე  
17020:2012/2013  
GAC-IB-0147

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში



საპ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –  
აკრედიტაციის ცენტრი“

# აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0147

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. #23;

ფილიალი: ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქ. #2;

ფილიალი: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ. #27ა;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით) 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; 5. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება; 6. სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობების, ნაგებობების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა, კონსტრუქციული ნაწილი, არქიტექტურული ნაწილი, საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიციონერება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი. (იხ. დანართი - აკრედიტაციის სფერო“); (იხ. დანართი - ქ. ფოთის ფილიალის აკრედიტაციის სფერო“); (იხ. დანართი - ქ. ბათუმის ფილიალის აკრედიტაციის სფერო)

აკრედიტაციის ცენტრის  
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი  
28 დეკემბერი 2017 წ.

ქალაქშია  
20 ივლისი 2020 წ.

საპ GAC



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ქ.თბილისი

30.05.2018 წ.

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულის სტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯვროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



---

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

---

ინსპექტირების ობიექტი: ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, მ. აბრამიშვილის № 37, გარე ფასადის ფილების მოხსნითი სამუშაოები.

---

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი №R-E.MP.G09.390.18

---

დამკვეთი: შპს „მშენებელი“ ს.კ.406209320.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: ლევან თოფჩიაშვილი.

ტექნიკური მენეჯერი: დავით გელიაშვილი.

---

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის ფორმა №2-ის ინსპექტირება.

---

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: 2018 წლის 04 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 02.09.16/10/074, ხელშეკრულების დანართი ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2), დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოთა აქტები, სასაქონლო ზედნადებები სამშენებლო მასალათა შესყიდვაზე, პროპიტი ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს „მშენებელი +“-ს მიერ ისნის რაიონში შესრულებული მ. აბრამიშვილის ქუჩა № 37 შენობის ფასადიდან ფილებისა და ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნის სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ინსპექტირების მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგინა 13 330,57 ლარი (ცამეტი ათას სამას ოცდაათი ლარი და 57 თეთრი), ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე და ინსპექტირების ხარჯის ჩათვლით, რაც წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ 13 391,16 ლარზე (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი) – 60,59 ლარით (სამოცი ლარი და 59 თეთრი) ნაკლებია.

ვრცლად იხ: გამოკვლევით ნაწილში.

დანართი: დანართი N1 წარმოდგენილი ფორმა №2 2 ფ-ზე; იხ: დანართი №2 – ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2 2 ფ-ზე; ფოტოილუსტრაცია 1 ფ-ზე; ფარული სამუშაოების აქტი 7 ფ-ზე

გამოკვლევა

როგორც წარმოდგენილი განცხადებიდან და დოკუმენტებიდან ირკვევა, გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს ქალაქ თბილისში, სადაც შპს „მშენებელი +“-ს მიერ ისნის რაიონში შესრულებულია მ. აბრამიშვილის ქუჩა № 37 შენობის ფასადიდან ფილებისა და ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნის სამუშაოები.

ინსპექტირებაზე კვლევისთვის წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები: 2018 წლის 04 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება № 02.09.16/10/074, ხელშეკრულების დანართი ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 13 391,16 ლარზე (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი) ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე და ინსპექტირების ხარჯის ჩათვლით, შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2) ღირებულებით 13 391,16 ლარზე (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი) ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე და ინსპექტირების ხარჯის ჩათვლით (იხ: დანართი N1 – წარმოდგენილი ფორმა №2), დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოთა აქტები, სასაქონლო ზედნადებები სამშენებლო მასალათა შესყიდვაზე და ნარდობის ხელშეკრულებები – სახელფასო უწყისი, სატრანსპორტო ხარჯებზე შრომითი ხელშეკრულება.

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება N55-ის მოთხოვნათა შესაბამისად (ფაქტიური დანახარჯები).

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი, სადაც შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად ჩავატარე ხილული სამუშაოების აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მოცულობების დადგენაც ინსპექტირების ჩატარების პერიოდისათვის ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი დამკვეთთან შეთანხმებული ფარული სამუშაოთა

აქტებიდან. ფორმა №2-ში მოცემული სამშენებლო მასალათა ერთეული ღირებულებები შედარებული იქნა წარმოდგენილ სამშენებლო მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში (სასაქონლო ზედნადებები) მოცემულ სამშენებლო მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურებების ერთეული ღირებულებები შედარებულ იქნა წარმოდგენილ სახელფასო უწყისის მონაცემებს, სატრანსპორტო ხარჯების ღირებულება შედარებულ იქნა წარმოდგენილ შრომით ხელშეკრულებაში (სამშენებლო მასალათა გადაზიდვა) ასახულ მონაცემებს.

აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემებისა და ფარული სამუშაოთა აქტების შედარებით შესრულებულ სამუშაოთა აქტებთან (ფორმა №2) დადგინდა, რომ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა მოცულობები, შეესაბამება შესრულებულ სამუშაოთა აქტებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა №2-ებში მოცემული სამშენებლო მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სამშენებლო მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში (სასაქონლო ზედნადებები) მოცემულ სამშენებლო მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზღაურებების ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ შრომით ხელშეკრულებაში ასახულ მონაცემებს, ხოლო სატრანსპორტო ხარჯების ღირებულება (სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება), ვინაიდან აღნიშნული ხარჯები გათვალისწინებული იქნა წარმოდგენილ სამშენებლო მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციაში (სასაქონლო ზედნადებები), ჩემს მიერ იქნა გაკორექტირებული (იხ. დანართი №2 - დაკორექტირებულ ფორმა №2-ში გაშუქებული ნაწილი), შესაბამისად დადგინდა შემდეგი:

შპს „შენებელი +“-ს მიერ ისნის რაიონში შესრულებული მ. აბრამიშვილის ქუჩა № 37 შენობის ფასადიდან ფილებისა და ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნის სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ინსპექტირების მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგინა 13 330,57 ლარი (ცამეტი ათას სამას ოცდაათი ლარი და 57 თეთრი), ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე და ინსპექტირების ხარჯის ჩათვლით, რაც წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ 13 391,16 ლარზე (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი) – 60,59 ლარით (სამოცი ლარი და 59 თეთრი) ნაკლებია. (იხ: დანართი N1 წარმოდგენილი ფორმა №2 2 ფ-ზე; იხ: დანართი №2 – ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2 2 ფ-ზე; ფოტოილუსტრაცია 1 ფ-ზე; ფარული სამუშაოების აქტი 7 ფ-ზე).

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: სიგრძის მზომი (ლაზერული)-016, DEWALT საზომი ლენტი (რულეტი) №150- 019.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია: სამშენებლო წესები და ნორმები, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N55, ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები № R-E.TP.G02, № R-E.TP.G03.

შემსრულებელი ინსპექტორი : ლევან თოფჩიაშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: დავით გელიაშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



უკვე დასრულებულია მისამართი: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი, მ. აბრამიშვილის 37 ----- 2018 წ.

ბარე ვასილის შიშველი მოსახლის სასახლის

შპს "მშენებელი"

სულ: 13 391, 16 ლ



დაამუშავეთ: ისნის რაიონის გამგეობა

შპს "მშენებელი"

ბეღელელების № 02.09.16/10/074 თარიღი: 04.05.2018წ

ობიექტის დასრულება: 27. 05. 2018წ

ფორმა № 2-ის წარდგენა: 28. 05. 2018წ

შეკვეთებულა: სართული: 4

№	სამუშაოს დახარჯების დასახელება	დღე/შუაღმწიკი	დღე/შუაღმწიკი	მასალა		ხელფასი		ჯამ
				ბუნ. რესურსი	სხვ.	ბუნ. რესურსი	სხვ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სამშენებლო ობიექტზე დამცავი ღირებულების მონაცემი უსაფრთხოების მიზნით:	კვმ	150			2.00	300.00	300.00
ა)	ხის მასალა	კმუბ.	2	520.00	1040.00			1040.00
ბ)	ლურსმანი სამშენებლო	კმ	8	3.00	24.00			24.00
გ)	გოფრირებული მოთუთიებული თუნუქი 0.5მმ	კვმ	150	11.50	1725.00			1725.00
2	ფასადიდან დამიანებული ფილების მოხსნა	კვმ	830			2.80	2324.00	2324.00
3	ჩამოსხნილი ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნა	კვმ	460			1.80	828.00	828.00
4	სამშენებლო კალათა (ლულკა). გადაადგილება-დაშვება ვერტიკალურ ჰორიზონტალურად	ლაშვება	60			35.00	2100.00	2100.00
5	ამწე კალათის მომსახურება	დღე	7			230.00	1610.00	1610.00

*Handwritten signature in blue ink.*

6	დემონტრებული ფილების ჩამოტანა- დასაწყობება	ტ	12			25.00	300.00	300.00
7	სპეციალური ტომრები დემონტრებული ნარჩენებისთვის	ც	200	0.50	100.00			100.00
8	დემონტრებული დამანებული ბეტონის ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	8			25.00	200.00	200.00
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	ტ	20			15.00	300.00	300.00
10	სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება	სვ.ტ.კ.ზი	1			50.00	50.00	50.00
11	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 2.5კმ-ზე	სვ.ტ.კ.ზი	3			50.00	150.00	150.00
	ჯ ა მ ი	ლარი			2889.00		8162.00	11051.00
	ზედნაღები ხარჯები	10%						1105.10
	ჯ ა მ ი	ლარი						12156.10
	გვეგვიური დაგროვება	8%						972.49
	ჯ ა მ ი	ლარი						13128.59
12	ექსპერტიზის მომსახურება	%	2%					262.57
	ჯ ა მ ი	ლარი						13391.16

სულ: 13 391, 16 ლ (ცამეტი ათას სამას ოთხმოცდაათერთმეტი ლარი და 16 თეთრი)

ჩამომხატომი: ინტის რაიონის გამგეობა  
 მის: ქ.თბილისი. ნაგებულის ქ 8/5  
 ს/კ 208 204 959  
 ტელ: 2 37 50 29; 2 31 88 96

ჩამომხატომი: შ.პ.ს "ფინანსი" +  
 დირექტორი: ანდრეას ბალონიანი  
 მის: ქ.თბილისი. სამიხროს ბასსკოელი 2  
 ტელ: 577 12 13 05; ს/კ 406209320  
 ა/გ GE 55 TB 735 053 608 010 000 9 GEL



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი. ისნის რაიონი. მ. აბრამიშვილის 37

ბარე შასაღის ფილების მოხსნითი სამუშაოების

ფორმა№2

ღამკვეთი: ისნის რაიონის გამგეობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს "გვინებელი"

ხელშეკრულების № 02.09.16/10/074 თარიღი: 04.05.2018წ

ობიექტის დასრულება: 27. 05. 2018წ

შეკვეთებულის: სართული: 4

ფორმა №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	დღე/შუაღმწიკი	დღა/მწიკი	მ ა ს ა ლ ა		ხ ე ლ ფ ა ს ი		ფიჯ
				მწიკი	მწიკი	მწიკი	მწიკი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სამშენებლო ობიექტზე დამკვედი ღირებულების მოხსნა უსაფრთხოების მიზნით:	კვ.მ	150			2,00	300,00	300,00
ა)	ხის მასალა	კმუბ.	2	520,00	1040,00			1040,00
ბ)	ლურსმანი სამშენებლო	კმ	8	3,00	24,00			24,00
გ)	გოფრირებული მოთუთიებული თუნუქი 0.5მმ	კვმ	150	11,50	1725,00			1725,00
2	ფასადიდან დამიანებული ფილების მოხსნა	კვმ	830			2,80	2324,00	2324,00
3	ჩამოხსნილი ფილების უკან არსებული ბეტონის საფარის მოხსნა	კვმ	460			1,80	828,00	828,00
4	სამშენებლო კალათა (ლულკა). გადაადგილება-დამება ვერტიკალურ კორიზონტალურად	დამება	60			35,00	2100,00	2100,00
5	ამწე კალათის მომსახურება	დღე	7			230,00	1610,00	1610,00

6	დემონტირებული ფილების ჩამოტანა-დასაწყობება	ტ	12				25,00	300,00	300,00
7	სპეციალური ტომრები დემონტირებული ნარჩენებისთვის	ც	200	0,50	100,00				100,00
8	დემონტირებული დაზიანებული ბეტონის ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	8				25,00	200,00	200,00
9	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/თვითმცლილზე	ტ	20				15,00	300,00	300,00
10	სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება	სვ.გ.ე.ზი	0				50,00	0,00	0,00
11	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 25კმ-ზე	სვ.გ.ე.ზი	3				50,00	150,00	150,00
	ჯ ა მ ი	ლარი			2889,00			8112,00	11001,00
	ზედნადები ხარჯები	10%							1100,10
	ჯ ა მ ი	ლარი							12101,10
	გემიური დაგროვება	8%							968,09
	ჯ ა მ ი	ლარი							13069,19
12	ექსპერტიზის მომსახურება	%	2%						261,38
	ჯ ა მ ი	ლარი							13330,57

შპს „რეალექსპერტი“-ს ინჟინერი:



ლ. თოჭიაშვილი

ფარული სამუშაოების აქტი № 1

ობიექტის დასახელება ---- მ. აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი „05“ „05“ 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: მ.პ.ს „მშენებელი“



*მზიერ ჯგერიაძე*

(შემსრულებელი)

„თბილისის, ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი *[Signature]*

შეღვა აქტი შემდგომ:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია სამშენებლო ობიექტზე დაბეჭდილი ლომის მოწყობა უსფიხიქის მიხედვით. 150 კვ.მ. (სს ოხმოყდაში)

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: ნის მასალა 2 მ<sup>3</sup> (ოხ); დუხბანი სამჭრებლო 8 ავ (ხვ); ვოფხიხელი მორთილელი თუნჯი 0,5 ავ 150 კვ.მ. (სს ოხმოყდაში)

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 05.05.2018წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი 07.05.2018წ

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. ფასიდან დაბრუნებული ვიდეოს მოხსნაზე.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი --- მ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) *მზიერ ჯგერიაძე*



„თბილისის, ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი *[Signature]*

*[Signature]*

ობიექტის დასახელება ---- მ. აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი

„ 07 „ „ 05 „ 2018 წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:

მ.პ.ს „მშენებელი“

ა. ბერიძე



(შემსრულებელი)

„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

შეღვა აქტი შემდეგზე:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია ფასადის დაზიანებული ფილების მოხსნა 830 კვ-მ (ჩვენს ოქლაში)

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: ხელნაწილი დოკუმ (პროექტი),  
აქტი კომპლ

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი ---- 07. 05. 2018 წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი ---- 16. 05. 2018 წ

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმდების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. ჩამოხსნილი ფილების ყველ ჩსუბლოი ტექონის სეჟის მოხსნაზე

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ---- მ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) ა. ბერიძე



„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

ობიექტის დასახელება ---- მ.აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი

„16“ „05“ 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:

შ.პ.ს „მშენებელი“

მ. აბრამიშვილი



(შემსრულებელი)

„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

შეღვა აქტი შემდეგზე:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია ჩამოსხნილი ფილტვის უკან ასეუბლი ტიპის სვეტის მოხსნა 460 კვ.მ. (თიხის სპილენძი)

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: სამშენებლო ნივთიერებები (სვეტი, სვეტი, აქტი)

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 16.05.2018წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი 25.05.2018წ

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. სამშენებლო ნივთიერებებს და აქტის გადამამოწმებელს - დასრულებულზე. ნივთიერების ვიდეოზე ასეუბლი სვეტი.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი

შ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) მ. აბრამიშვილი



„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ფარულსამუშაოებისაქტი № 4

ობიექტის დასახელება ---- მ.აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი

„05 „ „05 -----, 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:

შ.პ.ს „მშენებელი“

ა.ძეგლაძე



(შემსრულებელი)

„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

შეღვა აქტი შემდეგზე:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია სამშენებლო კუროის (დელა) გეგმობითი-დაჭაბ 60 დაჭაბ (სამოს)

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია:

(მასაღის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 05 05 2018 წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი 25 05 2018 წ

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწვობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. დამოწმებული მსოის ჩამონათვალი (ხელსე მსოის რეგისტრის დასრულების შემდეგ).

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) ა.ძეგლაძე



„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

ობიექტის დასახელება ---- მ. აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი „10“ „05“ 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: შ.პ.ს „მშენებელი“

აქტი



(შემსრულებელი)

„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

შედგა აქტი შემდგომად

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია აქტი კალათის მოძსხეს. 4 ლა (შვიდი)

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: აქტი კალათ.

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 10.05.2018წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი 17.05.2018წ

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. სმშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი რ. თაბაგარი - დს - ნსოთესზე.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ---- შ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) ა. ბერიძე



„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ფარული სამუშაოების აქტი № 6

ობიექტის დასახელება ---- მ.აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი „06“ „05“ 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: მ.პ.ს „მშენებელი“

აქტი (შემსრულებელი)



„თბილისის, ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

შეღვა აქტი შემდეგზე:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია სამშენებლო ნახევრის და რემონტირებული მასალის რამდენიმე ნაწილი, მისთვის ა/ა ვიდეო (ეკრაიზი) -> 20 ცონა (20) თბი.  
სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: სწავლილი ცოთხეტი რემონტირებული ნახევრისთვის 200 ცელი (თბი).

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 06.05.2018წ

სამუშაოს დასრულების თარიღი 27.05.2018წ.

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა. სამშენებლო ნახევრის სწავლილი ცოთხეტი.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი: მ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) აქტი



„თბილისის, ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

Handwritten signature in blue ink.



ფარულსამუშაოებისაქტი № 7

ობიექტის დასახელება ---- მ.აბრამიშვილის N37 ----- (გარე ფასადის სამუშაოები)

ქ. თბილისი

„09“ „05“ 2018წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:

შ.პ.ს „მშენებელი“

ს. სტოიანი



„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

შედგა აქტი შემდეგზე:

სამშენებლო სამუშაოს სახეობის დამოწმებასა და მიღებაზე წარმოდგენილია სამშენებლო ნახევრის ცხნისწილი ა/თვითმწილით 25 კმ. მნიშვნე. 20 ცონა. (3 სკლა კვნი) ატაშიჩიკაძე.

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებულია: 5/ თვითმწილით ცხნისწილი.

(მასალის ჩამონათვალი)

სამუშაოს დაწყების თარიღი 09 - 05 - 2018 წ.

სამუშაოს დასრულების თარიღი 27 - 05 - 2018 წ.

სამუშაოები შესრულებულია სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს. წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწიბი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ---- შ.პ.ს „მშენებელი“

(შემსრულებელი) ს. სტოიანი






„თბილისის. ისნის რაიონის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების

უფროსი სპეციალისტი: რ. თაბაგარი

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

მ. აბრამიშვილის ქუჩა № 37 შენობის ფასადიდან ფილებისა და ფილების უკან  
არსებული ბეტონის საფარის მოხსნის სამუშაოები.

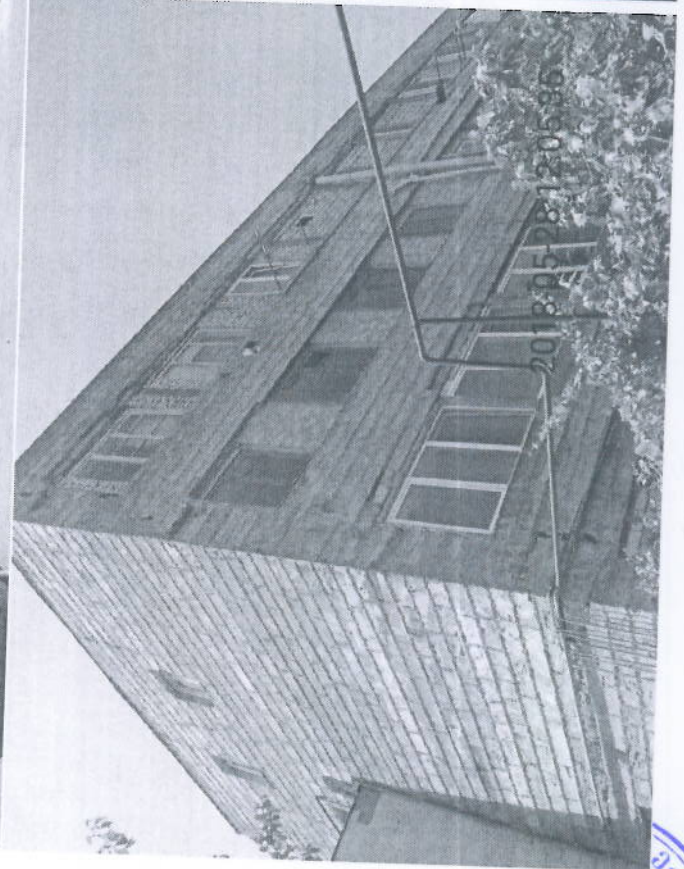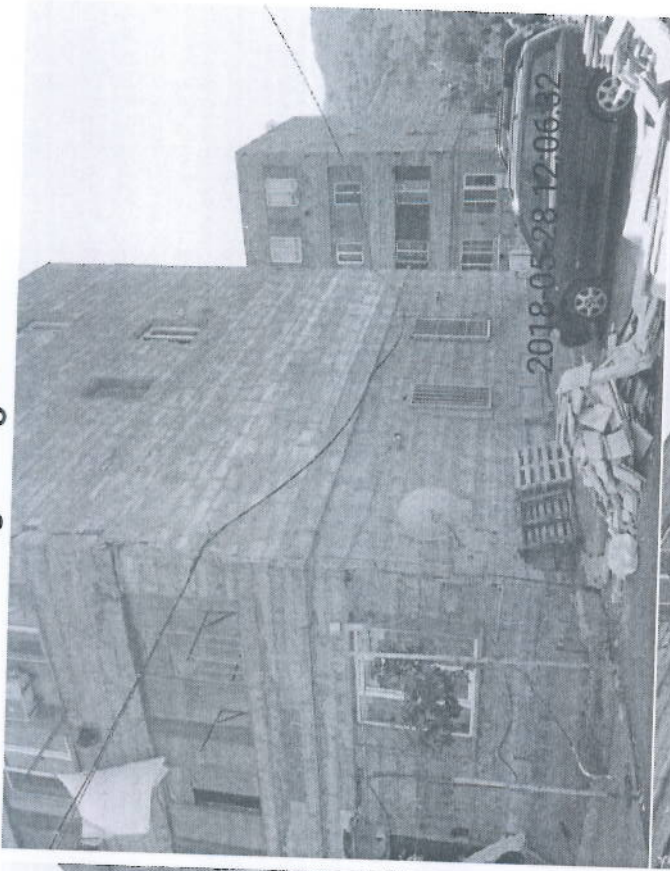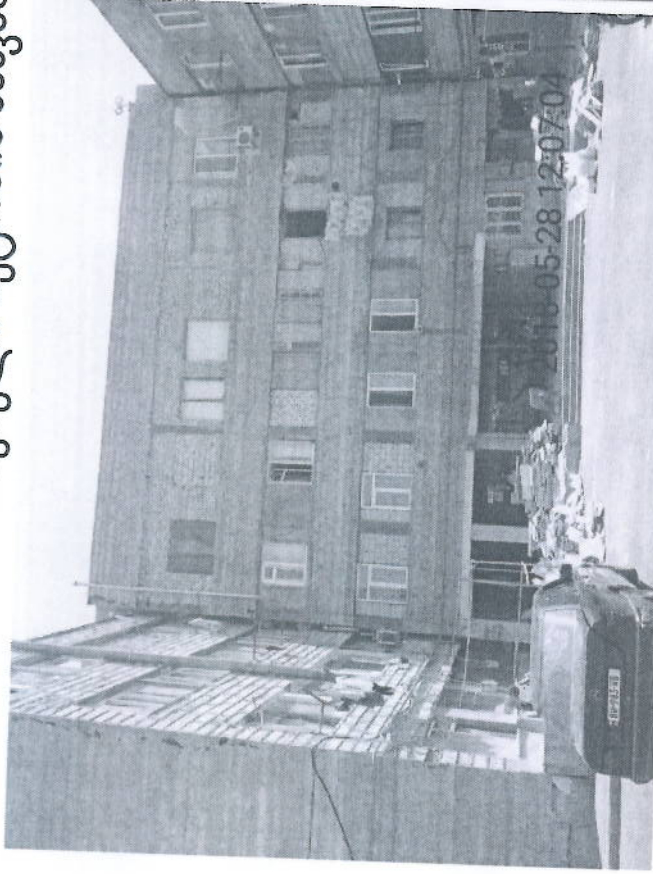

*Handwritten signature in blue ink.*
