

შპს „რეალექსპერტი“

მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23

ტელ: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

ელ. ფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"

ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA

TEL: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

Email: realekspert2015@gmail.com



სტ იხ/ივ  
17020:2012/2013  
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –  
აკრედიტაციის ცენტრი“

# აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

ცენტრალური ოფისის მის: ქ. თბილისი, ათონელის ქ.#23;

ფილიალის მის: ქ. ქუთაისი, გურამიშვილის ქ. N61/71;

ფილიალის მის: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქ.#27ა;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის  
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებული შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარვეზდროების ინსპექტირება; 2. ობიექტზე მართლაცხული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით); 3. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; 4. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის მართლაცხული სამშენებლო, სადემონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო, საინჟინერიო სამუშაოების ინსპექტირება; 5. სამშენებლო ობიექტის პროექტის (ფუნდამენტის, ნაგებობების, სადემონტაჟო გზების და სხვა საშობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინერიო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა, კონსტრუქციული ნაწილი, არქიტექტურული ნაწილი, საინჟინერო ქვებზე (ელ. ზონისაგან) ხისტოგრაფია, სუსტი ფენების ხისტოგრაფია) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი. საინჟინერო ქვებზე (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალსამწვანა და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი, საინჟინერო ქვებზე ცენტრალურა, კონფორმაცია, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი. ზაფხულის ფილიალი: 1. ობიექტის ხარვეზდროების ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარვეზდროების ფუნქციონირების ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტზე მართლაცხული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით); 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება; ქუთაისის ფილიალი: 1. ობიექტის ხარვეზდროების ფუნქციონირების ადეკვატურობის ინსპექტირება; 2. ობიექტზე მართლაცხული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით); (იხ. დანართი - „აკრედიტაციის სფერო“)

აკრედიტაციის ცენტრის  
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი

16 მაისი 2019 წ.

ძალაშია

20 ივლისი 2020 წ.



**ინსპექტირების ანგარიში N R-E.TP.G04.FA.K.74-2.19**

A. ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა 

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა #2) ინსპექტირება.

---

ინსპექტირების ობიექტი: სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი # R-E.MP.G09.K74.19

---

დამკვეთი: ინდ. მეწარმე „თამარ კილაძე“ პ/ნ. 600020004752 მის. ქუთაისი ბერძენაძის #37.

დირექტორი: თამარ კილაძე.

---

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: დავით ცირამუა

ტექნიკური მენეჯერი: ვენედიქტე თათელიშვილი

---

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის, ფორმა #2-ის ინსპექტირება.

---

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #158 / 19/08/19, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოს აქტი - ფორმა #2, მიღება-ჩაბარების აქტი, ფარული სამუშაოს აქტი.



ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ინდ. მეწარმე „თამარ კილაძე“-ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 13868,97 (ცამეტი ათას რვაას სამოცდარვა ლარი და 97 თეთრი) ლარი, დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 372,17 (სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 17 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოების მოცულობების დაკორექტირებით.

დანართი: კორექტირებული ფორმა N2, 2(ორი) ფურცელი; ფარული სამუშაოთა აქტი, 2 (ორი) ფურცელი; ფოტოილუსტრაცია, 2(ორი) ფურცელი.

გამოკვლევა

განაცხადის თანახმად დასადგენია ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციაზე, ინდ მეწარმე „თამარ კილაძე“-ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა შესრულებულ სამუშაოს აქტები, ხელშეკრულება N158 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, 19/08/2019, შეთანხმება N158-1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანაზე, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 14668,37 (თოთხმეტი ათას ექვსას სამოცდარვა ლარი და 37 თეთრი) ლარი დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2 ჯამური თანხით 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდა ერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტები.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი, სადაც დამკვეთის თანდასწრებით განვახორციელე შესრულებული ხილული სამუშაოს აზომვები. ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა #2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს, რის გამოც ისინი ინსპექტირებით კორექტირებული იქნა (იხ. დანართი გამოუქმებულ ფურცლებში), ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მოცულობის დადგენაც ინსპექტირების ჩატარების პერიოდისათვის ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, გათვალისწინებული იქნა ტექნიკური ზედამხედველობის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტები.

იმის გამო, რომ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მიერ გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებით და მისი ღირებულება არ აღემატება 40000 ლარს, ფორმა #2-ის ინსპექტირება ჩატარდა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27

10.11

თებერვლის #121 დადგენილების შესაბამისად, ფორმა #2-ში ნაჩვენები სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები და ნორმატიული დარიცხვები შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვაში ნაჩვენებ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებსა და ნორმატიულ დარიცხვებს. ასევე ფორმა #2-ში წარმოდგენილი სამუშაოები შესაბამისობაშია სამშენებლო ნორმებთან და წესებთან.

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტყიბულის რაიონში სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ინდ. მეწარმე „თამარ კილაძე“-ის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 13868,97 (ცამეტი ათას რვაას სამოცდარვა ლარი და 97 თეთრი) ლარი, დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 14241,14 (თოთხმეტი ათას ორას ორმოცდაერთი ლარი და 14 თეთრი) ლარისა, დღგ-ს გარეშე და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 372,17 (სამას სამოცდათორმეტი ლარი და 17 თეთრი) ლარს, რაც გამოწვეულია სამუშაოების მოცულობების დაკორექტირებით.

ინდ. მეწ. „თამარ კილაძის“ მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი ვიზუალურად დამაკმაყოფილებელია.

დანართი: კორექტირებული ფორმა #2,2(ორი) ფურცელი; ფარული სამუშაოთა აქტი, 2 (ორი) ფურცელი; ფოტოილუსტრაცია, 2(ორი) ფურცელი.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: შუქური მანძილზომი - 001, STANLEY TLM 210, #202741365; საზომი ლენტი (რულეტი) #2-003, LIANGJIN; ფოტოაპარატი 004.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია: 1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CH и П - ნაწილი IV-82); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (EH и P);

3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება #55); 5. საქართველოს

მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის #121 დადგენილების; 6. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP. G02.16

შემსრულებელი ინსპექტორი: დავით ცირამუა  
ტექნიკური მენეჯერი: ვენედიქტე თათელიშვილი  
ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ალექსანდრე ხურციძე



ქ. ტყიბულის მერს, ბატონ თემურ ჩუბინიძეს

ი-მ თამარი კილაძე გაცნობებთ, რომ ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება # 158-ის თანახმად ვასრულებთ სამუშაოებს სოფელ ორპირში მუშაობის დროს გამოიკვეთა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების გარდა სხვა სამუშაოები, რომელიც ითხოვს თანხის გადაადგილებას.

გიგზავნით კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

25.09.2019 წ

ი-მ თამარი კილაძე



ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ თემურ ჩუბინიძეს

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ თანახმა ვარ N158 და N159 ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდეს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვებით.



შეთანხმება N158/1  
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 და 2019 წლის 30 იანვრის N112 განკარგულებების საფუძველზე ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე“-ს შორის 2019 წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N158 ხელშეკრულება, ღირებულებით 14678.69 (თოთხმეტიათასექვსას სამოცდათვრამეტი ლარი და 69 თეთრი) ლარი.

აღნიშნული ხელშეკრულებით განსაზღვრულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება (შემდგომში - სამუშაო).

მიმწოდებელი ორგანიზაციის 2019 წლის 25 სექტემბრის მომართვისა და საპროექტო ორგანიზაციის თანხმობის საფუძველზე: ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის თემურ ჩუბინიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორეს მხრივ ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე“ წარმოდგენილი თამარ კილაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი") "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობისა და 2019 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N158 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის პირობებიდან გამომდინარე ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2019 წლის 19 აგვისტოს N158 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით. (ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის)
2. 2019 წლის 19 აგვისტოს N158 ხელშეკრულების მე-2 მუხლში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება განისაზღვროს 14668,37 (თოთხმეტიათასექვსას სამოცდათვრამეტი ლარი და 37 თეთრი) ლარით.
3. ეს შეთანხმება ძალაში შედის 2019 წლის 17 ოქტომბრიდან
4. ვალდებულებები, რომელთაც ეს შეთანხმება არ შეეხება, დარჩეს უცვლელად.
5. შეთანხმება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის.
6. ეს შეთანხმება თანდართული ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით, წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაშია ხელშეკრულებასთან ერთად.

მხარეთა რეკვიზიტები.

შემსყიდველი.

ს.ს.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტი“  
ქ. ტყიბული, კ. ლომაძის მოედანი #3  
საიდენტიფიკაციო კოდი 219636259

მიმწოდებელი.

ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე“  
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მოწამეთა  
საიდენტიფიკაციო კოდი. 60002004752

მხარეთა ხელმოწერა

ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

ინდ. მეწ. „თამარ კილაძე“

Digitally signed  
by Tamari  
kiladze  
Date:  
2019.10.21

19:26:51 +04'00'





სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების  
 ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებულ სკვერში მემორიალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქურის გამოყენებით 3,9X3,1X0,7	კმ/მ	8.50	0.00	15.00	127.50		0.00	127.50
2	მემორიალის რეკონსტრუქციის უქვისტაღის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქურის გამოყენებით (კოდალა)	კმ/მ	5.75	0.00	15.00	86.25	60.00	345.00	431.25
3	არსებულ რეზერვუარში ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ, 8300, 10X7,5	კმ/მ	6.00	120.00	40.00	240.00	40.00	240.00	1200.00
4	რეზერვუარში წყლის მიყვანა პლასტბასის მილებით 16აბ, დ-250მ	კმ/მ	350.00	1.40	0.50	175.00	0.20	70.00	735.00
5	მიწის კაპრა ხელით და უკუაყრით 350X0,5X0,3	კმ/მ	350.00	0.00	2.00	700.00		0.00	700.00
6	რეზერვუარის წყლის პლასტბასის მილის მოწყობა დ-50	კმ/მ	45.00	2.00	1.00	45.00	0.10	4.50	139.50
7	დამბავი მილის მოსაწყობად მიწის გაკრა ხელით და უკუაყრით 45X0,5X0,3	კმ/მ	45.00		2.00	90.00		0.00	90.00
8	რეზერვუარის გახერცა მილის მოსაწყობად	ც	2.00		10.00	20.00		0.00	20.00
9	წყლის დამცული ვინტილის მოწყობა დ-50	ც	2.00	60.00	20.00	40.00		0.00	160.00
10	რეზერვუარის გარე კედლის დაზიანებული ნაწილის ადგილის მოწყობა არსებული ფილებით	კვ/მ	5.00	5.00	20.00	100.00		0.00	125.00
11	რეზერვუარის თავზე გრანიტის ფილების მოწყობა სისქით 5სმ 36X0,5	კვ/მ	18.00	70.00	30.00	540.00	5.00	90.00	1890.00
12	რეზერვუარში შადრევნის მოწყობა 2X0.8	ც	2.00	700.00	100.00	200.00	50.00	100.00	1700.00
13	რეზერვუარში წყლის ტუმბოს მოწყობა 1,5 კვტ	ც	2.00	150.00	30.00	60.00		0.00	360.00
14	სკვერის ძვლსკამების მოწყობა	ც	4.00	280.00	5.00	20.00	15.00	60.00	1200.00
15	სკვერის დაზიანებული სკანკალების აღდგენა	კომპ	2.00	300.00	50.00	100.00	30.00	60.00	760.00
16	სკვერში არსებული ბავშვთა სათამაშოების და ღობის შეღებვა მაღალბარისხივანი საღებავით	კვ/მ	48.00	8.00	3.00	144.00	30.00	0.00	528.00
17	მემორიალის მოსაწყობად არსებული წარწერიანი ფილების მოწყობა	ც	6.00	36.00	10.00	60.00		0.00	96.00

№	სამუშაოს დასახელება	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
18	სავეჯილის მოწყობა ბეტონით 8200 2X0,8X0,6	კმ/მ	100.00	96.00	40.00	38.40	20.00	19.20	153.60
19	თაღოვანი კარკასის მოწყობა წარწერებისათვის ფიგურული მიღკვადრატით ბეტონში ჩამოვრებით 40X5088	გრძ/მ	10.00	120.00	10.00	120.00	2.00	24.00	264.00
20	ლითონის თაღი წარწერების მოწყობა	კომპ	200.00	200.00	200.00	200.00		0.00	400.00
21	არსებული ორი ელემენტო ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი, დაბეტონებით და ტექნიკის გამოყენებით	ც	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	300.00
22	ახალი ღამბიონების მონტაჟი	ც	65.00	260.00	10.00	40.00		0.00	300.00
23	ვლ. კაბეჯლის მონტაჟი	მ	2.00	240.00	0.50	60.00		0.00	300.00
24	ელ. ბოძების შედგენა 2-ჯერ (ამუ-კალათის გამოყენებით)	ც	6.00	60.00	10.00	100.00	15.00	150.00	310.00
25	ქვის გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან და გატანა ავტომანქანით	ღარი		0.00		150.00		0.00	150.00
									12439.85
									995.19
									13435.04
									806.10
									14241.14
									427.23
									14668.37

Handwritten signature or mark.

სოფელ ორპირში კულტურის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოების

შესრულებული სამუშაოს კორექტირებული აქტი ფორმა №2

N	სამუშაოს დასახელება	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტ		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებულ სკვერში მემორიალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით 3,9X3,1X0,7	კვ/მ	8.50	0.00	15.00	127.50	0.00	0.00	127.50
2	მემორიალის რეკონსტრუქციის კედისტალის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქუჩის გამოყენებით (კოდალა)	კვ/მ	5.75	0.00	15.00	86.25	60.00	345.00	431.25
3	არსებულ რეზერვუარში ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 8სმ, 8300, 10X7,5	კვ/მ	6.00	120.00	40.00	240.00	40.00	240.00	1200.00
4	რეზერვუარში წყლის მიყვანა პლასტმასის მილებით 16სმ, დ=2500	გომ/მ	350.00	1.40	0.50	175.00	0.20	70.00	735.00
5	მიწის კაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 350X0,5X0,3	გომ/მ	350.00	0.00	2.00	700.00		0.00	700.00
6	რეზერვუარის წყლის პლასტმასის მილის მოწყობა დ=50	გომ/მ	45.00	2.00	1.00	45.00	0.10	4.50	139.50
7	დამცვეი მილის მოსაწყობად მიწის გაჭრა ხელით და უკუჩაყრით 45X0,5X0,3	გომ/მ	45.00	0.00	2.00	90.00		0.00	90.00
8	რეზერვუარის გახრევა მილის მოსაწყობად	ც	2.00	0.00	10.00	20.00		0.00	20.00
9	წყლის დამცველი ვინტილის მოწყობა დ=50	ც	2.00	60.00	20.00	40.00		0.00	160.00
10	რეზერვუარის გარე კედლის დაზიანებული ნაწილის ადგილის მოწყობა არსებული ფილებით	კვ/მ	5.00	5.00	20.00	100.00		0.00	125.00
11	რეზერვუარის თავზე გრანიტის ფილების მოწყობა სისქით 5სმ 36X0,5	კვ/მ	15.70	70.00	30.00	471.00	5.00	78.50	1648.50
12	რეზერვუარში შადრევნის მოწყობა 2X0,8	ც	2.00	700.00	100.00	200.00	50.00	100.00	1700.00
13	რეზერვუარში წყლის ტუმბოს მოწყობა 1,5 კვტ	ც	2.00	150.00	30.00	60.00		0.00	360.00
14	სკვერის ძელსკამების მოწყობა	ც	4.00	280.00	5.00	20.00	15.00	60.00	1200.00
15	სკვერის დაზიანებული სკანქლების აღდგენა	კომპ	2.00	300.00	50.00	100.00	30.00	60.00	760.00
16	სკვერში არსებული ბავშვთა სათამაშოების და ღობის შეღებვა მაღალბარიისფერანი საღებავით	კვ/მ	48.00	8.00	3.00	144.00		0.00	528.00
17	მემორიალის მოსაწყობად არსებული წარწერიანი ფილების მოწყობა	ც	6.00	6.00	10.00	60.00		0.00	96.00

№	სამომავლის დასახელება	რაოდ.	მასლა		ხელოვანი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
18	საეკვილიოს მოწყობა ბეტონით 8200 2X0,8X0,6	0.50	100.00	50.00	40.00	20.00	20.00	10.00	80.00
19	თაღოვანი კარკასის მოწყობა წარწერებისათვის ფიგურული შიდაკედრატით ბეტონში ნამზადებით 40X5038	12.00	10.00	120.00	10.00	120.00	2.00	24.00	264.00
20	ლითონის თაღში წარწერების მოწყობა	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00		0.00	400.00
21	არსებული ორი კლექტრო ბოძის დემონტაჟი და მონტაჟი, დაბეტონებით და ტარხილის დამონტაჟებით	2.00	60.00	120.00	30.00	60.00	60.00	120.00	300.00
22	ახალი დამბიონების მონტაჟი	4.00	65.00	260.00	10.00	40.00		0.00	300.00
23	ელ. კაბელების მონტაჟი	116.00	2.00	232.00	0.50	58.00		0.00	290.00
24	ელ. ბოძების შედგენა 2-ჯერ (ამუკალიათის გამოყენებით)	10.00	6.00	60.00	10.00	100.00	15.00	150.00	310.00
25	ქვის გასუფთავება სამშენებლო ნაგავისაგან და გატანა ავტომანქნით			0.00		150.00		0.00	150.00
									12114.75
									969.18
									13083.93
									785.04
									13868.97

-43,6

-10

-799,4

შ.პ.ს. „რეალექსპერტის“ ინსპექტორი: დავით ცორაძე

ფარული სამუშაოს აქტი № 2 .

საგ. იხსნის ხეხეხის სხვაობა შედგება მსხვილი ხეხეხი  
საგ. შედგება ხეხეხი

(სამუშაოს დასახელება)

ქალაქი ----- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8 თეთრი ----- 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

ტექ. ზედამხედველის წარმომადგენელი გიორგი შიშინაძე

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

სამუშაოთა მწარმოებელი ა/შ რძიხ ჯეი

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე -----

1. მსხვილი ხეხეხის შედგენილი იყოს მისთვის 10/12-ზე 2300  
10x7,5  
- 6,23.  
(ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება)

2. ხეხეხის ხეხი შედგენილი იყოს მისთვის 16 აპრ. 2572 750ს/ა.

3. ხეხეხის ხეხი შედგენილი იყოს მისთვის 9-50 450ს/ა.  
(შესრულებული სამუშაოების დასახელება)

4. საუჯიყოს მისთვის მონიშნულია ზედა 0,573.

5. მსხვილი იხი ხეხეხი შედგენილი იყოს მისთვის 9-50 450ს/ა.  
(შესაბამება მუშა პროექტებს ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)

6. ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი შედგენილი იყოს მისთვის 9-50 450ს/ა.

3. შეხვედრის სანაწიში შედგენილი იყოს მისთვის.  
(გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი)

შეხვედრის სანაწიში შედგენილი იყოს მისთვის.  
(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)

აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი: -----

სამუშაოთა მწარმოებელი: ა. ჯეი

ტექ. ზედამხედველი: გიორგი შიშინაძე

ფარული სამუშაოს აქტი № 1.

საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ  
საქმის ხელშეწყობის სტრატეგია

(სამუშაოს დასახელება)

ქალაქი ----- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 9 თებერვალი ----- 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

ტექ. ზედამხედველის წარმომადგენელი მუთაზინ ზოსტაია -----

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

სამუშაოთა მწარმოებელი ა/შ ააი აკოტი -----

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე -----

1. საქმის სტრატეგია საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ 1-მეტრი ბიჭხელ ქაღალდი
2. გეოდეზიის ხეობა (გეოდეზიის სამსახურის დათვალიერება) 3,8 x 3,1 x 0,7 = 8,5 მ<sup>3</sup>.  
საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ 2-მეტრი ბიჭხელ ქაღალდი  
(ხუფეჩი) 5,75 მ<sup>3</sup>.
3. ქვიშის კაპი ხეობა და უფეჩი ხეობა 350 x 0,5 x 0,3 = 350 მ<sup>3</sup>.  
(შესრულებული სამუშაოების დასახელება)
4. ქვიშის კაპი ხეობა და უფეჩი ხეობა 45 x 0,5 x 0,3 = 45 მ<sup>3</sup>.  
საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ
5. საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ ს. მ.  
(შეესაბამება მუშა პროექტებს ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)
6. საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ ს. მ.

3. -----

(გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი)

საგ. მხ. მხ. ხუფეჩის სხვადასხვა მუშაოების შესახებ ს. მ.

(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)



აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი: -----

სამუშაოთა მწარმოებელი: ა. აკოტი -----

ტექ. ზედამხედველი: მ. მ. -----

1

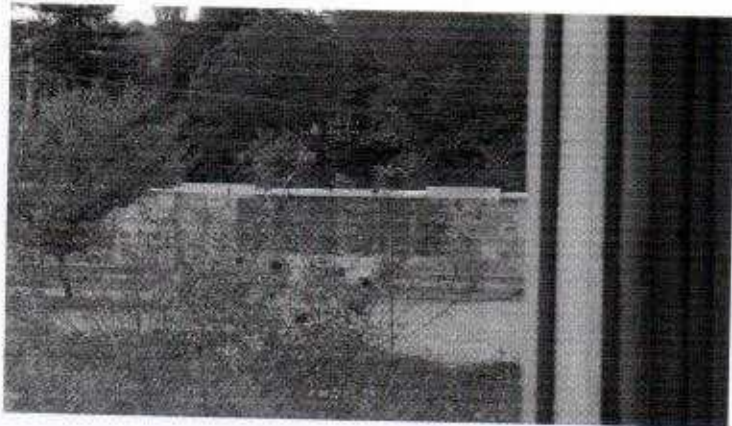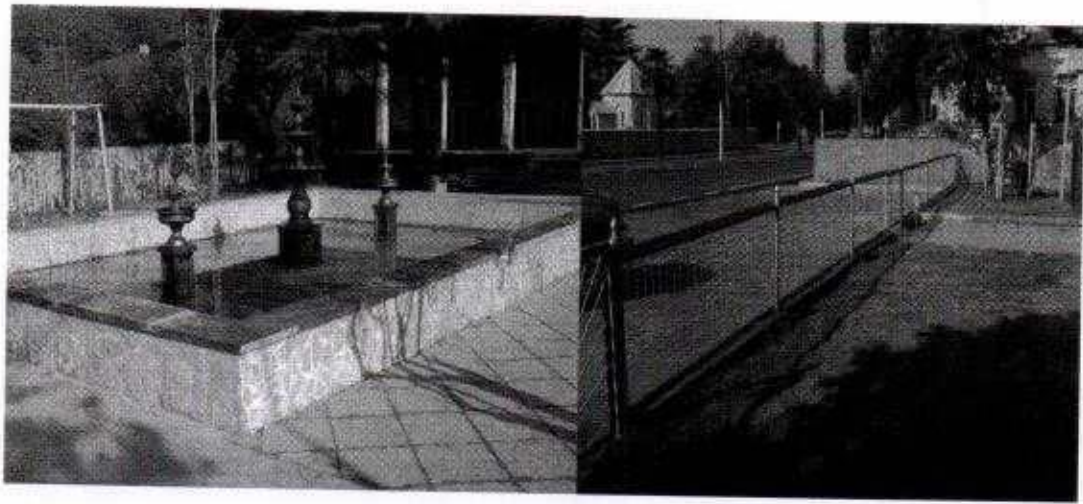

10 h.





