


შპს „რეალექსპერტი“
მის. თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ. ფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"
ATONELI str. 23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com



სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში




ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.996.19

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

ინსპექტირების ობიექტი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შატილში პანსიონატის სასადილოს მშენებლობის სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.996.19

დამკვეთი: შპს „პარვუს კონსტრაქშენი“, ს/კ 402143961.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მამუკა ჩინჩალაძე.

ტექნიკური მენეჯერი: ბესიკ გიგინეიშვილი.

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის, ფორმა №2-ის ინსპექტირება.

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №514, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოს აქტი - ფორმა №2, ხელშეკრულება ქვემოიჯარესთან, მისი ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა №2 და მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადებები.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შატილში პანსიონატის სასაბუღალტრო მშენებლობის სამუშაოებზე შპს „პარვუს კონსტრაქშენი“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ჯამში შეადგენს **252295,09** (ორასორმოცდათორმეტი ათას ორასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 09 თეთრი) ლარს დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, საიდანაც ფარული სამუშაოების ღირებულების ჩათვლის საკითხი არის სამუშაოთა შემსყიდველის პრეროგატივა.

დანართი: ფორმა №2, 28 (ოცდარვა) ფურცელი; ფოტოილუსტრაცია, 1 (ერთი) ფურცელი.

გამოკვლევა

განაცხადის თანახმად დასადგენია დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შატილში პანსიონატის სასაბუღალტრო მშენებლობის სამუშაოებზე შპს „პარვუს კონსტრაქშენი“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა №2-ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილი იქნა ფორმა №2 ჯამური ღირებულებით 252295,09 (ორასორმოცდათორმეტი ათას ორასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და 09 თეთრი) ლარი დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით. წარმოდგენილი იქნა ასევე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №514, ხარჯთაღრიცხვა ჯამური თანხით 269729,96 (ორასამოცდაცხრა ათას შვიდას ოცდაცხრა ლარი და 96 თეთრი) ლარი დღგ-სა და ნორმატიული დანარიცხების ჩათვლით, ხელშეკრულება ქვემოიჯარესთან, მისი ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა №2 და მიღება-ჩაბარების აქტი.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი, სადაც დამკვეთის თანდასწრებით განვახორციელე შესრულებული ხილული სამუშაოს აზომვები. ჩატარებული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა №2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ ფორმა №2-ში მითითებული ხის კარის ბლოკების ნაცვლად მოწყობილია ყავისფერი ლითონპლასტიკის კარის ბლოკები, აგრეთვე ცოკოლის კედლები ფიკალის დეკორატიული ფილის ნაცვლად მოპირკეთებულია კერამოგრანიტის ფილებით. აღნიშნული სამუშაოების ჩათვლის საკითხი არის სამუშაოების შემსყიდველის პრეროგატივა. ხოლო იმ სამუშაოებზე, რომლებიც მიეკუთვნება ფარული სამუშაოთა კატეგორიას და მათზე დამკვეთმა (სამშენებლო კომპანიამ) არ/ვერ წარმოადგინა ფარული სამუშაოთა აქტები, ინსპექტირებამ ვერ იმსჯელა და მათი ჩათვლის საკითხი არის სამუშაოთა შემსყიდველის პრეროგატივა. ასეთი სამუშაოებია: ფორმა №2-ის თავი - კონსტრუქციული ნაწილი: 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, და მე-7 პუნქტები; თავი - არქიტექტურა: მე-2, მე-3,



ფორმა #2

დუმეთის მინიციპალიტეტი სოფელ შატილში პანსიონატის სასადილოს შენობის მშენებლობა

კონსტრუქციული ნაწილი

ნომერი	ნორმატივის ნომერი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობის დახასიათება	განხ. ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელოვასი		მექანიზმები და		ჯამი
				ნორმ. ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		მიწის დამუშავება ექსკავატორით სამირკვლის მოსაწყობად	მ3		45,00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,0132	0,59			6,00	3,56			
		ექსკავატორი მუხლოვხა სვლაზე ჩამჩით 0.65 მ3	მანქ/სთ	0,0295	1,33						49,09	65,17
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,09						3,20	0,30
2	1-78-3	მიწის დამატებითი დამუშავება ხელით	მ3		4,50							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,780	12,510			6,00	75,06			75,06
3	15-5	მიწის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ		74,25					3,44	255,42	255,42
4	8-3-2	ბალასტის საფუბელის მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ	მ3		4,800							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,890	4,272			6,00	25,63			25,63
		მანქანები	ლარი	0,370	1,776						3,20	5,68
		ბალასტი	მ3	1,150	5,520	12,00	66,24					66,24
		სხვა მასალა	ლარი	0,020	0,096	3,20	0,31					0,31
6-1-22		მონოლითური რკინა-ბეტონის სამირკვლის და ზემირკვლის კედლის კონსტრუქციის მოწყობა B-25	მ3		42,92							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3,78	162,24			6,00	973,43			973,43
		მანქანები	ლარი	0,92	39,49					3,20	126,36	126,36

(Handwritten signature)

12	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,1948	7,99				7,80	62,34			62,34	
	მანქანები	ლარი	0,0141	0,58						3,20	1,85	1,85	
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,0406	1,67									
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის დამზადება	კაც/სთ	1,17	1,95				6,00	11,69			11,69	
	ბეტონის შემრევი	მან/სთ	0,321	0,53						8,10	4,33	4,33	
	მანქანები	ლარი	0,63	1,05						3,20	3,36	3,36	
	ქვიშა	მ3	1,21	2,01563978	28,00	56,44						56,44	
	ცემენტი მ-400	ტ	0,304	0,50640867	183,00	92,67						92,67	
	წყალი	მ3	0,31	0,51640358	4,50	2,32						2,32	
	სხვა მასალა	ლარი	0,0636	2,61	3,20	8,35						8,35	
11-30-6	კერამოგრანიტის ფილების დაგება (ფერი შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან	მ2		28,50									
13	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,8	79,80				7,80	622,44			622,44	
	მანქანები	ლარი	0,035	1,00						3,20	3,19	3,19	
	კერამოგრანიტის ფილა	მ2	1	28,50	22,00	627,00						627,00	
	წყობ-ცემენტი	კმ	6	171,00	0,60	102,60						102,60	
	სხვა მასალა	ლარი	0,043	1,23	3,20	3,92						3,92	
	11-9-3; 11-27-2	ხის იატაკის საფარის მოწყობა ლაგებით	მ2		102,98								
14	შრომითი რესურსი	მ2	0,851	87,64				12,50	1 095,45			1 095,45	
	მანქანები	ლარი	0,0301	3,10						3,20	9,92	9,92	
	ლურსმანი	კმ	0,233	23,99	3,50	83,98						83,98	
	იატაკის ხის ფიცი დაბეჭევა, შიპით	მ3	1,05	108,13	28,00	3 027,61						3 027,61	
	ხის ლაგები შშრალი მასალისაგან	მ3	0,0144	1,4829	744,00	1 103,29						1 103,29	
	პლენტუსი ხის	გ.მ	1,07	110,19	5,60	617,06						617,06	
	ლურსმანი	კმ	0,0533	5,49	3,50	19,21						19,21	
	სხვა მასალა	ლარი	0,107	11,02	3,20	35,26						35,26	
	10-38-3,	იატაკის ხის ელემენტების დაფარვა ანტისტატიკური ხსნარით	მ2		102,98								
	15	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,0424	4,37				7,80	34,06			34,06
მანქანები		ლარი	0,0021	0,22						3,20	0,69	0,69	
ანტისტატიკური ხსნარი		კმ	1,5	154,47	6,00	926,82						926,82	

სხვა მასალა	ლარი	0,220	1,254	3,20	4,01				4,01
27-19-2	100 გ.მ		0,000						4,01
ბეტონის ბორდიულის ქვების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ზომით 15*30 სმ									
	კაც/სთ	74	0,00			6,00	0,00		0,00
	ლარი	0,71	0,000					3,20	0,00
4.1 კ.176	გ.მ	100	0,00	11,14	0,00				0,00
4.1 კ.344	მ3	0,2	0,0000						
6-38-11	კაც/სთ	1,97	0,00			6,00	0,00		0,00
ბეტონის ხსნარის დამზადება	მან/სთ	0,321	0,00					8,10	0,00
	ლარი	0,63	0,00					3,20	0,00
	მ3	0,8	0	16,00	0,00				0,00
	მ3	0,5	0	28,00	0,00				0,00
	ტ	0,332	0	183,00	0,00				0,00
	მ3	0,215	0	4,50	0,00				0,00
4.1 კ.373	მ3	0,06	0,00						
კვიზა-ცემენტის ხსნარი									
6-40-17	კაც/სთ	1,17	0,00			6,00	0,00		0,00
ბეტონის ხსნარის დამზადება	მან/სთ	0,321	0,00					8,10	0,00
	ლარი	0,63	0,00					3,20	0,00
	მ3	1,21	0	28,00	0,00				0,00
	ტ	0,319	0	146,00	0,00				0,00
	მ3	0,31	0	4,50	0,00				0,00
	ლარი	9,6	0,000	3,20	0,00				0,00
სხვა მასალები									
კბეები, მოაჯირეები									
6-1-22	მ3		0						
მონოლითური ბეტონის კიბის საფუძვლების მოწყობა B-25									
	კაც/სთ	3,78	0,00			6,00	0,00		0,00
	ლარი	0,92	0,00					3,20	0,00
	მ3	1,015	0,0						
6-38-11	კაც/სთ	1,97	0,00			6,00	0,00		0,00
ბეტონის ხსნარის დამზადება	მან/სთ	0,278	0,00					8,10	0,00
	ლარი	0,69	0,00					3,20	0,00
	მან/სთ								

		პოლიფორფილენის მუხლი დ25	ც							1,20										1,20	
		პოლიფორფილენის მუხლი დ32	ც							2,48										2,48	
		პოლიფორფილენის მუხლი დ40	ც							3,84										3,84	
		გადამყვანი 25*20	ც							3,00										3,00	
		გადამყვანი 32*25	ც							2,32										2,32	
		გადამყვანი 40*32	ც							1,62										1,62	
		ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ32	ც							20,00										20,00	
		ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ25	ც							16,20										16,20	
		ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ20	ც							24,80										24,80	
		ჩიბუხი დ20	ც							10,00										10,00	
		სხვა მასალა	ლარი		0,0457					21,64										21,64	
2	СНП IV 2-82 16-22	მიღების გარეგნული და ჰიდრაგლიკური შემოცმება	გრძ.მ						148												
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ		0,0516				7,64			4,60		35,13							35,13
		მანქანები	ლარი		0,01				1,48												4,74
		წყალი	მ3		0,01				1,48												5,33
		სხვა მასალა	ლარი		0,0011				0,16												0,52
3	СНП IV 2-82 18-8-1	ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო UPB25-80	გრძ.მ						1												
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ		13,3				13,30			6,00		79,80							79,80
		მანქანები	ლარი		0,39				0,39												1,25
		ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო UPB25-80	გრძ.მ						1												1 800,00
		სხვა მასალა	ლარი		1,58				1,58												5,06
4	СНП IV 2-82 16-12-1	ვენტილების და ონკანების მონტაჟი	ც						34,00												
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ		1,51				51,34			6,00		308,04							308,04
		მანქანები	ლარი		0,13				4,42												14,14
		ვენტილი დ20	ც						6												37,20
		ვენტილი დ25	ც						2												20,00
		ვენტილი დ32	ც						4												48,00

Handwritten signature in blue ink.

	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,583	62,96				4,60	289,63			289,63
	მანქანები	ლარი	0,0046	0,50						3,20	1,59	1,59
	გოფრირებული მილი დ150	გრძ.მ		108	13,10	1 414,80						1 414,80
	გადასაბმელი ქურო დ150	ც		18	8,20	147,60						147,60
	რბილი საფენი დ150	ც		36	5,00	180,00						180,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,156	16,85	3,20	53,91						53,91
17	СНП IV- 2-82 23- 12-2 კანალიზაციის ჭა დ1000 ჰ=0.50	მ3		0,471								
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	14,6	6,88			6,00	41,26				41,26
	მანქანები	ლარი	5,5	2,59					3,20	8,29		8,29
	ქის რგოლი დ1000 ჰ=0.50მ	ც		1	92,00	92,00						92,00
	ქის ძირი დ1000	ც		1	122,00	122,00						122,00
	ქის გადახურვის ფილა დ=1000 თუჯის ხუფით	ც		1	297,00	297,00						297,00
	სხვა მასალა	ლარი	6,77	3,19	3,20	10,20						10,20
18	СНП IV- 2-82 16- 22 მილებს გარეცხვა და ჰიდრაგლიკური შემოცმება	გრძ.მ		108								
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,0516	5,57			6,00	33,44				33,44
	მანქანები	ლარი	0,01	1,08					3,20	3,46		3,46
	წყალი	მ3	0,01	1,08	4,50	4,86						4,86
	სხვა მასალა	ლარი	0,0011	0,12	3,20	0,38						0,38
19	СНП IV- 2-82 23- 22-1 არსებულ ქსელთან შეერთება	ც		1								
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	16,8	16,80			6,00	100,80				100,80
	4.1.3.342 ბეტონი მ-100	მ3	0,05	0,05	92,00	4,60						4,60
	4.1.3.225 ქვიშა	მ3	0,2	0,2	28,00	5,60						5,60
	სხვა მასალა	ლარი	1,07	1,07	3,20	3,42						3,42
20	СНП IV- 2-82 1-78-3 მიწის გათხრა	მ3		38								

		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,780	105,640				6,00	633,84			633,84
21	СНП IV- 2-82 23-1-1	ქვიშის საფარის მოწყობა	მ3		27								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,8	48,60				6,00	291,60			291,60
		ქვიშა	მ3	1,1	29,7	28,00	831,60						831,60
22	СНП IV- 2-82 1-81-3	მიწის უკუზაყრა	მ3		11								
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,210	13,310				6,00	79,86			79,86
23	სრგ 14-5	ზედმეტი მიწის გატანა 5 კმ მანძილზე	ტ		40						3,44	137,60	137,60
24	СНП IV- 2-82 8-4-7	კანალიზაციის ქის იზოლაცია	მ2		1,88								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,336	0,63				7,80	4,93			4,93
		მანქანები	ლარი	0,015	0,03						3,20	0,09	0,09
		ბიტუმი	კგ	2,4	4,512	1,10	4,96						4,96
		სხვა მასალა	ლარი	0,0228	0,04	3,20	0,14						0,14
25	СНП IV- 2-82 18-11-1	ცხიმდამკერი 0.1 ლ/წმ	ც		0								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3,97	0,00				6,00	0,00			0,00
		მანქანები	ლარი	0,25	0,00						3,20	0,00	0,00
		წხიმდამკერი 0.1 ლ/წმ	ც		1	100,00	100,00						100,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,45	0,00	3,20	0,00						0,00
		გარე წყალმომარაგება											
26	СНП IV- 2-82 16-7-3	წყალმომარაგების მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით დ=50-20 მმ	გრ. მ.		14,00								
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0,37	5,18				4,60	23,83			23,83
		მანქანები	ლარი	0,0136	0,19						3,20	0,61	0,61
		ფოლადის მილი დ57*3.5	გრძ.მ		14	8,20	114,80						114,80

	პოლიპროპილენის მინაბოქოვანი მილი PN20 დ32	გრ.მ		52,00	4,10	213,20				213,20
	გადამყვანი 25*20	ც		4,00	0,30	1,20				1,20
	გადამყვანი 32*25	ც		4,00	0,58	2,32				2,32
	ქურო გარე ხრახნით დ20	ც		24,00	3,00	72,00				72,00
	მუხლი დ20	ც		50,00	0,19	9,50				9,50
	მუხლი დ25	ც		10,00	0,30	3,00				3,00
	მუხლი დ32	ც		10,00	0,62	6,20				6,20
	ქურო დ20	ც		12,00	0,17	2,04				2,04
	ქურო დ25	ც		15,00	0,21	3,15				3,15
	ქურო დ32	ც		4,00	0,50	2,00				2,00
	სამკაპი 20*20*20	ც		4,00	0,30	1,20				1,20
	სამკაპი 25*20*25	ც		14,00	0,50	7,00				7,00
	სამკაპი 32*32*32	ც		4,00	0,70	2,80				2,80
	შემოვლა დ20მმ	ც		12,00	0,40	4,80				4,80
	ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ20	ც		2,00	6,20	12,40				12,40
	ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ25	ც		2,00	8,10	16,20				16,20
	ამერიკანკა შიგა ხრახნით დ32	ც		4,00	10,00	40,00				40,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,0457	6,95	3,20	22,23				22,23
2	16-12-1 ვენტილუმის მონტაჟი	ც		28,00						
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1,51	42,28			6,00	253,68		253,68
	მანქანები	ლარი	0,13	3,64					3,20	11,65
	ბურთულიანი ვენტლი დ20	ც		4,00	62,00	248,00				248,00
	ბურთულიანი ვენტლი დ25	ც		4,00	12,00	48,00				48,00
	ბურთულიანი ვენტლი დ32	ც		4,00	16,00	64,00				64,00
	ბურთულიანი ვენტლი დ40	ც		4	17,50	70,00				70,00
	რადიატორის ვენტლი დ15	წვეილი		12,00	11,00	132,00				132,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,07	1,96	3,20	6,27				6,27
3	საბაზრო პანელური რადიატორი L=0.5მ H=0.6მ	ც		4,00	74,60	298,40	31,25	125,00		423,40
4	საბაზრო პანელური რადიატორი L=0.8მ H=0.6მ	ც		1,00	105,00	105,00	31,25	31,25		136,25
	საბაზრო პანელური რადიატორი L=1,0მ H=0.6მ	ც		11,00	126,40	1 390,40	32,25	354,75		1 745,15

(Handwritten signature)

	მათ შორის მოწყობილობა					6 601,70			532,20			7 133,90
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები		5%									696,05
	სულ											17 942,81
	ზედნადები ხარჯები მოწყობილობის მონტაჟზე		68%									361,90
	ზედნადები ხარჯები დანარჩენ სამუშაოებზე		10%									1 080,89
	სულ											19 385,60
	გეგმიური დაგროვება მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით		8%									1 022,71
	სულ											20 408,31


ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

	კედლის შ/მ ელ.ფარი 28ავტ ამომრთველზე პოლში U-2/28-F IP30	ც		1								
1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,020	6,02					6,00	36,12		36,12
	მანქანები	ლარი	0,060	0,06						3,20	0,19	0,19
	კედლის შ/მ ელ. ფარი 28 ავტ. ამომრთველზე . პოლში	ცალი		1,00	120,00							120,00
	სხვა მასალა	ლარი	2,000	2,00	3,20	6,40						6,40
8-525-2	ელ.ავტომატების მონტაჟი	ცალი		16,00								
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,000	32,00					6,00	192,00		192,00
	მანქანები	ლარი	0,060	0,96						3,20	3,07	3,07
	საერთო (შემყვანი) ავტ.ამომრთველი 3P-50A	ც		1	34,00	34,00						34,00
2	ავტ.ამომრთველი IP-5A	ც		3	7,00	21,00						21,00
	ავტ. ამომრთველი IP-10A	ც		3	7,00	21,00						21,00
	ავტ. ამომრთველი IP-25A	ც		8	7,00	56,00						56,00
	2P-25A დაცვის დიფ ამომრთველი	ც		1	7,00	7,00						7,00
	შემკერებელი შინა-63ა	ც		28	2,50	70,00						70,00
	სხვა მასალა	ლარი	1,780	28,48	3,20	91,14						91,14
8-400-1	კაბელების მონტაჟი	გ.მ		289,40								

(Handwritten signature)

3	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,410	118,65				4,60	545,81		545,81	
	მანქანები	ლარი	0,228	65,98						3,20	211,15	
	დენის შემყვანი კაბელი 4X10+1X6.0 მმ2	გ.მ		50	16,38	819,00					819,00	
	სადენი 3X1.5 მმ2	გ.მ		72,8	1,37	99,74					99,74	
	სადენი 3X2.5 მმ2	გ.მ		88,6	2,29	202,89					202,89	
	სადენი 3X4.0 მმ2	გ.მ		78	3,66	285,48					285,48	
	სხვა მასალა	ლარი	0,146	42,25	3,20	135,21					135,21	
8-398-1გამ	სხვადასხვა კვეთის საკაბელო არხის მოწყობა	გ.მ		185,00								
4	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,19	35,1500				4,60	161,69		161,69	
	მანქანები	ლარი	0,706	34,0000						3,20	108,80	
	საკაბელო არხი 12*12	მ.	პროექტით	140,0000	0,38	53,20					53,20	
	საკაბელო არხი 25*16	მ.	პროექტით	45,0000	0,68	30,60					30,60	
	სხვა მასალები	ლარი	0,10	18,5000	3,20	59,20					59,20	
	8-418-1	გოფირებული მილი დ=25მმ	მ		104,40							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,1500	15,6600				4,60	72,04		72,04	
სხვა მანქანა	ლარი	0,0017	0,1775						3,20	0,57		
მასალა:												
გვ:116 3352	გოფირებული მილი ციხელოვანად	მ	1,0000	104,4000	0,68	70,99					70,99	
სხვა მასალა	ლარი	0,0115	1,2006	3,20	3,84						3,84	
6	8-591-7 ელ.როზეტების მონტაჟი	ცალი		9,00								
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,220	1,98				6,00	11,88		11,88	
	მანქანები	ლარი	0,0002	0,00						3,20	0,01	
	ორწვერა ო.რკოლუსა როზეტი, მესამე დამიწების კონტაქტით, 16ა-250ვ	ცალი		9,00	5,00	45,00					45,00	
	სხვა მასალა	ლარი	0,0828	0,75	3,20	2,38					2,38	
	8-591-2 ამომრთველების მონტაჟი	ცალი		12,00								
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,200	2,40				6,00	14,40		14,40	
მანქანები	ლარი	0,0005	0,01						3,20	0,02		

ფოტორეპორტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატის ადმინისტრაციულ ერთეულში,
სოფელ შატში პანსიონატის აშენებული სასაფლაო

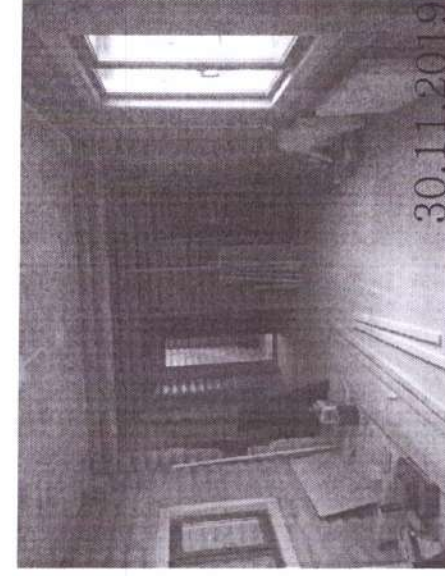

[Handwritten signature]

