

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს

სხდომის ოქმი №29

27 ივნისი 2019 წელი

ქ. ბათუმი

სხდომის თავმჯდომარე:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე, დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: რ.ბერიძე

ტექნიკური საბჭოს წევრები:

მ.სანიკიძე, ა.დუმბაძე, ნ.კილაძემ, ა.თედორაძე,
მ.ბოლქვაძემ

დღის წესრიგი

შპს „ზიმო-7“-სათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „წონიარისი-ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650
მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე გაუთვალისწინებული სამუშაოების
თანხების გამოყენებისა და შესაბამისად, მხოლოდ ამ სამუშაოების შესრულების ვადის განსაზღვრის
თაობაზე.

მომხსენებელი:

მ. სანიკიძე

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე წლის 28 იანვარს გაფორმებული #23
ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს „ზიმო-7“ აწარმოებს ქედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა
„წონიარისი-ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის
სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები ეთერ ბერიძის საცხოვრისთან
უხვი ნელექის დროს ჩამოიშალა გზის ფერდობი, რომლის მდგრადობის შესანარჩუნებლად საჭიროა
რკინა/ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა. (l=5,მ; H=6მ), რათა აღდგენილი იქნას გზის სავალი
ნაწილი და უსაფრთხო იყოს ტრანსპორტის გადაადგილება. ასევე მოქალაქე თამაზ ბერიძის
საცხოვრებელ სახლთან გზის სივიწროვის გამო პროექტით გათვალისწინებულ რკინა/ბეტონის
კიუვეტებზე გზის სივიწროვის გამო მოეწეოს ცხაური 42 გრძ/მ-ზე.

სამშენებლო ობიექტზე არსებულ მდგომარეობას ადასტურებს ქედის განყოფილების უფროსის
თემურ დევაძის მოხსენებითი ბარათები.

შპს „ზიმო-7“-ის 2019 წლის 26 ივნისის #01-10/203 წერილით ცნობილია, რომ მიმწოდებელი
მზადაა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ძირითადი სამუშაოები დაასრულოს გეგმა-გრაფიკით
განსაზღვრულ ვადაში (03.07.2019წ) და ითხოვს მხოლოდ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების
შესრულებისათვის გონივრულ ვადას.

შემხვედრი გარემოებების გათვალისწინებით დეპარტამენტის ტექნიკურ საბჭოს მიზანშეწონილად მიაჩნია გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხებიდან 19927,95 ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) გამოყენებით შესრულდეს დამატებითი რკინა/რეტონის (l=5,მ; H=6მ) კედლისა და პროექტით გათვალისწინებულ რკინა/რეტონის კიუვეტებზე ცხაურის მოწყობის სამუშაოები, რომელთა შესრულებაც საჭიროებს გარკვეულ პერიოდს. გამომდინარე აქედან, შპს „ზიმო-7“-ს მხოლოდ გაუთვალისწინებელი (დამატებითი) სამუშაოების შესრულებისათვის მიეცეს ვადა 2019 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, ხოლო ძირითადი სამუშაოების შესრულების ვადა კი დარჩეს უცვლელი, ანუ 2019 წლის 03 ივლისი.

აზრი გამოთქვას:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:
რ. ბერიძე

წევრებმა: მ. ბოლქვაძემ,
ა. თედორაძე, ა. დუმბაძემ

ტექნიკური საბჭოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს გამოთქმულ მოსაზრებას, დამატებითი სამუშაოების ჩატარებას გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების გამოყენებით 2019 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, ძირითადი სამუშაოების დასრულებიდან 12 კალენდარულ დღეში.

დაადგინეს: 1. რეკომენდაცია მიეცეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, წერილობით აცნობოს შპს „ზიმო-7“-ს მიმდინარე წელს გაფორმებული #23 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, მხოლოდ დამატებითი შესასრულებელი სამუშაოებისათვის 2019 წლის 15 ივლისის ჩათვლით ვადის მიცემის და ძირითადი სამუშაოების შესრულების ვადის უცვლელად (03.07.2019წ) დატოვების თაობაზე.

ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილება ეცნობოს შესყიდვების სამსახურს შესაბამისი პროცედურების გასატარებლად.

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:

 /რ. ბერიძე/

წევრები:

 /მ. სანიკიძე/

ა. კილაძე /ა. კილაძე/

 /ა. თედორაძე/




/ა. დუმბაძე/



/მ. ბოლუქვაძე/

ტექნიკური საბჭოს მდივანი:



/ი. ბერიძე/

Am 10. 11. 1912. 10. 11. 1912. 10. 11. 1912. 10. 11. 1912.

826 06 09 280

8. 25. 02. 9. 33/13. 34/13.

14.06.20175.



საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რაულ ბერიძეს

ამავე დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის
ქედის განყოფილების უფროსის თემურ დევაძის

მოხსენებითი ბარათი


მოგახსენებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტში „წონიარისი-ვარჯანისის“ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობს ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, სამუშაოებს ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს „ზიმო 7“ (ხელშეკრულებით №23). სამუშაოების მიმდინარეობისას, მოსულმა უხვმა ნალექმა მოქალაქე ეთერ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან გამოიწვია მიწის მასის ჩამოშლა, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა როგორც საცხოვრებელ სახლს, ასევე საავტომობილო გზას.

გთხოვთ მიმართოთ მშენებელ კომპანიას პროექტით გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან უზრუნველყოს საყრდენი კედლის მშენებლობა.
დანართი ფოტომასალა.

პატივისცემით,

თემურ დევაძე

განყოფილების უფროსი



წმენდარისი - ვარჯანისი
კმ 0+000 - კმ 1+650





აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
შინაგანგებობისა და ეკონომიკის სამინისტროს
საგეგმარო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1527
21/06/2019

1527-07-2-201906211305



შპს „ზიმო-7“-ის დირექტორს
ქალბატონ მარინე მანგალაძეს

ქალბატონო მარინე,

ჩვენს შორის 2019 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული #23 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარეობს ქედის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის „წონიარისი-ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650 მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.

სოფელ ვარჯანისში მცხოვრები მოქალაქე ეთერ ბერიძის მოთხოვნის (განცხ. #1099. 14.06.2019წ) გათვალისწინებით დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის სპეციალისტების მიერ ადგილზე გასვლით დათვალიერებული და შესწავლილი იქნა საავტომობილო გზის ის მონაკვეთი, სადაც მუშა პროცესში, უხვი ნალექის დროს საცხოვრისთან ჩამოიშალა გზის ფერდობი და მისი მდგრადობის შესანარჩუნებლად საჭიროა მოეწყოს რკინა/ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლი.

გამომდინარე აქედან, გთხოვთ განიხილოთ აღნიშნული საკითხი და თანხმობის შემთხვევაში წარმოგვიდგინოთ პკ5+96-პკ6+01 მონაკვეთზე რკინა/ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის (l=5მ, H=6მ) მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა, შესაბამისი სამუშაოთა მოცულობების უწყისითა და ნახაზით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების გამოყენებით.

დანართი: 01 ფურცელი.

პატივისცემით,

რაულ ბერიძე

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი





შპს "ზიმო-7"

LTD "ZIMO-7"

ქ. ბათუმი

25.06.2019 წ.

№ 01-10/201

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეყნებო დაწესებულება - სააგრომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რ. ბერიძეს

ბატონო რაულ,

2019 წლის 21 ივნისის №1527 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ თანახმა ვართ
2019 წლის 28 იანვარს დეპარტამენტთან გაფორმებული №23 ხელშეკრულების
შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "წონიარისი - ვარჯანისი"
კმ0+000+კმ1+650 მონაკვეთზე გაუთვალისწინებული სამუშაოების თანხის ნაწილით
დამატებით შევასრულოთ პკ5+96-პკ6+01 მონაკვეთზე რკინა/ბეტონის ქვედა საყრდენი
კედლის (L=5მ, H=6მ) მოწყობის სამუშაოები. ასევე გზის შევიწროვებულ მონაკვეთზე
პკ5+40-პკ5+82 მონაკვეთში რკინაბეტონის კოშკები საჭიროებს ღიბის ცხადებით
გადახურვას სიგრძით 42 გ.მ.

დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა 16888,09
ლარი დღგ-ს გარეშე გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულებიდან ეკონომია რჩება
20720,34-16888,09=3832,25 ლარი დღგ-ს გარეშე, ხოლო დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 4522,05
ლარს.

წარმოგიდგენთ შესაბამის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას.

პატივისცემით,

შპს „ზიმო-7“-ის დირექტორი



მარიხე მანგალაძე



ZIMO-7 LTD

Подписано цифровой
подписью: ZIMO-7 LTD
Дата: 2019.06.25 17:11:59 +04'00'

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რაულ ბერიძეს

ამავე დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის
ქედის განყოფილების უფროსის თემურ დევაძის

მოგახსენებთ ბატონო


მოგახსენებთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტში „წონიარისი-ვარჯანისის“ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობს ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, სამუშაოებს ახორციელებს ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს „ზიმო 7“ (ხელშეკრულებით №23). თამაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან გზის სივიწროვის გამო საჭიროა 42 გრძ./მეტრზე განხორციელდეს რკ/ბეტონის არხის ცხაურით დახურვა.

გთხოვთ თქვენს შემდგომ რეაგირებას.

პატივისცემით,

თემურ დევაძე

განყოფილების უფროსი





აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
შინაგანგებობისა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქმეთაღმწერო დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N 1565
26/06/2019

1565-07-2-201906261050



შპს „გზაპროექტის“ დირექტორს
ბატონ პაატა მიქელაძეს

ბატონო პაატა,

გაცნობებთ, რომ დეპარტამენტსა და შპს „ზიმო-7“-ს შორის 2019 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული #23 ხელშეკრულებით შპს „ზიმო-7“ აწარმოებს ქედის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „წონიარის-ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650 მონაკვეთზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებს.


გეგმავნებათ, ზემოაღნიშნულ ობიექტზე გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების გამოყენებით დამატებით მოსაწყობი რკინა/ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის და პროექტით გათვალისწინებულ არხებზე ცხურის დახურვის სამუშაოების მოცულობათა უწყისები და ნახაზები შესათანხმებლად.

დანართი: 06 ფურცელი

პატივისცემით,

რაულ ბერიძე

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი



მის: ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ №14

ტელ: 591 22-07-91

№16

26 ივნისი 2019 წელი

აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება სააგტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რ. ბერიძეს

ბატონო რაულ,

თქვენს 2019 წლის 26 ივნისის №1565 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ
შპს „გზაპროექტი“ თანახმაა განხორციელდეს ცვლილება ქედის
მუნიციპალიტეტში სააგტომობილო გზა „წონიარისი-ვარჯანისი“-ს კმ0+000-კმ1+650
ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებზე წარმოდგენილი
კორექტირებული უწყისების და ნახაზების მიხედვით.

პატივისცემით,
გზაპროექტის დირექტორი:

პ. მიქელაძე



ბაუთშალის წინგებელი სამუშაოები

საავტომობილო გზა „წონიარისი - ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650

ავტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2*

ანაკრები რკბეტონის კოუმეტების მოწყობა კვეთით 0.4X0.4მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
8	ღია არხზე ლითონის ცხურების მოწყობა (კეთხოვანა 80X80X8მმ, შველური №6.5, არმატურა Φ -22მმ ა-III)	ტნ	1,860	2100,00	3906,00
ჯამი ლოკალ. №2					3906,00

საავტომობილო გზა „წონიარისი - ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650

ავტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4*

ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ ³ დატვირთვით ავტოთვიომცველებზე	1000 მ ³	0,040	1500,00	60,00
2	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	4,00	10,00	40,00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სანგრევი ჩაქუნებით დატვირთვით ავტოთვიომცველებზე	მ ³	6,00	30,00	180,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 2 კმ-მდე	ტ	87,50	2,00	175,00
5	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	მ ³	1,00	22,00	22,00
6	არმატურის კარკასის მოწყობა ცალკეული ღეროებისაგან	100 ტნ	0,0194	21000,00	4074,00
7	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	მ ³	4,50	210,00	945,00
8	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან	მ ³	21,00	210,00	4410,00
9	პლასმასის სადრენაჟო მილი $d=100$ მმ	გრძ/მ	2,00	5,00	10,00
10	ორფენიანი პიდროსოლაცია ბიტუმი	მ ²	30,00	6,00	180,00
11	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	50,00	15,00	750,00
ჯამი ლოკალ. №4					10846,00
ჯამი ლოკალ. №2*+№4*					14752,00
ზედნადები ხარჯები 8%					1180,16
ჯამი					15932,16
გუმბიური დაგროვება 6%					955,93
ჯამი:					16888,09
ღღვ 18%					3039,86
სულ ჯამი					19927,95

შპს „ზიმო-7“-ის დირექტორი: შ. მ. [ფაილი]



ZIMO-7 LTD

Подписано цифровой
подписью: ZIMO-7 LTD
Дата: 2019.06.25 17:11:25
+04'00'

ლითონის ცხურების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი №3*
(გაუმყალისწინებელი სამუშაოები)

საავტომობილო გზა „წონიარისი - ვარჯანისი“ კმ0+000-კმ1+650

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	დღგომდებარეობა	
			კმ5+40-კმ5+82 L=428	
			მ	კმ
1	2	3	4	
1	კუთხოვანა 80X80X88მ 1 გრძ.მ - 9,65კმ	მ/კმ	84,0	810,6
2	შველერი №6.5 1 გრძ.მ - 5,9კმ	მ/კმ	71,8	423,7
3	არმატურა 22 ა-III 1 გრძ.მ 2,98კმ	მ/კმ	210,0	625,8

შპს „ზიმო-7“-ის დირექტორი: მ. პ. მანგალაძე



გაბრიელის საყრდენი და კორტაშვილი კედლები შოთაშვილი საგუბრონი გოცულაშვილი შაველი N5*


საქართველოს ელ. ენერგეტიკის ეროვნული კომპანია

პროექტის სამუშაოები საფრთხე პერიოდში

მონტაჟი	მასალა (მმ)	ფარგის სიღრმე (მმ)	სიგრძე (მმ)	რაოდენობა (მონტაჟი)	საერთო სიგრძე (მ)
1	3	4	5	6	7
1	180	20 A-B	L=2500.0	26	65.0
2	180	20 A-B	L=2500.0	26	65.0
3	180	16 A-B	L=2500.0	16	40.0
4	180	12 A-B	L=2500.0	26	65.0
5	180	20 A-B	L=1750.0	26	45.50
6	180	16 A-B	L=1950.0	44	86.20
7	180	16 A-B	L=1950.0	42	81.90
8	180	20 A-B	L=1715.0	26	44.60
9	180	12 A-B	L=1670.0	26	43.42
10	საერთო სიგრძე	5 A-B	L=1400.0	99	138.60

საერთო სიგრძე (მმ)			
L=138.60			
8	12	16	20
54.75	209.90	813.40	864.75

პროექტის სამუშაოები საფრთხე პერიოდში
 მასალა: 180 მმ
 საერთო სიგრძე: 5.0 მ
 -საერთო სიგრძე: V=4.50 მ
 -დან: V=21.0 მ

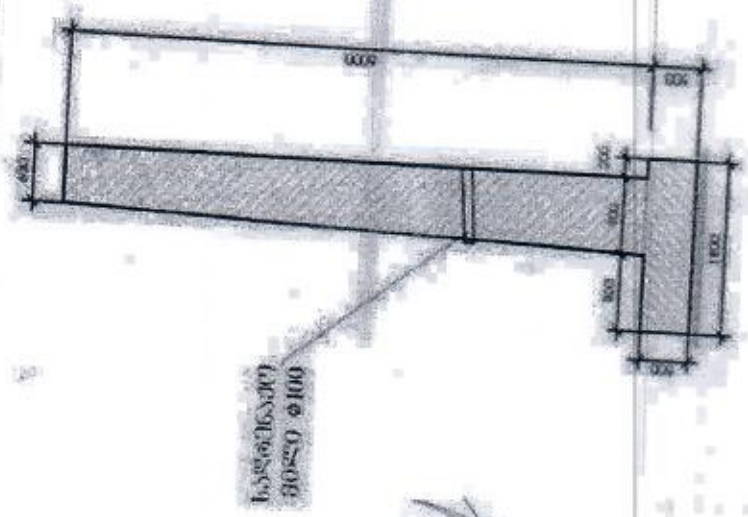


პ. მელიქიძე

პ. მელიქიძე

Будівництво залізничної станції - загальний план

Знак 1.1 (Знак будівництва)

Знак 1.1.1

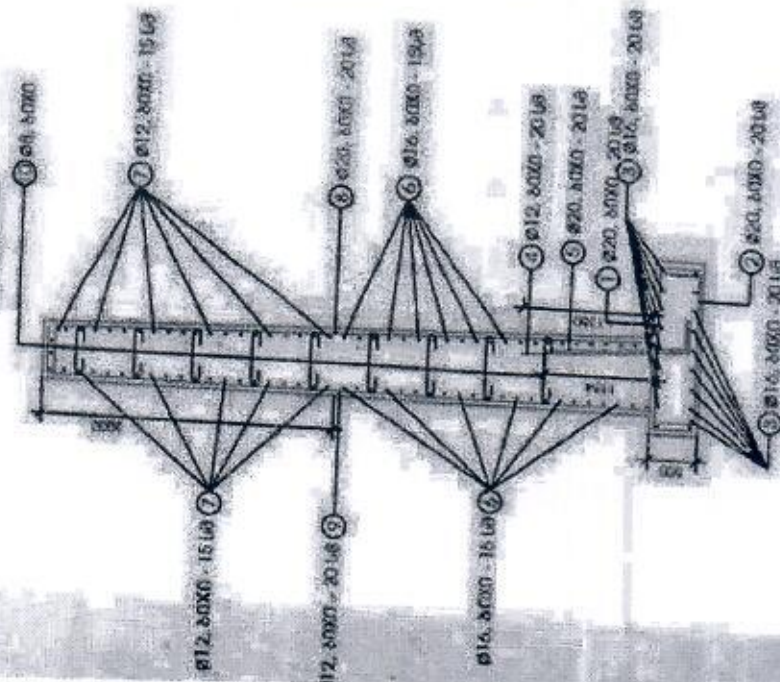

1. 12.00x0 - 15.00



2. 12.00x0 - 15.00



3. 12.00x0 - 15.00



4. 12.00x0 - 15.00



5. 12.00x0 - 15.00



6. 12.00x0 - 15.00



7. 12.00x0 - 15.00

8. 12.00x0 - 15.00





შპს "ზიმო-7"

LTD "ZIMO-7"

ქ. ბათუმი

26.06.2019 წ.

№ 01-10 /203

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეყნებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რ. ბერიძეს

ბატონო რაულ,

2019 წლის 25 ივნისის №01-10/201 წერილით მოგმართეთ 2019 წლის 28 იანვარს
დეპარტამენტთან გაფორმებული №23 ხელშეკრულების შესაბამისად ქედის
მუნიციპალიტეტში ს/გზა "წონიარისი - ვარჯანისი" კმ0+000+კმ1+650 მონაკვეთზე
გაუთვალისწინებული სამუშაოების თანხის ნაწილით დამატებით შესასრულებელი
რეინა/ბეტონის ქუედა საყრდენი კედლისა და გზის შევიწროვებულ მონაკვეთზე
ლითონის ცხაურით მოწყობის სამუშაოებზე.

სამუშაოების დასრულების ვადა იწერება 3 ივლისს, აღნიშნულ ვადაში
დასრუდება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები, რაც შეესაბამება დამატებით
ჩასატარებელ სამუშაოებს გთხოვთ სამუშაოების დასრულების ვადა გაგვიგზავნოთ
მიმდინარე წლის 15 ივლისის ჩათვლით.

პატივისცემით,

შპს „ზიმო-7“-ის დირექტორი



მ. მანუკიძე

მარინე მანგალიაძე

ZIMO-7 LTD

Подписано цифровой
подписью: ZIMO-7 LTD
Дата: 2019.06.26 09:39:37
+04'00'

