

გ.ნ. ა. მუსიოვი
მუსიოვი
09.07.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რგპფ) დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა შპს „მოედანი 2009“-ის მიერ სოფელ გლოლაში ღვარცოფსაწინააღმდეგო ღონისძიება.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა N2-ის შესაბამისად.
დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მერაბ ორდინიძე
კომისიის თავმჯდომარე

1620155

გ.ნ. ა. მუსიოვი
მუსიოვი
09.07.2015

1620155
09.07.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
შეამოწმა № 03-855
09.07.2015

სამუშაოების შესრულების

აქტი

09 ივლისი 2015 წელი


ქ.ონი


ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ (კომისიის თავმჯდომარე), გივი ბენდიანიშვილმა - გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა (კომისიის წევრი), ალექსი ჩალაძემ - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი (კომისიის წევრი), ამირან ჭელიძე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამემწე ტექნიკურ საკითხებში (კომისიის წევრი) და ირაკლი ბიჭაშვილი - მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში შეამოწმა ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და შპს 'მოედანი 2009'-ს შორის 2015 წლის 11 მარტის N07/03 გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე სოფელ გლოლაში დვარცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.


კომისიამ ადგილზე მისვლით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი.


მოხდა IVკატ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით და გვერძე დაყრა ექსკავატორით 0,5მ3	100083		
შრომატევადობა	კაც/სთ	21,5	✓
ექსკავატორი 0,5მ3 მუხლუხა	მან/სთ	48,2	✓
მოხდა გრუნტის გადაადგილება ბულდოზერით 30 მ. მანძილზე	100083		
1.ბულდოზერი 130ცხ.პ 22,4+9,41X2	მანქ/სთ	41,22	✓
მოწყო დაშმა ადგილობრივი გრუნტით	10083		
შრომატევადობა	კაც/სთ	15	✓
ავტორეიდერი 108 ცხ.პ	მან/სთ	2,16	✓
მოხდა დაბის დატკეპნა მიმეტონაჟიანი მუხლუხა ექსკავატორით	-/-	2,73	✓
სარწყავი მანქანა	-/-	0,97	✓
ადგილობრივი ბალასტი	მ3	122	✓
წყალი	მ3	7	✓
მოხდა IV ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით 0,5 მ3,ა/მან-ზე	100083		
შრომატევადობა	კაც/სთ	27	✓
ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	60,5	✓
სხვა მანქანები	მან	2,21	✓
ღორდი	მ3	0,66	✓
გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტნ		
მანქანები	ტნ	1,000	✓

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ სწორია და ხელს ვაწერთ:

მერაბ ორდინიძე  მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;

გივი ბენდიანიშვილი  გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;

ალექსი ჩალაძე  გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ტურიზმისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი - კომისიის წევრი

ამირან ჭელიძე  მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამემწე ტექნიკურ საკითხებში - კომისიის წევრი

ირაკლი ბიჭაშვილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მიღება-ჩაბარების აქტი N90

ქ. ონი

09 ივლისი 2015 წელი

2015 წლის 11 მარტის N07/03 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შპს „მოედანი 2009“-მ შეასრულა სოფელ გლოლიაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიება სამუშაოები ღირებულებით 53937,47 (ორმოცდაცამეტი ათას ცხრაას ოცდაჩვიდმეტი და 47) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის მიერ (ექსპერტიზის დასკვნა თან ახლავს).

ჩააბარა:

შპს „მოედანი 2009“-ის
დირექტორი: *ბ. ჯაფარიძე*

ბაქარ ჯაფარიძე



ჩაიბარა:

მუნიციპალიტეტის გამგებელი:
გიორგი დობჯანიძე



შესრულებული სამუშაოების მომდები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტის თეიმურაზ სხიერელის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო დამბის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობას, რომელსაც ასრულებდა შ.პ.ს. „მოედანი 2009“ დირექტორი ბაქარი ჯაფარიძე.

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



თ. სხიერელი

09.07.2015 წ

პ.ბ. კომპოზიტი
გ.ბ. კომპოზიტი
27.04.2015.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი კლობჯანიძეს

დავასრულე სოფელ გლოლაში დგარცოფის საწინააღმდეგო
ღონისძიებებისათვის (2015 წლის 11 მარტის 507/03) ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოები (შესაბამისი ციფრული ფოტო მასალა
წარდგენილია თქვენდამი დაქვემდებარებულ არქიტექტურის, ზედამხედველობისა
და ინფრასტრუქტურის სამსახურში).

გთხოვთ გამოყოთ კომისია შეამოწმით და ჩამირიცხოთ შესაბამისი თაზნხა.

შპს 'მოედანი 200'(-ის

დირექტორი: გ. ჯაფარიძე ბაქარი ჯაფარიძე

27.04.2015წ.

გ. 17
27.04.15წ.



მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ფაქსი № 03-466
27-04-15

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში ღვარცოვის საწინააღმდეგო ღონისძიება

შესრულების აქტი

ფორმა N 2

კმ.პ.	შიფრი და ნორმატივის კოდიციის ნომერი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი	
				5	6	7	8
1	11-11.-16	IV კატ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით და გვერძე დაყრა ექსკავატორით 0,5მ3	1000მ3		6,28	1847,11	11599,88
		შრომატევადობა	კაც/სთ	21,5	135,02	4,6	621,09
		ექსკავატორი 0,5მ3 მუხლუხა	მან/სთ	48,2	302,70	36,27	10978,93
2	1-29-7,13	გრუნტის გადაადგილება ბულდოზერით 30 მ. მანძილზე	1000მ3		6,30	1517,31	9559,04
		1.ბულდოზერი 130ცხ.ძ 22,4+9,41X2	მანკ/სთ	41,22	259,69	36,81	9559,04
3	27,-7-2	დაბის მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	100მ3		2,4	297,80	714,73
		შრომატევადობა	კაც/სთ	15	36,00	4,6	165,60
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ	მან/სთ	2,16	5,184	27,57	142,92
		დაბის დატყვანა მიმეტაონაიანი მუხლუხა ექსკავატორით	//-	2,73	6,552	35,63	233,45
		სარწყავი მანქანა	//-	0,97	2,328	4823	112,28
		ადგილობრივი ბალასტი	მ3	122	292,8		0,00
		წყალი	მ3	7	16,8	3,6	60,48
4	1.-22-16	IV ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით 0,5 მ3,ა/მან-ზე	1000მ3		3,874	2326,75	9014,26
		შრომატევადობა	კაც/სთ	27	104598	4,6	481,15
		ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	60,5	234377	36,27	8500,85
		სხვა მანქანები	მან	2,21	856,154	3,2	27,40
		ლორდი	მ3	0,66	0,23244	19	4,86
5	13-10	გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტნ		4135,4	1,83	7567,78
		მანქანები	ტნ	1,000	4135,4	1,83	7567,78
		ს უ ლ:					38455,69
		იჯარის ღირებულება დღგ-ს გარეშე					12966,1
		უკან იჯარის გარეშე					25489,59
		ზედნადები ხარჯები სამ. სამუშაოებზე		10%			2548,59
		ს უ ლ:					28038,55
		მოგება		8%			2243,08
		ს უ ლ:					30281,6
		იჯარის ღირებულება დღგ-ს გარეშე					12966,1
		ს უ ლ:					43247,7
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%			1426,8
		ს უ ლ:					44674,5
		დღგ		18%			8041,4
		ს უ ლ:					52715,9
		ექსპერტის მომსახურება		2,20%			1221,57
		ს უ ლ:					53937,47

დამკვეთი: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გამგებელი გიორგი ლობჯანიძე

შემსრულებელი: შ.პ.ს. "შოდანი-2008" დირექტორი ბაქარი ჯაფარიძე

ტექნიკური ზედამხედველი თეიმურაზ სხიერელი



Handwritten notes and signature at top left:
24.06.2015

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

შპს „მოედანი 2009“-ის

დირექტორის ბაქარ ჯაფარიძის

მიმართვა

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების N07/03 11.03.2015 წ. თანახმად შპს „მოედანი 2009“ ასრულებდა სოფელ გლოლაში ღვარცოფსაწინააღმდეგო სამუშაოებს. მუშაობის პროცესში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოებთან ერთად საჭირო გახდა სამუშაო ობიექტის მომიჯნავე ძველი მესერის მოხსნა და ახლით შეცვლა. აგრეთვე დასამუშავებელი არხის მარშრუტზე გადიოდა მოსახლეობისა და სოფელ გლოლის სკოლის სასმელი წყლის მილები, რომელიც მუშაობის პროცესში დაზიანდა და საჭირო გახდა აღდგენა აგრეთვე აქტიური მეწყრული ქანების გამო მოხდა პროექტის კორექტირება კერძოდ: სამუშაო მოცულობების გაზრდა, რამაც თავი იჩინა სამუშაო პროცესში. საჭირო გახდა ჯი-პი-ეს კოორდინატების აღება და სამუშაო პერიმეტრის დაკოლვა. წარმოგიდგინთ გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისა და ხარჯების ფორმა N2-ს 1400 (ერთი დასათხასი) ლარის ოდენობით.

გთხოვთ, აგვინაზღაუროთ ჩვენს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების ღირებულება.

Handwritten notes and signature:
N 716
24.06.15წ.
27.06.15

შპს „მოედანი 2009“-ის

დირექტორი



შპს „მოედანი 2009“-ის
დირექტორის ბაქარ ჯაფარიძის
შპს № 03-764
24.06.15

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის
მთავარი სპეციალისტის კობა მაღალადაძის

მ ი მ ა რ თ ვ ა

ბატონო გიორგი,

ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ გლოლაში ღვარცოფსაწინააღმდეგო სამუშაოებს რომელსაც შპს „მოედანი 2009“ ასრულებდა, მუშაობის პროცესში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოების გარდა საჭირო გახდა სამუშაო ობიექტის მომიჯნავე ძველი მესერის მოხსნა და ახლით შეცვლა. აგრეთვე დასამუშავებელი არხის მარშრუტზე გადიოდა მოსახლეობისა და სოფელ გლოლის სკოლის სასამელი წყლის მილები, რომელიც მუშაობის პროცესში დაზიანდა და საჭირო გახდა აღდგენა. აგრეთვე აქტიური მეწყერული ქანების გამო მოხდა პროექტის კორექტირება კერძოდ: სამუშაო მოცულობების გაზრდა, რამაც თავი იჩინა სამუშაო პროცესში. საჭირო გახდა ჯი-პი-ეს კოორდინატების აღება და სამუშაო პერიმეტრის დაკოლვა.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიმაჩნია სამუშაოების შესრულება მოხდეს პროექტში გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან, საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებიდან გაუსვლელად, ხოლო ანგარისწორება მოხდეს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

პატივისცემით,

კობა მაღალადაძე
ტექ. ზედამხედველი



ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

ქ. ზესტაფონი

17 მარტი 2015წ.

ერთის მხრივ, შ.პ.ს „CORSMAP“-ი შემდგომში როგორც “შემსრულებელი“ მისი დირექტორის შ. ჩარგეიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს “მოედანი 2009“-ის დირექტორის ბაქარი ჯაფარიძის სახით შემდგომში “დამკვეთი“ ვლებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს ს ა ბ ა ნ ი

“დამკვეთი“ უკვეთავს, ხოლო “შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას ონის რაიონ, სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ჯებირის წერტილების დაკოლავითი (სულ 15 წერტილი) შესრულებაზე, შემდგომში “სამუშაო“ და ჩაბაროს “დამკვეთს“ აღნიშნულ ვადებში.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს მ ი ძ მ ე ლ ბ ი ს ვ ა დ ა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს “სამუშაოს“ დამთავრებამდე. “სამუშაოს დამთავრების“ ვადაა 21 დღე.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ი ს კ ი რ ო ბ ე ბ ი

“დამკვეთი“ ვალდებულია გადაუხადოს “შემსრულებელს“ შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 100% სამუშაოების დამთავრებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 დღის ვადაში .

მ ო მ ს ა ს უ რ ა ბ ი ს ღ ი რ ე ბ უ ლ ე ბ ა

ხელშეკრულების საფუძველზე “შემსრულებლის“ მიერ ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 750.00 (შვიდას ორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

ს ა ნ ა ძ ე ბ ა

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, თუ ეს დარღვევა გამოწვეული არ არის “დამკვეთი“-ს მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით, “შემსრულებელი“ უხდის “დამკვეთს“ ჯარიმის სახით ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0,2%-ს ყოველ გადაცილებულ დღეზე. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საზღაურის დაგვიანებით გადახდის შემთხვევაში (თუ ეს დაგვიანება გამოწვეულია “დამკვეთი“-ს მიზეზით) “დამკვეთი“ უხდის “შემსრულებელს“ ჯარიმის სახით ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0,2%-ს ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

ა ნ გ ა რ ი შ ვ ო რ ბ ი ს წ ო ს ი

მიმდინარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მხარეთა შორის ანგარიშსწორება წარმოებს, “დამკვეთსა“ და “შემსრულებელს“ შორის როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

მ ხ ა რ ე თ ა ი უ რ ი დ ი უ ლ ი მ ი ს ა მ ა რ თ ე ბ ი დ ა რ ო კ ვ ი ზ ი ტ ე ბ ი:

“შემსრულებელი“

“დამკვეთი“

შ.პ.ს. „CORSMAP“

შპს “მოედანი 2009“

ქ. ზესტაფონი

ს/კ 237978550

წერეთლის ქ. №2

ქ. ონი, ზურაბ ქაფიანიძის ქ. №104

ანგ. № GE90BR0000010151754765

ს/კ 416310487

ს.ს. ბანკი რესპუბლიკა

ბანკის კოდი

REPLGE22

დირექტორი:  /მ. ჩარგეიშვილი/

დირექტორი:  /ბ. ჯაფარიძე/

მიღება-ჩაბარების აქტი

„ 19 „ მარტი „ 2015 წ.

ერთის მხრივ, შ.პ.ს. „CORSMAP“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ ჩარგეიშვილის მიერ, შემდგომში - „შემსრულებელი“ და მეორეს მხრივ, შპს „მოედანი 2009“ მიერ შემდგომში - „შემკვეთი“ ვაფორმებთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2015 წლის „ 17 “ მარტს დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, 2015 წლის „ 19 “ მარტს შემკვეთმა მიიღო, ხოლო შემსრულებელმა ჩააბარა შემდეგი შესრულებული სამუშაოები:

ონის რაიონ, სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ჯებირის წერტილების დაკოლვა (სულ 15 წერტილი). ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 750.00 (შვიდას ორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

რასაც მხარეები ადასტურებენ ხელმოწერით.

შ.პ.ს. „CORSMAP“

დირექტორი:  მ. ჩარგეიშვილი/

შპს „მოედანი 2009“

დირექტორი:  *ზ. ვაფარიძე* /ზ. ვაფარიძე/

მიღება-ჩაბარების აქტი

„ 19 „ მარტი „ 2015 წ.

ერთის მხრივ, შ.პ.ს. „CORSMAP“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ ჩარგეიშვილის მიერ, შემდგომში - „შემსრულებელი“ და მეორეს მხრივ, შპს „მოედანი 2009“ მიერ შემდგომში - „შემკვეთი“ ვაფორმებთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2015 წლის „ 17 “ მარტს დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, 2015 წლის „ 19 “ მარტს შემკვეთმა მიიღო, ხოლო შემსრულებელმა ჩააბარა შემდეგი შესრულებული სამუშაოები:

ონის რაიონ, სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ჯებირის წერტილების დაკოლვა (სულ 15 წერტილი). ჩატარებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 750.00 (შვიდას ორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

რასაც მხარეები ადასტურებენ ხელმოწერით.

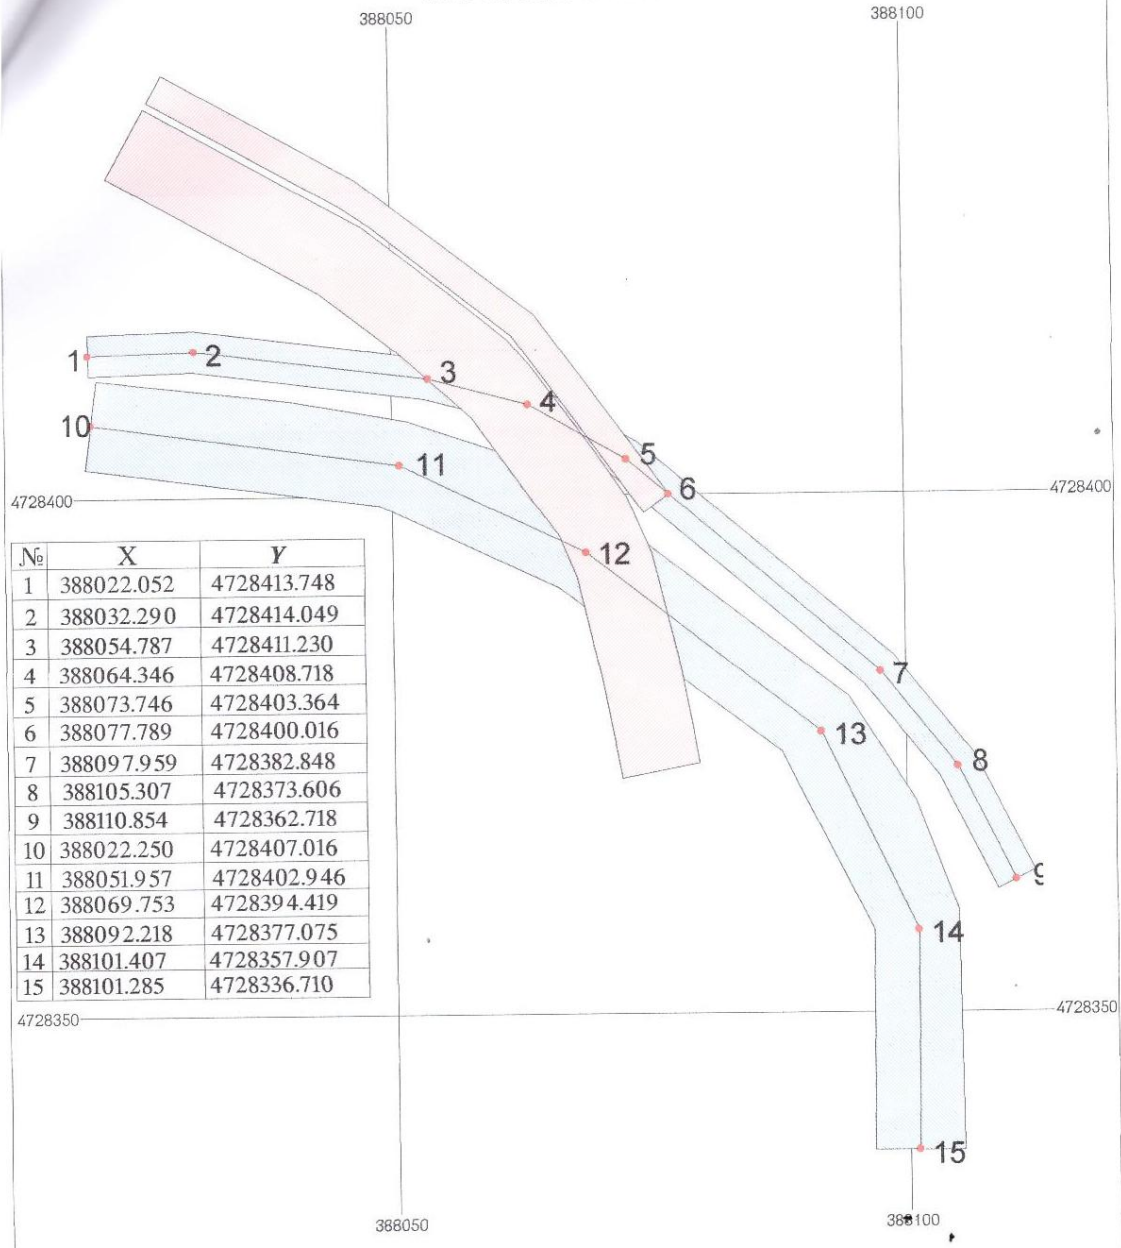
შ.პ.ს. „CORSMAP“

დირექტორი:  მ. ჩარგეიშვილი/



შპს „მოედანი 2009“

დირექტორი:  *ზ. ვაფარიძე* /
ზ. ვაფარიძე/

ონის რაიონი, სოფ. გლოლაში
სანიღვრე არხის და ღამბის მოწყობის
საკრომეტო და რეალური
გეგმა
მასშტაბი: 1=500



№	X	Y
1	388022.052	4728413.748
2	388032.290	4728414.049
3	388054.787	4728411.230
4	388064.346	4728408.718
5	388073.746	4728403.364
6	388077.789	4728400.016
7	388097.959	4728382.848
8	388105.307	4728373.606
9	388110.854	4728362.718
10	388022.250	4728407.016
11	388051.957	4728402.946
12	388069.753	4728394.419
13	388092.218	4728377.075
14	388101.407	4728357.907
15	388101.285	4728336.710

 პროექტის მიხედვით
 რეალური მდგომარეობა

შ.პ.ს. „CORSMAP“

ღირებულება: 416340487 / მ. ჩარგვიშვილი/



ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ბატონო გიორგი,

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „მოედანი 2009“ შორის მიმდინარე წლის 11 მარტს გაფორმებული N07/03 ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 ქვეპუნქტის მიხედვით შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება ხდება შემსყიდველის შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტისა და სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე.

წარმოდგენილ დოკუმენტაციას თან ერთვის სპეციალური ჯგუფის მიერ შედგენილი ხელმოწერილი შესაბამისი აქტი და ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც შესაბამისობაშია ხელშეკრულებასთან.

პატივისცემით,

მარიამ გობეჯიშვილი

იურიდიული განყოფილების უფროსი

მ. გობეჯიშვილი

3.07.2015წ

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

ფართობი №III-05
დამტკიცებულია საერთოველის ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დამტკიცებული 24/03/2015 11:14

1 ეა-15 2370656

3 მარტი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(ოვე ხაზიდან, წელი)

4 23 მარტი 2015

გამოწერის თარიღი
(როცა, ოვე ხაზიდან, წელი)

5

გამყიდველი

5,1 4 3 7 9 7 6 5 0 3

(ხაზგატეხილი ნომერი)

6

მყიდველი

6,1 2 3 7 9 7 8 5 5 0

(ხაზგატეხილი ნომერი)

5,2 შპს ბანი-2014

დასახელება (სახელი, გვარი)

6,2 შპს მოედანი 2009

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დრუების ცეპი	ცალი	3,0000	90,0000	13,7300	0,0000
სვერლო	ცალი	7,0000	10,5000	1,6000	0,0000
ბარგალკის ქვა	ცალი	4,0000	12,0000	1,8300	0,0000
		სულ	112,5	17,16	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

7 0164806006 8 23 - მარტი - 2015 03:20

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადასახადო ანგარიშგაქვრე

დანიშნუი №011-05
დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დღისთარი 08/04/2015 14:31

1 ეა-15 2413490

3 აპრილი 2015
ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(ოვე საბუღალრო, წელი)

4 08 აპრილი 2015
გამოწების თარიღი
(ჩოტევი, თვე, სიტყვიეროდ, წელი)

5 გამყიდველი
5.1 4 3 7 9 7 6 5 0 3
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი
6.1 2 3 7 9 7 8 5 5 0
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ბანი-2014
დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 შპს მოედანი 2009
დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შლანგი 1/2	მეტრი	18,0000	12,6000	1,9200	0,0000
შეთულებაღე	ცალი	9,0000	630,0000	96,1000	0,0000
		სულ	642,6	98,02	0

სასაქონლო ზედნადების № 0167535676 8 თარიღი 08 - აპრილი - 2015 01:58

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა _____ ბ.ა. მყიდველს ჩაბარდა ხელზე ხელმოწერა _____ ბ.ა.



3003884715

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3003884715

რეგონი	ქუთაისი	დასრულების თარიღი	06/07/2015
დოკუმენტი:			
რეგისტრაციის ნომერი:	1003732515	მომსახურების ტიპი:	ჩვეულებრივი
რეგისტრაციის თარიღი:	27/05/2015	საქმის ნომერი:	
ხელშეკრულების ნომერი:	2000582615	ხელშეკრულების თარიღი:	27/05/2015 - 08/07/2015
შეთანხმების ნომერი:		შეთანხმების თარიღი:	
დასკვნის ნომერი:	003880915		
ექსპერტის დამკვეთი :			
სახელი და გვარი:		ბაქარი ჯაფარიძე	
პირადი ნომერი:		34001008125	
ორგანიზაცია:		შპს მოედანი 2009	
საიდენტიფიკაციო კოდი:		237978550	
თანამდებობა:		დირექტორი	
დოკუმენტის შემომტანი:		ბაქარი ჯაფარიძე	

შესრულებული კვლევის კოდი (საქ.მთავრობის 08.05.2012 N171. დადგენილების მიხედვით)	ობიექტების რაოდენობა	საექსპერტო მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით)	თანხა
137. - სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა	1	2,2%	1221.57
			ჯამი: 1221.57
			საბოლოო ფასი: 1221.57

შემსრულებელი ექსპერტ(ებ)ი (სპეციალისტი):	
ავთანდილ მხეიძე	
საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტის განყოფილების ექსპერტი	
სტრუქტურული ქვედანაყოფის უფროსი / პასუხისმგებელი პირი	მიმღები პირი
 (ხელმოწერა)	 (ხელმოწერა)
	გაცემის თარიღი 06/07/2015

საჭიროა ანგარიშ-ფაქტურა

სოფელ გელოლაში მქმნისარაწინააღმდეგო საჭურჭაოების გაუთადოქრებელი ხარჯების

შეღრვლების აქტი

№	საჭურჭაოს დასახელება	განზიხმელებ	რაოდენობა	მშ. სი.	მასალა		საღრვები		ჭრანსაქრები		ჯამი
					ქრთვასი	სულ	ქრთვასი	სულ	ქრთვასი	სულ	
1	ღვარღოვსარაწინააღმდეგო კორიქტრეტი დამტკბითი კორიქტრეტიშის დაკოლე-ქიქრედალება.	მ	15	0	0	50	750	0	0	0	750
	მკეთულადის შრქნა 90მ (გალი 10მ)	გალი	9	0	70	630	0	0	0	0	630
	მელი (პლასტისის) 60=20	გრმ მტერი	18	0	2,6	46,8	0	0	0	0	46,8
		ჯამი				676,8	750				1426,8

შედღრინა: მ. კედიქიძე ხაქარ, ჯაღარობე
 მპს: "შეღრვანა-ქიქრე" დორიქტრეტი

ბმ: შეღრვანდველი:

კმედლეღრვანე

საგადასახადო ანგარიშგაქვრეა

დართი NoIII-05
დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 3072015 0247

1 ეა-15 2600456

3 ივლისი 2015

ფაქტობრივი განმარტების ბილიტი
(თვ. სიხვედრის წელი)

4 10 ივლისი 2015

გამაჩერების ბილიტი
(რაცეტი, თვე სიხვედრის, წელი)

5

გამაჩერებული

5,0 2 3 7 9 7 8 5 5 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

გამაჩერებული

6,1 2 3 7 9 7 8 2 7 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს მოედანი 2009

დასახელება (სახელი, გვარი)

6,2 თვითმმართველი ერთეული ონის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სოფ. გლოლაში ღვასცოფსაწინააღმდეგო სამუშაოები ხელშეკრულება N 07/03	მომსახურება		16201,5500	2471,4200	0,0000
		სულ	16201,55	2471,42	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

გამაჩერებულს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი
 WESTERN GEORGIA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

ა.
 ბ.
 გ.
 დ.
 ე.
 ვ.
 ზ.
 თ.
 ი.
 კ.
 ლ.
 მ.
 ნ.
 ი.
 პ.
 რ.
 ს.
 ტ.
 ც.
 ზ.
 ლ.
 მ.
 ნ.
 ი.
 პ.
 რ.
 ს.
 ტ.
 ც.

5003301415 201 წ.

06/07/2015



5003301415

შპს მოედანი 2009 -ს დირექტორს
 ბატონ ბაქარი ჯაფარიძეს
 (ონი დადამუშევრების ქ. N 31)

ბატონო ბაქარი,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის ბიუროს 2015 წლის 27 მაისის რეგისტრაციის N1003732515) საფუძველზე, გოგზავნით საინჟინრო ექსპერტიზის N003880915 დასკვნას.
 დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 05 ფურცლად;

პატივისცემით,

კობა ახვლედიანი
 დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის
 დეპარტამენტის უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



003880915

ექსპერტის დასკვნა № 003880915

გაფრთხილება

დასაყრდენი საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის დასკვნის მიზნით, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ცალბი დასკვნის, საექსპერტო ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარაუდის სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

აღნიშნავი:

როდნიზაცია: შპს მოედანი 2009

ანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ონი დ. აღმაშენებლის ქ. N 31

სახელი და გვარი: ბაქარი ჯაფარიძე

საფუძველი: განცხადება

შესრულებული ექსპერტები:

ავთანდილ მხეიძე / დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. კუთვით დამიდგინოთ ონში სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო სამუშაოებზე მოცულობა და ღირებულება

შემოსვლის თარიღი: 27.05.2015წ

გასვლის თარიღი: 06.07.2015წ

დასკვნა

შპს „მოედანი 2009“-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ონის მუნიციპალიტეტის სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება მოცემულია დანართ №1-ში და შეადგენს 52715,9 ლარს.

ავთანდილ მხეიძე

გამოკვლევა

შპს „მოედანი 2009“-ს მიერ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა ონის მუნიციპალიტეტის სოფ. გლოლაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები. ასევე წარმოდგენილი იქნა სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით შედგენილი დოკუმენტების ასლები: დამკვეთსა და მიწმფლობელს შორის დადებული ხელშეკრულება, პირდაპირი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2) ღირებულებით 55526,0 ლარი დღგ-ს ჩათვლით. დაქირავებული ფიზიკური პირების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე მოხდენილი ანაზღაურების ამსახველი დოკუმენტები და ხელფასების დარიცხვის უწყისი, ობიექტზე გამოყენებული ძირითადი და დამხმარე მასალების შეძენის დამადასტურებელი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, სასაქონლო ზედნადებები, და სამუშაოების ამსახველი სხვა დოკუმენტები.



საქართველოს საერთაშორისო მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული „სამშენებლო საქართველოს შესახებ“ საქონლისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი“-ს მოთხოვნების შესახებ.

საქართველოს წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და ადგილზე აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების მიხედვით, ობიექტი დათვალიერებული იქნა ვიზუალურად. ჩატარდა საკონტროლო აზომვები. ხილული ობიექტი მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად დასრულებული სამუშაოების ადრიცხვა და ჩათვლა წარმოადგენს დამკვეთის პრიორიტეტს. საკონტროლო აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების თანახმად გარკვეული კორექტირებები იქნა შეტანილი მშენებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტის მონაცემებში (დარიცხვების ნაწილი), დაზუსტებული მონაცემების მოცულობა და ღირებულება მოცემულია დანართ № 1-ში და მისი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 27 523 ლარს.

დანართი № -1).

ავთანდილ მხეიძე

გამოყენებული მასალები

- 1. შენობა-ნაგებობა - 01 ფურცელზე.
- 2. დოკუმენტაცია - 49 ფურცელი.

გამოყენებული ლიტერატურა

- 1. სამშენებლო ნორმები და წესები.
- 2. სამშენებლო რესურსების ფასები.
- 3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილება „სამშენებლო საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი“ შესახებ.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ზაკურ ბერეკაშვილი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: კობა ახვლედიანი

