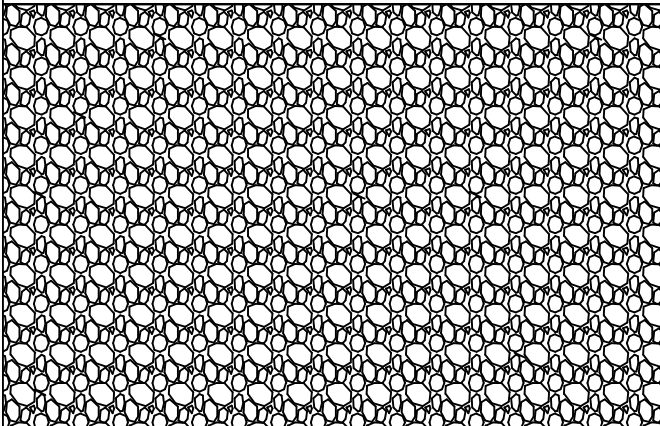



შპს „საინჟინერო“				შურფი №1		აბსოლუტური ნიშნული 1027.20 მ		
ფასანაურში, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების ცენტრის სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე (საკად. კოდი №71.54.06.074) ჩატარებული საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები				დაწყება: 21.06.2018 დამთავრება: 21.06.2018		▽ წყლის გამოვლენა 1.7 მ ▼ წყლის დამყარება 1.6 მ ⊖ წყლის სინჯი (1025.60)		
				შურფის გაყვანა: ერთციცხვიანი ექსკავატორის მეშვეობით		◇ მონოლითი ◊ დამშლილი სტრუქტურა		
ფენის №	გეოლოგიური ინდექსი	ფენის სიღრმე მ	სტრატეგია ნიშნული მ	ფენის სიღრმე მ	ლითოლოგიური ჭრილი	ფენის სიღრმე მ	გრუნტის აღწერა	ფენის სიღრმე მ
1	აQIV	5.0	1022.20	5.0			კენჭნარი რუხი-ნაცრისფერი თიხაქვიშის შემაყვებით 12-15%-მდე, კაგარით 15-20%-მდე, ბრეშით 10-15%-მდე. კენჭნარი სხედასხვა ზომის, საშუალო დამუშავების, დანალექი, მეტამორფული და ინტერუმიული ქანებისა, საშუალო სიმკვრივის, ტენიანი, ზედაში უწყლო, 1.2-1.6 მეტრიდან წყლოვანი	
