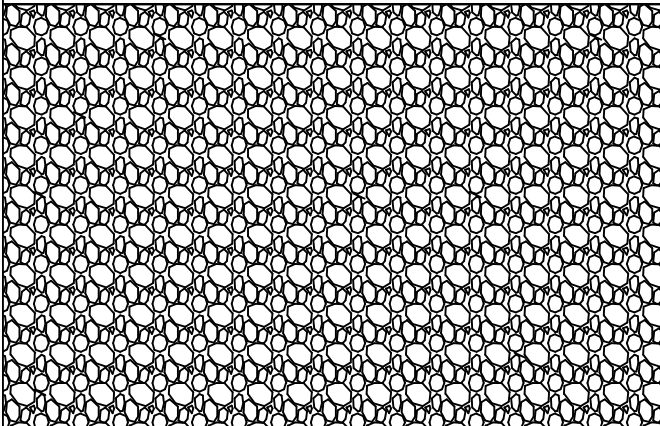


შპს „საინჟინერო“				შურფი №3		აბსოლუტური ნიშნული 1026.80 მ		
ფასანაურში, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადარეგულირებით სასწრაფო დანმარების ცენტრის სამშენიციანო დანმარების შენობის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე (საკად. კოდი №71.54.06.074) ჩატარებული საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები				დაწყება: 21.06.2018 დამთავრება: 21.06.2018		▽ წყლის გამოვლენა 1.4 მ ▼ წყლის დამყარება 1.3 მ ⊖ წყლის სინჯი (1025.50) □ მონოლითი ◇ დამშლილი სტრუქტურა		
				შურფის გაყვანა: ერთციცხვიანი ექსკავატორის მეშვეობით				
№ ფენის	გეოლოგიური ინდექსი	ფენის სიღრმე მ	სტრატეგია	ფენის სიღრმე მ	ლითოლოგიური ჭრილი	ფენის სიღრმე მ	გრუნტის აღწერა	ფენის სიღრმე მ
1	აQIV	5.0	1021.80	5.0			კენჭნარი რუხი-ნაცრისფერი თიხაქვიშის შემავსებლით 12-15%-მდე, კაგარით 15-20%-მდე, ბრეშით 10-15%-მდე. კენჭნარი სხვადასხვა ზომის, საშუალო დამუშავების, დანალექი, მეტამორფული და ინტერუმიული ქანებისა, საშუალო სიმკვრივის, ტენიანი, ზედაში უწყლო, 1.2-1.6 მეტრიდან წყლოვანი	
