

შპს „საინჟინერო“

შურფი №4

აბსოლუტური
ნიშნული 1026.70 მ

ფსანაურში, საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი
სასწრაფო დახმარების ცენტრის
სამედიცინო დახმარების შენობის
მშენებლობისათვის გამოყოფილ
ტერიტორიაზე (საკაღ. კოდი
№71.54.06.074) ჩატარებული
საინჟინერო-გეოლოგიური კვლევის
შედეგები

დაწყება: 21.06.2018
დამთავრება: 21.06.2018

შურფის გაყვანა: ერთციცხვიანი
ექსკავატორის მეშვეობით

- ▽ წყლის გამოვლენა 1.3 მ
- ▼ წყლის დამყარება 1.2 მ (1025.50)
- წყლის სინჯი
- მონოლითი
- ◇ დაშლილი სტრუქტურა

ფენის №

სტრატეგული
გეოლოგია

მ
ფენის
სიღრმე

მ
სტრატეგული
ნიშნული

მ
სტრატეგული
ფენის

ლითოლოგიური
კრილი

მ
სტრატეგული
ფენის

გრუნტის აღწერა

მ
სტრატეგული
ფენის


1

აQIV

5.0

1021.70

5.0

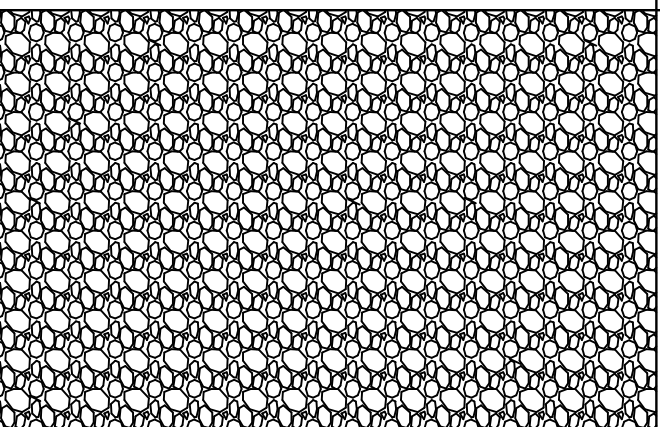

5

კენჭნარი რუხი-ნაცარი სფერი
თიხაქვიშის შემავსებლით
12-15%-მდე, კაგარით 15-20%-მდე,
ხრეშით 10-15%-მდე. კენჭნარი
სხვადასხვა ზომის, საშუალო
დამუშავების, დანალექი,
მეტამორფული და ინტერუმიული
ქანებისა, საშუალო სიმკვრივის,
ტენიანი, ზედაში უწყლო, 1.2-1.6
მეტრიდან წყლოვანი

მ
სტრატეგული
ფენის
