კალენდარული გეგმა T=5.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
I	**მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები**																			
	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	15																		
II	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**																			
1	-- ცოკოლის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება; -- სართულშუა გადახურვების რეაბილიტაცია. -- დასავლეთ ფასადზე კარების და აივნების მოწყობა	55																		
2	-- არასაინვენტარო ხარაჩოების დაყენება; -- ფასადებზე არსებული ბზარების ინექცია; -- მორყეული ქვის კედლების გადაწყობა. -- ახალი ანალოგიური ქვის კედლების აშენება. -- კოშკის გადახურვის რეაბილიტაცია -- ქვისშორისების ამოლესვა კირდუღაბის ხსნარებით. -- არასაინვენტარო ხარაჩოების დაშლა- გატანა;	85																		
3	--ქვის საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარება	-																		
III	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
I	**მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები**																			
	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	15																		
II	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**																			
1	-- ცოკოლის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება; -- სართულშუა გადახურვების რეაბილიტაცია. -- დასავლეთ ფასადზე კარების და აივნების მოწყობა	55																		
2	-- არასაინვენტარო ხარაჩოების დაყენება; -- ფასადებზე არსებული ბზარების ინექცია; -- მორყეული ქვის კედლების გადაწყობა. -- ახალი ანალოგიური ქვის კედლების აშენება. -- კოშკის გადახურვის რეაბილიტაცია -- ქვისშორისების ამოლესვა კირდუღაბის ხსნარებით. -- არასაინვენტარო ხარაჩოების დაშლა- გატანა;	85																		
3	--ქვის საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარება	-																		
III	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

ფორმატი PAPER SIZE	დაკვეთა KONTRACT	N პროექტის N N PROJECT N	საანრიცხვო ბარათი Account card
A3	№ 2-57-23 ტ	№3	№ 24425

პირობითი აღნიშვნები 2-57-23 T LEGEND

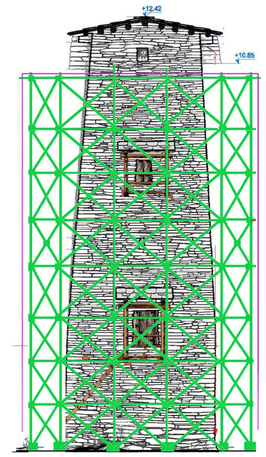

შენიშვნა:
1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში
2. ნახაზზე ჭვალა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.
3. შურცლის კორექტირებით ავტომატურად შემდება წინა ვარიანტი.

Note :
1. The dimensions of the drawing are given in meters
2. All amendments to the drawing should be agreed upon with the project author.
3. The amended sheet automatically replaces the previous one.

დამკვეთი CLIENT	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო NATIONAL AGENCY FOR CULTURAL HERITAJE PREZERVATION OF GEORGIA
დაკვეთა	ხელშეკრულება № 2-57-23 ტ
პროექტი №3 PROJECT	თამარის კოშკის რესტავრაციის პროექტი Tamari Tower restoration project
მისამართი ADDRESS	მესტიის მუნიციპალიტეტი , უშგულის თემი, სოფელი ჩაჯაში Mestia municipality, Ushguli community, village Chazhashi

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი Director	გ. ჯაფარიძე G. Japaridze	
არქიტექტორი Architect	გ. ჯაფარიძე G. Japaridze	
კონსტრუქტორი Constructor	ა. მჭედლიშვილი A. Mchedlishvili	
შესრულა Drow by	მ. ჯვიციანი M. Kvitsiani	

CENTRE FOR REZERVATION OF CULTURAL HERITAJE OF MESTIA MUNICIPALITI
tel: (+995) 93 52 25 33

მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
mail: m.k.m.centri@gmail.com

		თარიღი DATE OF ISSUE	2024

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მასშტაბი SCALE	1: 200	ფურცელი PAGES
		ტგ-2
