

შ 190 მ 3 გ 8

შეთანხმება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შპს „კავკასენერგოს“ შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
გაფორმებულ 2018 წლის 19 მარტის №59 ხელშეკრულებაში
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანაზე



აღმი 05 გ.

ქ. ზუგდიდი

04 მაისი, 2018 წელი

ერთი მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ლაშა გოგიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „კავკასენერგო“ (შემდგომში, ხელშეკრულების ტექსტში – მიმწოდებელი), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ზურაბ ჯაველიძეს სახით, მხარეთა შორის 2018 წლის 19 მარტს გაფორმებულ №59 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულება) მე-10 მუხლისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის 2018 წლის 4 მაისის №2527-02 წერილის გათვალისწინებით ვთანხმდებით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისა და შპს „კავკასენერგოს“ შორის 2018 წლის 19 მარტს გაფორმდა №59 ხელშეკრულება, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფაჩასფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის (II ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე. სამუშაოების სახელშეკრულებო ღიადგენს 178 538 (ასსამოცდათვრამეტი ათას ხუთასოცდათვრამეტი) ლარს, სამუშაოების შესრულების ვადად განსაზღვრულია 40 (ორმოცი) კალენდარული დღე.

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის 2018 წლის 4 მაისის №2527-02 წერილის თანახმად, 2018 წლის 26 აპრილს მიმწოდებელი წერილობით (რეგისტრაციის ნომერი №7263/02, 26.04.2018წ-ის) იტყობინება სამუშაოების ვადის გაგრძელებაზე და აღნიშნავს შემაფერხებელ გარემოებებს ნალექიანი დღეების შესახებ მშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში, შესაბამისად წარმოდგენილ იქნა ამინდის ცნობა, სისკ „გარემოს ეროვნული სააგენტოდან“. აღნიშნულ საკითხზე, 2018 წლის 26 აპრილს №02/4869 წერილობით ეცნობა ობიექტზე უშუალო ტექნიკურ ზედამხედველს შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტს“ და ეთხოვა სამუშაოების შეფერხების თაობაზე ინფორმაციის მოწოდება. 2018 წლის 4 მაისს შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტს“ ყოველდღიური ჩანაწერების აქტებზე დაყრდნობით მიზანშეწონილად მიიჩნევს შესასრულებელი სამუშაოების ვადის გაგრძელებას 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით.

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურმა იმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და დაადგინა რომ, შპს „კავკასენერგოს“ სამუშაოების შესრულების ვადა უნდა გაუგრძელდეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით.

შემოღვნიშულიდან გამომდინარე:

- შეტანილ იქნებს ცვლილება ხელშეკრულებაში და მიმწოდებელს სამუშაოს დასრულებისათვის განესაზღვროს დამატებითი ვადა, 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღე;
- მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად დამატებით ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით განხორციელდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 და 4.2 პუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

პუნქტი 4.1. – „სამუშაოებს სრული მოცულობის შესრულება მიმწოდებლის მიერ განხორციელდება 55 (ორმოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.“

პუნქტი 4.2. – „მიმწოდებელი ვალდებულია დაიწყოს სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან და დასრულოს არაუგვიანეს 2018 წლის 14 მაისამდე.“

- აღნიშნულის გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-19 მუხლის 19.7 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმულირებით:

პუნქტი 19.7. – „ხელშეკრულება ძალაშია 2018 წლის 15 სექტემბრამდე. თუ, ამ თარიღისათვის არ არის შესრულებული რომელიმე ვალდებულება ხელშეკრულება ავტომატურად გაგრძელდება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.“

- ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დეტალებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია/Zugdidi Municipality City Hall



5. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხუთი თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად და ინახება მხარეებთან (ოთხი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი პირი მიმწოდებელთან).

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90
საიდენტიფიკაციო კოდი: **220418956**
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

.....
/ ვაგონ ჭავჭავაძე /

ზომიერი დეპარტამენტი

შპს „კავკასენერგო“
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ.№2
საიდენტიფიკაციო კოდი: **404922063**
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE44TB7678636080100001



2

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლაშა გოგიას

ბატონო ლაშა,

როგორც მოგეხსენებათ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „კავკასენერგო“-ს შორის 2018 წლის 19 მარტს გაფორმებული N59 ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფაჩაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის (II ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2018 წლის 26 აპრილს მიმწოდებელმა მოგვმართა წერილობით (რეგისტრაციის N7262/02) სამუშაოების ვადის გაგრძელებაზე უამინდობის გამო 17 (ჩვიდეტი) კალენდარული დღით და წარმოადგინა სსიპ „გარემოს ეროვნული საგენტო“-ს ცნობა უამინდობის შესახებ. აღნიშნულზე მივმართეთ ობიექტის უშუალო ზედამხედველს, ინსპექტირების ორგანოს - შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“-ს, რომელიც ყოველდღიურად ახორციელებს აღნიშნულ ობიექტზე ტექნიკურ ზედამხედველობას. შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“-ს მომართვაში (რეგისტრაციის N7695/02) აღნიშნულია, რომ ყოველდღიური ჩანაწერების აქტების მიხედვით, ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, მიზანსეწონილად მიაშნია მიმწოდებელს უამინდობის გამო გაუგრძელდეს სამუშაოების შესრულების ვადა 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით.

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურმა იმსჯელა სამუშაოების ვადის გაგრძელების საკითხზე და დააგინა, რომ შპს „კავკასენერგო“-ს 19.03.2018 წლის N59 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა უნდა გაუგრძელდეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს სჭირო ღონისძიებების გატარება.

თან ერთვის სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ცნობა და წერილები.

დანართი 5 ფურცელი.

პატივისცემით,

ლაშა ჯაიანი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური



07.04.088

25 აპრილი 2018 წ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერს
შატონ ლაშა გოგიას


შატონ ლაშა,

როგორც თქვენთვის ცნობილია უმს „კავკასიონერგო“ და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის 2018 წლის 19 მარტს გაფორმებული №59 ხელშეკრულების თანამხად ვახორციელებთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემების აღმინისტრაციულ ურთეულში საავტომობილო გზის (II ეტაპი) სარეალიზაციო სამუშაოების სამუშაოების მსვლელობის პერიოდში წმირი იყო ნაღვენას დაუთარიღებითა, კერძოლდ 15 დღე, რა დროსაც შეულმებელი იყო მუშაობა, აგრძოლეთ ამავდროი თემი დამეტევა ადგომის დღესასწაულები. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოწოდეთ თემით, გადაგვივადოთ სამუშაოების დასრულების ვადა 17 დღით.

დანართის სახით გიგზავნით - ცნობას განეცნობის ურთეული სააგენტოდან

პატივისცემით,

შპს „კავკასენერგოს“-ს დირექტორის
ზურაბ ებიევის გამოცხადებით

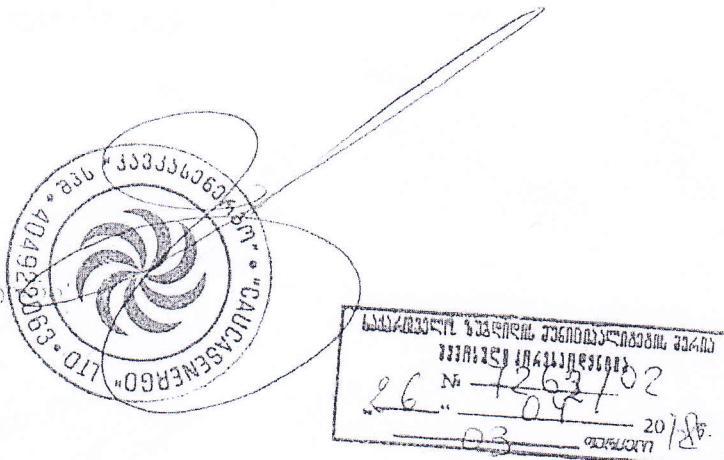



სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
LEPL NATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY

N/2/1-293

25 04 2018

შპს „კავკასენერგო“-ს დირექტორს
ბ-ნ ზურაბ ჯაველიძეს


შპს „კავკასენერგო“-ს დირექტორს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სა და შპს „კავკასენერგო“-ს შორის 2018 წლის 23 აპრილს გაფორმებული ფასიანი მომსახურების შესახებ №ფმ-1/253 ზელშეკრულების შესაბამისად, ქ. ზუგდიდის მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით ვაცნობებთ, რომ 2018 წლის 19 მარტიდან 23 აპრილის ჩათვლით წალენჯი აღინიშნა:

21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 - მარტს;
03, 14, 15, 16, 20, 21, 22 - აპრილს.

სულ - 15 დღე.

პატივისცემით,



სააგენტოს უფროსი

ნინო თანდილაშვილი





საქართველო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მმრია
GEORGIA
ZUGDIDI MUNICIPALITY CITY HALL

N 02/4869
26/04/2018

4869-02-2-201804261514



შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“-ს დირექტორს

ბატონ ზუბიკო შავდათუაშვილს

ბატონო ზუბიკო,

როგორც მოგეხსენებათ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სპს „კავკასენერგო“-შორის 2018 წლის 19 მარტს გაფორმდა N59 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის (II ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2018 წლის 26 აპრილს მიმწოდებელმა მოგვმართა წერილობით (რეგისტრაციის N7262/02) სამუშაოების ვადის გაგრძელებაზე 17 (ჩვიდმეტი) კალენდარული დღით და წარმოადგინა სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ცნობა ნალექიანი დღეების შესახებ.

გთხოვთ, გვაცნობოთ წერილობით მოსული ნალექის შედეგად სამუშაოების შეფერხების (შეჩერების) თაობაზე და ასევე თქვენი მოსაზრება აღნიშნული შესასრულებელი სამუშაოების ვადის გაგრძელების მიზანშეწონილობის შემთხვევაში - დასამეტებელი დღეების რაოდენობის შესახებ, ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, შემჭიდროებულ ვადაში.

ცნობისათვის თან ერთვის შპს „კავკასენერგო“-ს მომართვა და ცნობა ნალექიანი დღეების შესახებ.

დანართი 3 ფურცელი.

პატივისცემით,

ლაშა გოგია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი

AUDITESCORT



შპს „თი აი ეი აუდიტესკორტი“ -ის

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო
აკრედიტირებული სსიპ „აკრედიტაციის ერთანან
ეროვნული ორგანო- აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ
სსტ ის/ივ 17020:2012/13-ის შესაბამისობაზე
(აკრედიტაციის მოწმობის N GAC-IB-0131)

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N
E-mail: i@auditescort@gmail.com:
სხ: 205229439 T/Fax:
ტელ: (+99532) 144 500

NTA-L-111-206-087-18

02.05.2018 წ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი

ზატონ ლაშა გოგიას.

ზატონი ლაშა,

მოგეხსენებათ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თი აი ეი ჯ აუდიტესკორტს“ შორის 2017 წლის 25 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 111 და 206 ხელშეკრულებებისა და ტექნიკური დავალებების, ასევე აღნიშნულ (30.11.2017) შეთანხმების შესახებ N64/111 (30.11.2017) და 63/206 მუნიციპალიტეტის ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის (II ეტაპი: 404922063).

თქვენი 2018 წლის 26 აპრილის N 4869 წერილის პასუხად გაცნობებთ, შპს „თი აი ეი ჯ აუდიტესკორტის“ ინსპექტირების ორგანო ნაწილობრივ ადასტურებს შპს „კავკასენერგო“-ს დღესასწაულებზე სამუშაოების შეფერხებით მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. თუმცა დაყრდნობით მიზანშეწონილად მიაჩინა გაგრძელდეს შესასრულებელი სამუშაოების ვადა 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით.

პატივისცემით,

შპს „თი აი ეი ჯ აუდიტესკორტის“

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი



ა. ქორიძე

თ. ჯიქია

მილოვან გ. ვალიძე
04.05.2018

