

დანართი-შეთანხმება №2

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს „გზამშენი XXI“-ს შორის

2018 წლის 2 აპრილს დადებული №95 ხელშეკრულებაზე

ქ. ქუთაისი

19 ივნისი 2018 წ.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT180002370 აუქციონის გარეშე ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს „გზამშენი XXI“-ს შორის, 2018 წლის 2 აპრილს დაიდო №95 ხელშეკრულება 800100 (რვაასი ათას ასი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში, აკ.წერეთლის ქუჩის მე-8 ჩიხის, ნინოშვილის ქუჩის მე-13 ჩიხის, თაბუკაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის (ეკლესიასთან მისასვლელი გზა) და თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8 ჩიხების გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად.

შპს „გზამშენი XXI“-ის 2018 წლის 18 მაისის №12 (№13108/01 18.05 2018 წ.) წერილის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის 2018 წლის 15 ივნისის №7212-01 მომართვის და საპროექტო ორგანიზაციის ინდ. მეწარმე „ვაჟა ოქროპირაშვილის“ 2018 წლის 15 ივნისის და შ.კ.ს. „საინჟინრო მოწიტორინგის ჯგუფი“-ს 2018 წლის 8 ივნისის №გ821 წერილების საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული, რომ 2018 წლის 2 აპრილს დადებული №95 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 7 (შვიდი) ობიექტიდან 4 (ოთხი) ობიექტზე - თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8 ჩიხების გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადანთან ერთად განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვებით თითოეული ობიექტისთვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის შეუცვლელად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი ჭილვარიას სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170 ტელ: 24-54-54) (შემდგომში „შესყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.კ.ს „გზამშენი XXI“-ი მისი დირექტორის, იაშა ახალაძის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, ანჯაფარიძის ქ. №100ა ტელ: 593 30 83 18, ს/კ 212709498) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარები თანხმდებიან, რომ 2018 წლის აპრილს დადებული №95 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 7 (შვიდი) ობიექტიდან 4 (ოთხი) ობიექტზე - თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8 ჩიხების გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვებით თითოეული ობიექტისთვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის შეუცვლელად. (თან ერთვის)
2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2018 წლის 2 აპრილს დადებული №95 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება 800100 (რვაასი ათას ასი) ლარი დარჩეს უცვლელი.
3. დანართი შეთანხმება №2 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2018 წლის 2 აპრილის დადებული №95 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

გიორგი ჭილვარია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი



მ. გ. მ.

იაშა ახალაძე

შ.კ.ს „გზამშენი XXI“-ის დირექტორი



ა. ა.



საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური
GEORGIA



Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisisinfrastructura@gmail.com

N 7212-01
15/06/2018

7212-01-3-201806151658



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი იობაშვილის

ბატონო გიორგი,

ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „გზამშენი XXI“-ს მორის 2018 წლის 2,04,2018-წ
გაფორმებული №95 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმდინარეობს თაბუკაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის და
თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად.

ფაქტიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია ითხოვს სამუშაოების წარმოებას
კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საპროექტო ორგანიზაციამ წარმოადგინა კორექტირებული
ხარჯთაღრიცხვა.

ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია ორგანიზაციამ იხელმძღვანელოს აღნიშნულით და აწარმოოს
სამუშაოები.

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო
შესყიდვების სამსახურს შპს „გზამშენი XXI“-ს გაუფორმოს დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის
განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

შ.კ. „გზამშენი XXI“

მისამართი : ქ. ქუთაისი, ანჯაფარიძის ქ. №100^ა
212709498

☎ (0-431) 23-37-21; +995 99 28 80 21

L.T.D. 'GZAMSHENI XXI'

Adress: №100^ა Anjafaridze st, kutaisi, Georgia

☎ (0-431) 23-37-21; +995 99 28 80 21

12

№_____

18

გაიხო

„_____“ 2018 წ.

ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა
და დახურულის სამსახურის ხელმძღვანელის
ბატონი ბექა ყურაშვილის

ბატონო ბექა,

როგორც მოგეხსენებათ, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2018 წლის
2 აპრილს ურთიერთშორის გაფორმებული №95 ხელშეკრულებით გვევალება -ქალაქ
ქუთაისში : აკტერეთლის ქუჩის მე-8 ნიხის, ნინოშვილის ქუჩის მე-13 ნიხის,
თაბუკაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის (ეკლესიასთან მისასვლელი გზა) და
თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-8 ნიხების გზის ა/ბეტონის საფარის და
ღვარსადენის მოწყობა. ხელშეკრულების თანახმად თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, 4, 6, 8
ნიხებში მოსაწყობია დია ტიპის ნიაღვარმიმდები ბეტონის დარები ზომით 30**50
რომელიც ფიზიკურად ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის მისი მზა პროდუქტად არ
არსებობის გამო. ამიტომ ვფიქრობთ მის ჩანაცვლებას სხვა ზომის დარებით კერძოდ :
ზომით 0.35X0.40X0.15 (განზომილება მეტრში), რომელიც ხარისხობრივადაც უკეთესი
იქნება, რადგან იწნებება სპეციფიკური პრესით და გამოირჩევა მაღალი სიმტკიცით.

ყოველივეს გათვალისწინებით მოგმართავთ თხოვნით, მოგვცეთ უფლება
შევიტანოთ შესაბამისი კორექტირება პროექტში (პროექტის ავტორთან შეთანხმებით),
რაც ასახულია თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში და არ იწვევს თანხის ცვლილებას.

პატივისცემით,

შპს „გზამშენი XXI“-ს დირექტორი




№ 13108/01

18. 05. 2018

ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელს

ზატონ ბექა ყურაშვილს

თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6, მე-
8 ჩიხების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვებს.

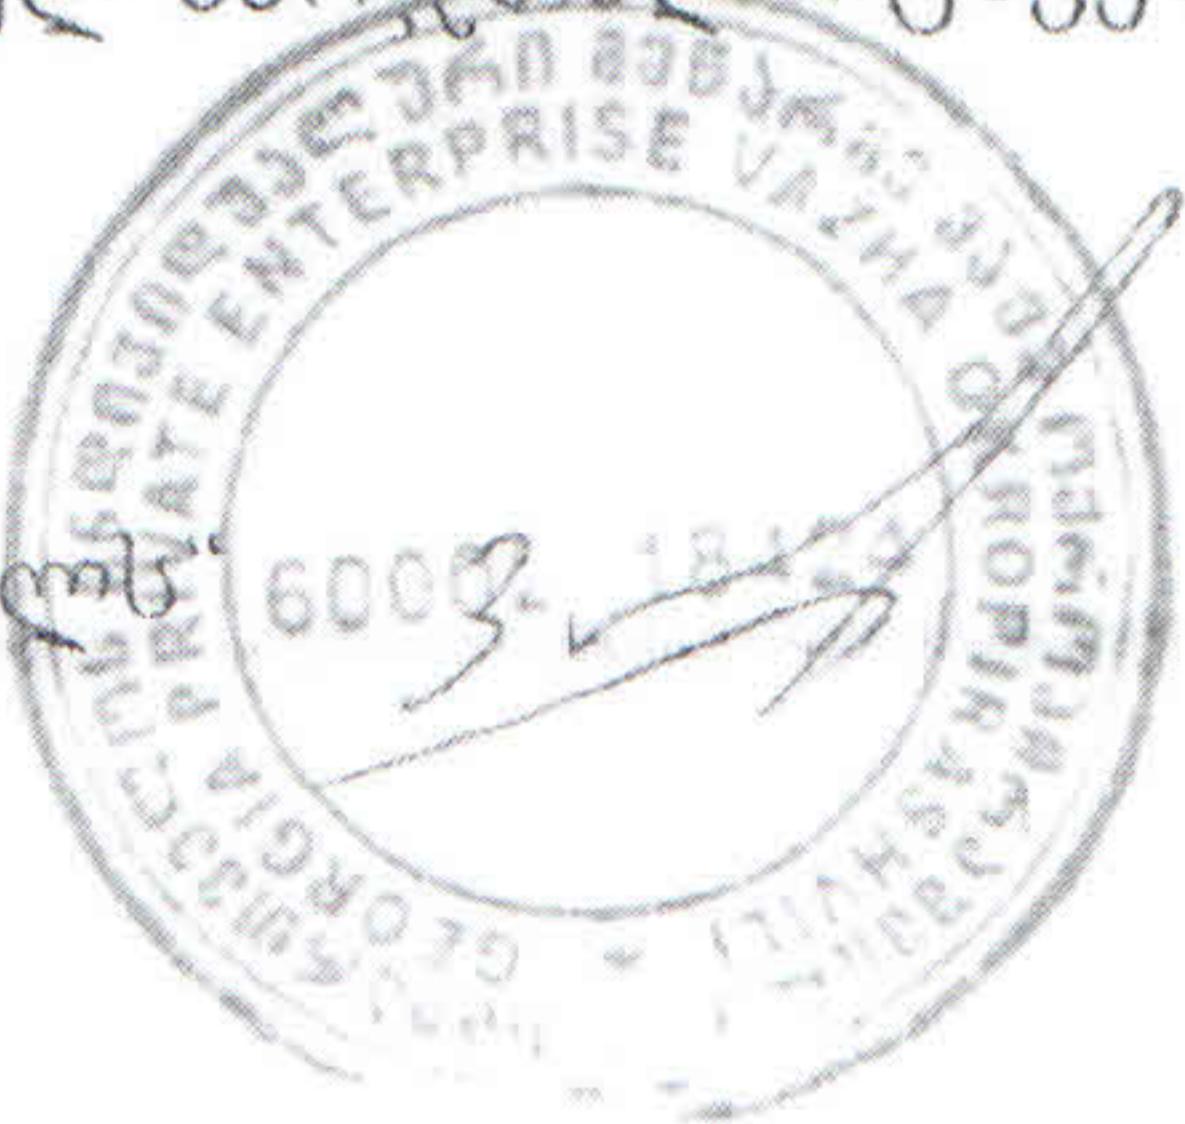

15.06.2018 წ.

ი/გ „ვაჟა ოქროპირაშვილი“



ქ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ. ფოსტა: info@emg.ge

წერილი № გ 821

08 ივნისი, 2018 წელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების
სამსახურის ხელმძღვანელს
ბატონ ბექა ყურაშვილს

ბატონო ბექა,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქ. ქუთაისში მიმდინარეობს „წერეთლის ქუჩის მე-8 ჩიხის, ნინოშვილის ქუჩის მე-13 ჩიხის, თაბუკაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთისა (ეკლესიასთან მისასვლელი გზა) და თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6 და მე-8 ჩიხების ასფალტო-ბეტონის საფარისა და ღვარსადენის მოწყობის სამუშაოები“, რომელსაც ასრულებს შ.კ.ს. „გზამშენი XXI“

მომწოდებელმა მოგვმართა წერილობით, სადაც აღნიშნავ, რომ თაბუკაშვილის ჩიხებში პროექტით გათვალისწინებულია ღია ტიპის ბეტონის სანიაღვრე არხები ზომით 0,30 X 0,50 X 0,15 მეტრი, რომელიც მათთვის ძნელად მოსამიებელია და გვთავაზობს 0,35 X 0,40 X 0,15 მეტრის ზომის არხებს, რომელიც ხარისხობრივად უკეთესია, ვინაიდან იწნებება სპეციფიკური წნევით და გამოირჩევა მაღალი სიმტკიცით.

საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი არ არის წინააღმდეგი აღნიშნული ცვლილებისა, თანხის უცვლელად.

დანართი: ორი ფურცელი

პატივისცემით,

გია ჩანტლაძე

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“
ტექნიკური დირექტორი





თბილისი
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ა. ჭუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ. ფოსტა: info@utu.edu.ge


შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“
ტექნიკურ დირექტორს, ბატონ გია ჩანტლაძეს,
ამავე კომპანიის ტექნიკური ზედამხედველის,
არსენ კველიას

მოხსენებითი ბარათი

ბატონი გია,

როგორც მოგეხსენებათ, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2018 წლის 2 აპრილს გაფორმებული №95 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „გზამშენი XXI“ (ს/კ: 212709498) აწარმოებს, ქ. ქუთაისში, აკ. წერეთლის ქუჩის მე-8 ჩიხის, ნინოშვილის ქუჩის მე-13 ჩიხის, თაბუკაშვილის ქუჩის ზოლო მონაკვეთისა (ევლესიასთან მისასვლელი გზა) და თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6-სა და მე-8 ჩიხების გზის ასფალტ-ბეტონის საფარისა და ღვარსადენის მოწყობის სამუშაოებს. ხელშეკრულების თანახმად, თაბუკაშვილის ქუჩის მე-2, მე-4, მე-6-სა და მე-8 ჩიხებში მოსაწყობია ღია ტიპის ნიაღვარმიმღები ბეტონის ღარები ზომით $0.3 \times 0.5 \times 0.15$ (მეტრი), რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი შპს „გზამშენი XXI“-ის (ს/კ: 212709498) წარმომადგენლებისათვის, აღნიშნული ღარების არ არსებობის გამო, რის შესახებაც კომპანიამ მოგვმართა წერილით და არ ვართ წინააღმდეგნი, აღნიშნული ბეტონის ღარები ჩანაცვლონ განსხვავებული პარამეტრების, კერძოდ $0.35 \times 0.4 \times 0.15$ (მეტრი), იგივე ღარებით, რომელიც ხარისხობრივად უკუთესია, ვინაიდან იწნებება სპეციფიკური პრესით და გამოირჩევა მაღალი სიმტკიცით. ამასთან, აღნიშნული ფაქტი არ იწვევს თანხობრივ ცვლილებას ხარჯთლრიცხვაში

დანართი - 1. ღვარსადენის ესკიზი.

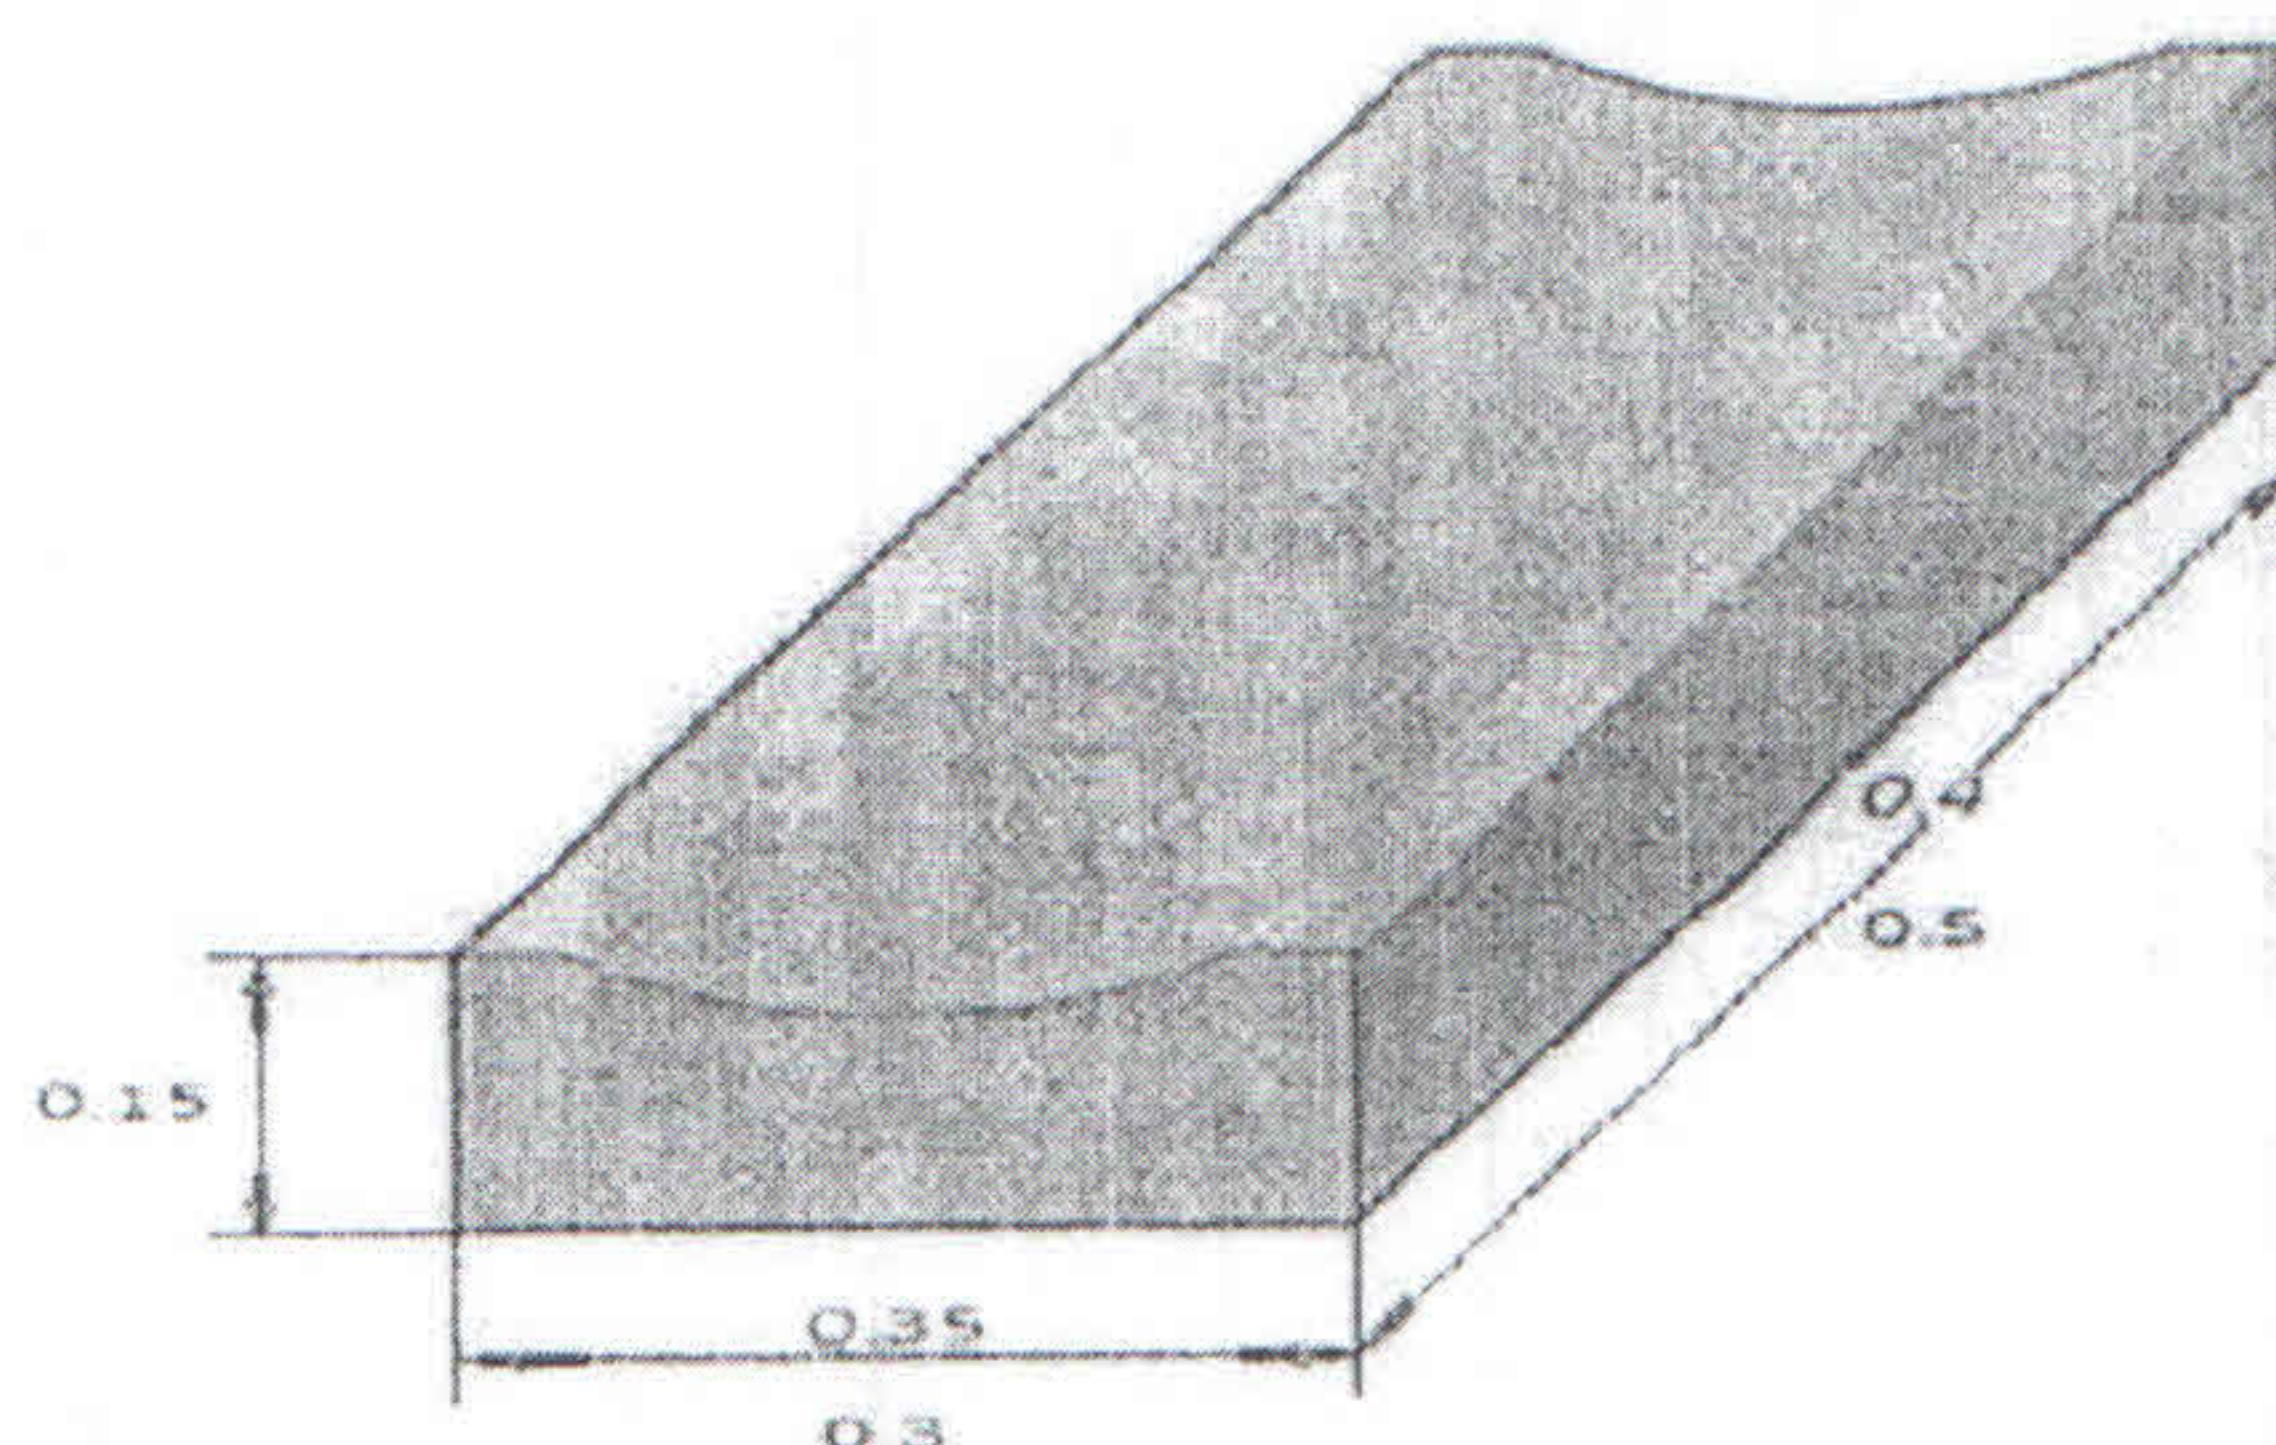

- $0.30 \times 0.5 \times 0.15$ - საპროექტო პარამეტრები.
- $0.35 \times 0.4 \times 0.15$ - ახალი პარამეტრები.

შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“
ტექნიკური ზედამხედველი არსენ კველია

06.06.2018

აპილი 2011 წელი თბილისი

10.3ბაზე



| № | კოდი | სახელი და გვარი | მიმღებელი | მიმღებელის მიზანი | მიმღებელის მიზანი | მიმღებელის მიზანი | მიმღებელის მიზანი |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 182704.30 | აბულია გიორგი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 2 | 35989 64 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 3 | 283142.31 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 4 | 74716.79 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 5 | 75171.00 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 6 | 74345.90 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| 7 | 74030 06 | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი | გრიგორი გრიგორი |
| | 800100.00 | | | | | | |


შესრულებული აქტის გამოყენება

ქალაქ ქუთაისი თაბუკაშვილი ქუჩის II ნობენ ა/ვერტინის საფარით და სანიაზო ქუჯის მთწყვების სამუშავების

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები

| № | სამუშაოს დასახელება | მანქ. | რაოდნობა | მასალა | ხელვალი | გრანატირი და მაქანიზმები | ჯამი | |
|---|--|----------------|----------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | კრთ. | ფასი | კაში | კრთ. ფასი | კაში | კრთ. ფასი | კაში |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | თავი I - დემონტაჟი | | | | | | | |
| 1 | დაზიანებული დალახ-ხერემოვნი მანქრა მექანიზმით სისქით 25 სა გრანტის | გ ³ | 302.250 | | 0.75 | 226.69 | 1.50 | 453.38 |
| 2 | მქანიზმისათვის მიუღიოთმელ აღილებების ხელით დამუშავება | გ ³ | 32.00 | | 8.00 | 256.00 | | 256.00 |
| 3 | გრანტის დაზიანება ა/განქანებაზე და გატანა 10 კ-ზე | გ.6. | 618.36 | | | 4.00 | 2473.44 | 2473.44 |
| | ჯამი თავი I | | | | | | | 3409.50 |
| | თავი II - ა/გეტრინის საფარი | | | | | | | |
| 1 | ტერიტორიაზე დორდის 0-40 მმ ურაქციის საფეხვლის მოწყობა, აშენიდერით დაბრულება და მიტენა სისქით 15 სა მსხვერმატცვლით დაბრულება მკრიფი აზერინისაგან ხაფარის ქადა ვენის | გ ² | 1245.00 | 2.00 | 2490.00 | 0.15 | 186.75 | 0.90 |
| 2 | მოწყობა სისქით 5 სა ცენტრის მისასალელებლით) | გ ² | 1245.00 | 13.80 | 17181.00 | 0.30 | 373.50 | 0.40 |
| 3 | პიტოქის ქრულ სის პესტას | გ. | 0.373 | 11.00 | 410.30 | 50.00 | 18.65 | 30.00 |
| 4 | წერილმარტცვლითი უოროვანი აბეგონისაგან საფარის ყედა ვენის ძირის სისქით 4 სა ცენტრის მისასალელებლით) | გ ² | 1245.00 | 13.10 | 16309.50 | 0.30 | 373.50 | 0.40 |
| | ჯამი თავი II | | | | | | | 39470.89 |
| | თავი III სანიალვრ სისტემა | | | | | | | |
| 1 | სანიალვრ პუტინის დარებისითვის უცნდესებების მოწყობა ბეტონით გ- 300 | გ ³ | 7.000 | 140.00 | 980.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 |
| 2 | დაწერილი სანიალვრ წლის დარები ზომით 0.35X0.40X0.15 (განხილვება მარტბ) | გრ.გ | 310.000 | 15.00 | 4650.00 | 7.00 | 2170.00 | 0.40 |
| 3 | უქრა არსებულ სანიალვრი ქსელში | აღგ. | 2.00 | | | | 50.00 | 100.00 |
| 4 | არსებული სანიალვრი და სანიალვრი ქსელის უდიანობების ამაღლება დამკვეთის მიზრ პიროვნეულ აღილებები | გ. | 8.00 | 250.00 | 2000.00 | 20.00 | 160.00 | 5.00 |
| | ჯამი თავი III | | | | | | | 10819.00 |
| | ჯამი თავი I,II,III | | | | | | | 53699.39 |
| | ულალები ხარჯები | 8% | | | | | | 4295.95 |
| | გაშემაური დაზროვება | 6% | | | | | | 57995.34 |
| | ჯამი | ჯამი | | | | | | 3479.72 |
| | გაუფალისწინებების ხარჯი | 3% | | | | | | 61475.06 |
| | ჯამი | ჯამი | | | | | | 1844.25 |
| | დღი | დღი | | | | | | 63319.32 |
| | სულ ჯამი | | | | | | | 11397.48 |
| | | | | | | | | 74716.79 |

შპს "გასამუნიკა" -ს დირექტორი

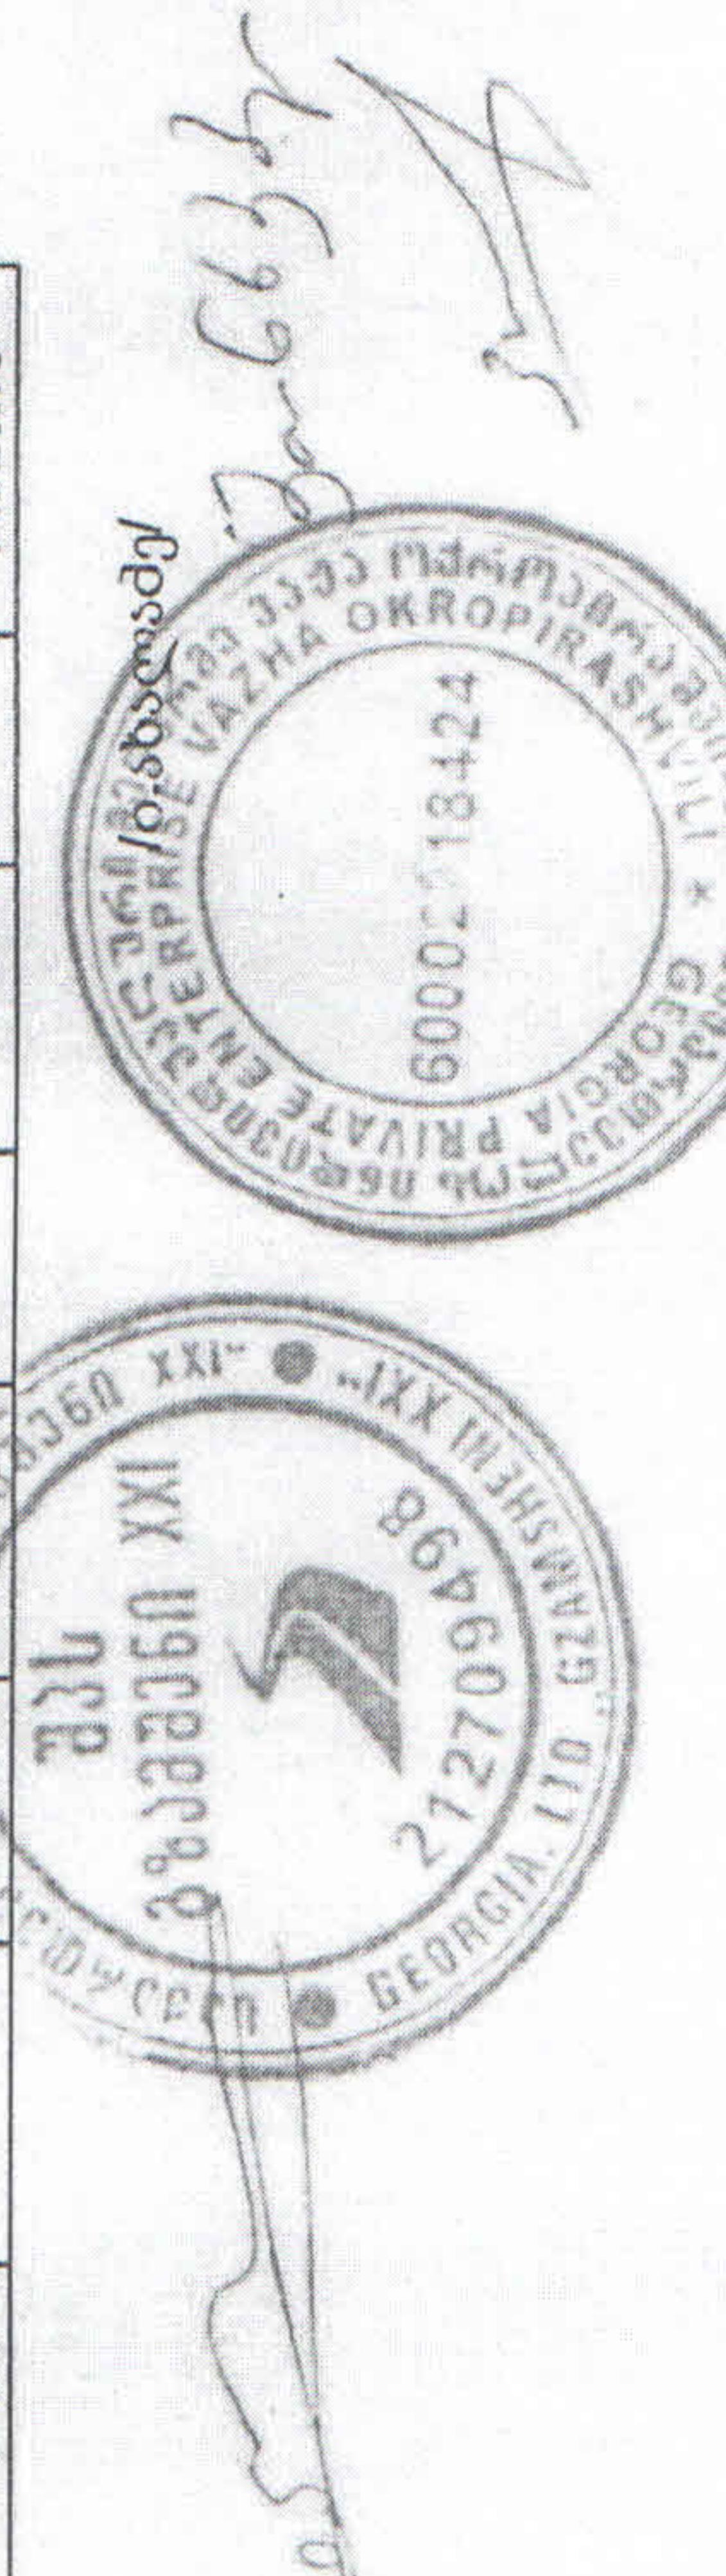

ქალაქ ქუთაისი თაბუკაშვილის ქუჩის IV ნიბის ა/ბეტონის საფარით და სანიტარული ქადაგის მოწყობის სამუშაოების

ვორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები

| № | სამუშაოს დასახელება | განს. კრთ. | რაოდენობა | მასალა | ხელფასი | გრანსირები და მაქანიზმები | ჯაჭვი |
|---|---|----------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | თავი I - დემონტაჟი | | | | | | |
| 1 | დაზიანებული დაღა-ხრუშეშვანი მასის მოჭრა მექანიზმით ხისქით 25 სე | გ ³ | 306.000 | | 0.75 | 229.50 | 1.50 |
| 2 | ექსპოზიციის მაული მოწყობის აღმოსავალი ხელით დაძუშვების გრუნტის | გ ³ | 36.00 | | 8.00 | 288.00 | 288.00 |
| 3 | გრუნტის დაზიანერვა ა/მანქანებებისა და განტანა 10 კ-ტების ჯაჭვითი თავი I | ტ.ნ. | 633.00 | | | 4.00 | 2532.00 |
| | თავი II - აბეტონის საფარი | | | | | | 3508.50 |
| 1 | ტერიტორიაზე დღიდის 0-40 აა ვრცელის საფუტვლის მოწყობა, ანიმოციურით დაპროცესით დამზადებულება და მოტოქნის ხისქით 15 სე სსხვეობაზე ცვლოვანი მეცნიერებისაგან ხაფარის ქადაგი ვანის მოწყობა სისქით 5 სე (ექსტენსის მისახლელებით) | გ ² | 1255.00 | 2.00 | 2510.00 | 0.15 | 188.25 |
| 2 | მოწყობა სისქით 4 სე (ექსტენსის მისახლელებით) | გ ² | 1255.00 | 13.80 | 17319.00 | 0.30 | 376.50 |
| 3 | ბიტუმის ქმედების მოსამა | ტ. | 0.376 | 11.00 | 413.60 | 59.00 | 18.80 |
| 4 | წვრილდან ცვლოვანი ფიროვანი აბეტონისაგან ხაფარის ტექნიკის მოწყობა სისქით 4 სე (ექსტენსის მისახლელებით) | გ ² | 1255.00 | 13.10 | 16440.50 | 0.30 | 376.50 |
| | ჯაჭვითი თავი II | | | | | | 39787.93 |
| | თავი III სანიაღვრუ სისტემა | | | | | | |
| 1 | სანიაღვრებული ბეტონის დარგისათვის ვუნდამენტის მოწყობა ბეტონით მ-300 | გ ³ | 7.00 | 140.00 | 980.00 | 50.00 | 350.00 |
| 2 | დაწარხელი სანიაღვრო წყლის დარგი ზომით 0.35X0.40X0.15 (განათელება მეტრები) | გრ.მ | 306.00 | 15.00 | 4590.00 | 7.00 | 2142.00 |
| 3 | შერდა არსებულ სანიაღვრო ქსელით | აღგ. | 2.00 | | | | 50.00 |
| 4 | არსებული სანიაღვრო და სანიაღვრო ქსელის სელექტორების მაღლება განაწილება საპროცესით ნაშენები ფიროვანი ქსელი ქის თავშების დასაწყობება დამკვეთოს მეტრ მილიმეტრით ადგილზე | ტ. | 8.00 | 250.00 | 2000.00 | 160.00 | |
| | ჯაჭვითი თავი III | | | | | | 10729.40 |
| | ჯაჭვითი თავი I,II,III | | | | | | 54025.83 |
| | ზედნადები ხარჯები | | | | | | 4322.07 |
| | ჯაჭვითი თავი III | | | | | | 58347.90 |
| | განმოური დაგროვება | | | | | | 3500.87 |
| | ჯაჭვითი გარემონტინირებული ხარჯი | | | | | | 61848.77 |
| | ჯაჭვითი გარემონტინირებული ხარჯი | | | | | | 1855.46 |
| | ჯაჭვითი გარემონტინირებული ხარჯი | | | | | | 63704.23 |
| | ჯაჭვითი გარემონტინირებული ხარჯი | | | | | | 11466.76 |
| | ჯაჭვითი გარემონტინირებული ხარჯი | | | | | | 75171.00 |

ეს "გ ზამსტერ XXI"-ს დოკუმენტი

172703498 111 010 0000218424



3.03.2024

ქალაქ ქუთაისი თბილის გამარის ქუჩის VI ნოტი აზერბაიჯანის და სანიაზერ ქუჩის მოწყვეტის სამსახურის

კორუქტირებული ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოს დასახულება | განხ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა | | ხელფასი | გრანატით და მასანი გეგმი | ჯამი |
|---|--|----------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | ერთ. ფასი | ჯამი | | | |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | დაზიანებული დალაბ-ხეჭვები მასის მოტრა მექანიზმით სისქით 25 სა მანქანურისათვის მოუზღომელ აღზიდებში ხელით დამზადება | 3 ³ | 310.000 | | 0.75 | 232.50 | 1.50 | 465.00 |
| 2 | გრუნტის | | | | | 8.00 | 248.00 | 248.00 |
| 3 | გრუნტის დატვირთვა აშანქანებულ და ვატანა 10 კ-ტ-ზე | 86. | 630.00 | | | 4.00 | 2520.00 | 2520.00 |
| | ჯამი თავი I | | | | | | | 3465.50 |
| | თავი II - აზერთნის საფარი | | | | | | | |
| 1 | ბერიტორიაზე დორდის 0-40 კმ ფრაქციის საუზღვლის მოწყობა, ავტოგროვერით დაპროფილება და მომექანიზმით 15 სა მსხვილმარტვლების მკრავი აზერთნისაგან საფარის შედეა უკინოს | 3 ² | 1255.00 | 2.00 | 2510.00 | 0.15 | 188.25 | 0.90 |
| 2 | მოწყობა სისქით 5 სტ ცენტრულ შედეა უკინოს | 3 ² | 1255.00 | 13.80 | 17319.00 | 0.30 | 376.50 | 0.40 |
| 3 | ბიტუმის ემულსიის მოსახვა | 8 | 0.376 | 1100 | 413.60 | 50.00 | 18.80 | 30.00 |
| 4 | წვრილობრივი გორიფანი აზერთნისაგან ხავარის ზედა ვენის მოწყობა სისქით 4 სტ ცენტრულ შედეა უკინოს | 3 ² | 1255.00 | 13.10 | 16440.50 | 0.30 | 376.50 | 0.40 |
| | ჯამი თავი II | | | | | | | 39787.93 |
| | თავიIII სანიაზერი სისტემა | | | | | | | |
| 1 | სანიაზერი ბერთნის დარბისათვის ფუნდამენტის მოწყობა ბეტონით გ- 300 | 3 ³ | 7.00 | 140.00 | 980.00 | 50.00 | 35.00 | 1575.00 |
| 2 | დაწესებილი სანიაზერი წყლის დარცემი ზომით 0.35X0.40X0.15 (განაოილება გეირტი) | 3 ³ | 15.00 | 4590.00 | 7.00 | 2142.00 | 0.40 | 122.40 |
| 3 | შესრულებულ სანიაზერი სულ შე არასტული საემალოზაციო და სანიაზერი ჰესის უფრაძლევების ამაღლება გამოირტება საპროექტო ნიშნულებით (კვეთი ჰესი თაშიბის დასაწყიბება დამტკიცებულ მუქ მოთოფტელ აღზიდებული ელექტროსის | აღგ. | 2.00 | | | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | გამოირტება საპროექტო ნიშნულებით (კვეთი ჰესი თაშიბის დასაწყიბება დამტკიცებულ მუქ მოთოფტელ აღზიდებული ელექტროსის | 3- | 6.00 | 250.00 | 1500.00 | 20.00 | 120.00 | 5.00 |
| | ჯამი თავი III | | | | | | | 10179.40 |
| | ჯამი თავი I,II,III | | | | | | | 53432.83 |
| | ზედნადები სარჯები | | | | | | | 4274.63 |
| | ჯამი | | | | | | | 57707.46 |
| | გამოირტება დაგროვება | | | | | | | 3462.45 |
| | ჯამი | | | | | | | 61169.90 |
| | გაუფალისწინებული ხაზი | | | | | | | 1835.10 |
| | ჯამი | | | | | | | 63005.00 |
| | დღი | | | | | | | 11340.90 |
| | სულ ჯამი | | | | | | | 74345.90 |

ეპს "გზამშენიშვნა" დირექტორი

XX

GEORGIA PRIVATE OKROPIRAS

212709490




ქალაქ ქუთაისი თაბუანი საფარის ქუჩის VIII ნობის ა/ბეტნის საფარით და ხანიაზე ქაშვების მოწყობის სამუშაოების

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოს დასახელება | განხ. ერთ. | რაოდენობა | გასახდა | ხელვახი | გრანატები და აქტინუმები | ჯამი |
|---|--|----------------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | თავი I - ღემონტაჟი | | | | | | 13 |
| 1 | დაზიანებული დაღა-ხრულებაზე მასის მოჭრა მქანიზმით სისქით 25 სე | გ ³ | 310.000 | 0.75 | 232.50 | 1.50 | 465.00 |
| 2 | მუქანიზმით მიუვალებულ აღვილებაზე ხელით დაშვებული | გ ³ | 31.00 | 8.00 | 248.00 | | 248.00 |
| 3 | გრუნგის დატვირთვა ა/მანქანებზე და გატანა 10 კბ-ზე | ტნ. | 630.00 | | | 4.00 | 2520.00 |
| | ჯამი თავი I | | | | | | 3465.50 |
| | თავი II - ა/ბეტნის საფარი | | | | | | |
| 1 | ბერიტორიაზე ღრღლის 0.40 მმ ურაქციის საფუძვლის მოწყობა, ავტომობილთ დაპრივილება და მოტექანიკური სისქით 15 სა | გ ² | 1255.00 | 2.00 | 2510.00 | 0.15 | 188.25 |
| 2 | შესველმარცვლებრივი მკვრივი ანგარისავან საფარის ქადა გენის მოწყობა სისქით 5 სა (ეზოების მისასვლელებით) | გ ² | 1255.00 | 13.80 | 17319.00 | 0.30 | 376.50 |
| 3 | ბიგუმის ჩეულსის მოსახმა | ტ | 0.376 | 11.00 | 413.60 | 50.00 | 18.80 |
| 4 | წვრილი ცვლილობაზე ურიცოვანი აზისტინაგან ხაფარის ზედა გენის მოწყობა სისქით 4 სა (ეზოების მისასვლელებით) | გ ² | 1255.00 | 13.10 | 16440.50 | 0.30 | 376.50 |
| | ჯამი თავი II | | | | | | 39285.93 |
| | თავიIII-სანიაღვრე სისტემა | | | | | | |
| 1 | სანიაღვრე ბეტნის დარემისათვის ფუნდაციების მოწყობა ბეტნით გ. 300 | გ ³ | 7.00 | 140.00 | 980.00 | 50.00 | 350.00 |
| 2 | დაწესებით სანიაღვრის წყლის დარტყმი ზომით 0.35X0.40X0.15 (კანტიმილეტი, მატრიცა) | გრძ,მ | 306.00 | 15.00 | 4590.00 | 7.00 | 2142.00 |
| 3 | შეკრა არსებულ სანიაღვრე ქელში | აღგ. | 2.00 | | | | 50.00 |
| 4 | არსებულ სანიაღვრე ცილი და სანიაღვრე ქელის ზედამომავალის მაღლები, გასწორება საპროექტო ნაწელებაზე (მექანიკური ტექნიკური დასაწყიბების დამტკიცება) დამტკიცება მოქრ მითომეტელ აღზოლების | ტნ. | 7.00 | 250.00 | 1750.00 | 20.00 | 140.00 |
| | ჯამი თავი III | | | | | | 10454.40 |
| | ზედნაღები ხარჯები | | 8% | | | | 53205.83 |
| | მასიური დაგროვება | | 6% | | | | 4256.47 |
| | გაუზალისწინებული ხარჯი | | 3% | | | | 57462.30 |
| | დღე | | 18% | | | | 3447.74 |
| | სულ ჯამი | | | | | | 60910.03 |
| | | | | | | | 1827.30 |
| | | | | | | | 62737.34 |
| | | | | | | | 11292.72 |
| | | | | | | | 74030.06 |

ეპს "გზამშენიშვილი"-ს დირექტორი

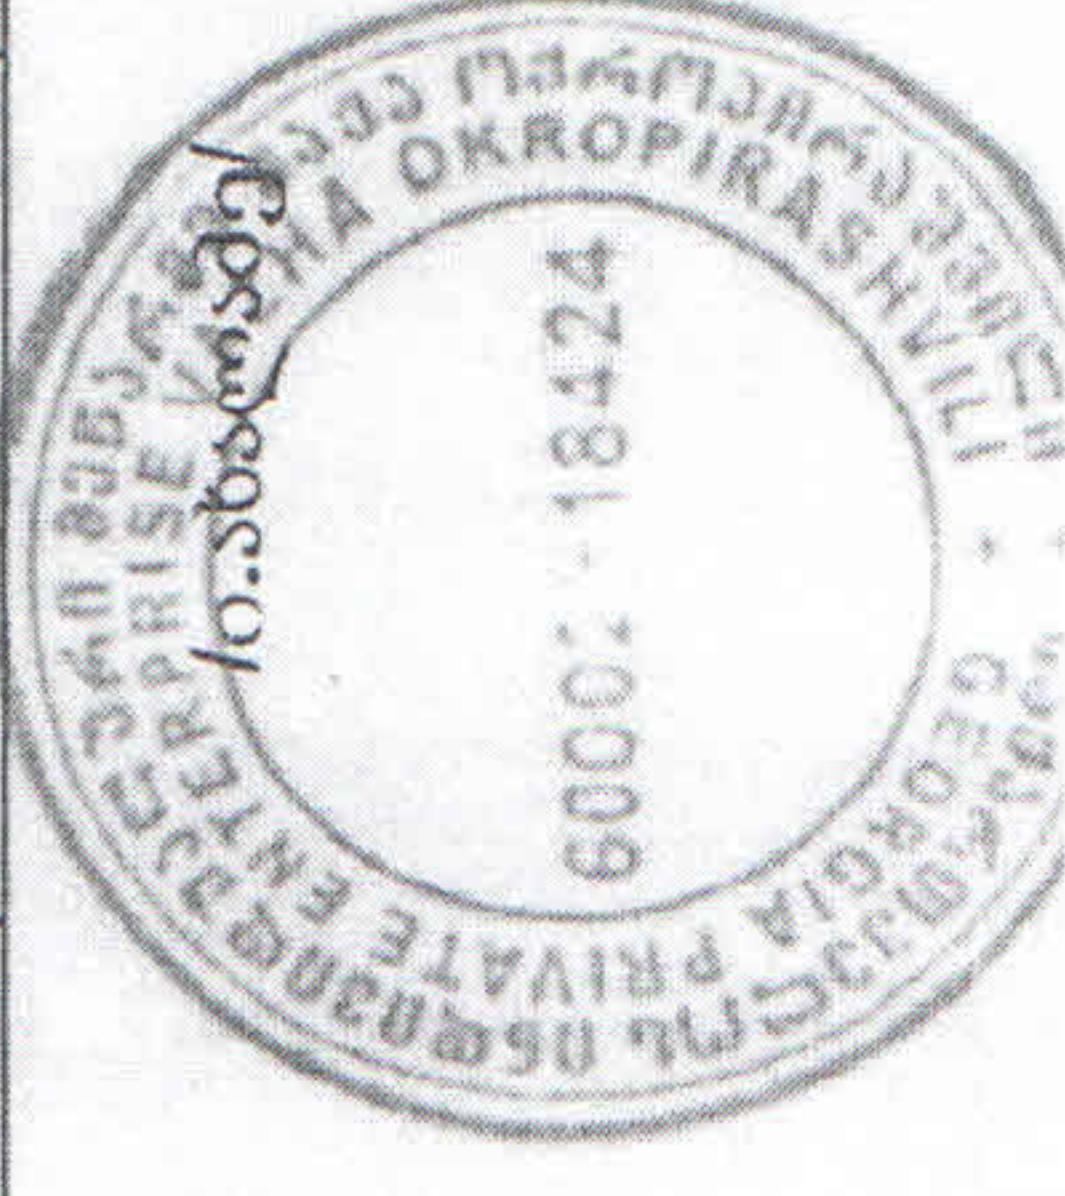

Georgian
Private
Enterprise
OKROPIRASHVILI
60002-18424
