

დანართი-შეთანხმება №1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს „ჯეო როუდ ინვესტს“ შორის
2018 წლის 28 მარტს დადებული №90 ხელშეკრულებაზე

ქ. ქუთაისი

22 ივნისი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT180002112 აუქციონის გარეშე ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.კ.ს „ჯეო როუდ ინვესტს“ შორის, 2018 წლის 28 მარტს დაიდო №90 ხელშეკრულება 320996,48 (სამას ოცი ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და ორმოცდარვა თეთრი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში, ბელიაშვილის და გუნიას ქუჩების გზის ბეტონით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად.

შ.კ.ს „ჯეო როუდ ინვესტი“-ს 2018 წლის 31 მაისის №39 (№14267/01 31.05.2018 წ.) და 18 ივნისის №48 (№16035/01 18.06.2018) წერილების, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის 2018 წლის 21 ივნისის №7467-01 მომართვის, საპროექტო ორგანიზაციის, შ.კ.ს. „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“-ს 2018 წლის 13 ივნისის №49/2018 და შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს 2018 წლის 21 ივნისის №გ941 წერილების საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული 2018 წლის 28 მარტს დადებული №90 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2 (ორი) ობიექტიდან 1 (ერთი) ობიექტზე ქალაქ ქუთაისში, გუნიას ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-9 მუხლის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა 25125,04 (ოცდახუთი ათას ასოცდახუთი ლარი და ოთხი თეთრი) ლარით ანუ 7,827 %-ით

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი ჭილვარიას სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170, ტელ: 24-54-54) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.კ.ს „ჯეო როუდ ინვესტი“, მისი დირექტორის, რევაზ ჩირაძის სახით (მისამართი: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. № 139/31 ტელ: 577 42-42-85, ს/კ 412716226) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2018 წლის 28 მარტს დადებული №90 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2 (ორი) ობიექტიდან, 1 (ერთი) ობიექტზე ქალაქ ქუთაისში, გუნიას ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების მე-9 მუხლის გათვალისწინებით მოხდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა 25125,04 (ოცდახუთი ათას ასოცდახუთი ლარი და ოთხი თეთრი) ლარით. (თან ერთვის)

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2018 წლის 28 მარტს დადებული №90 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: 346121,52 (სამასორმოცდაექვსი ათას ასოცდაერთი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარს.

3. დანართი შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2018 წლის 28 მარტს დადებული №90 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი
(შემსყიდველი)

რევაზ ჩირაძე
შ.კ.ს „ჯეო როუდ ინვესტი“-ის დირექტორი
H. J. CHIRAZ
GRI
(მიმწოდებელი)
412716226
GEO ROAD INVEST

მ. გ. მ. გ.

ა. ა. ა.

კ. კ.



საქართველო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური
GEORGIA



Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality

4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaisisinfrastructura@gmail.com

N 7467-01
21/06/2018

7467-01-3-201806211654



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
მერის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი იობაშვილს

ბატონო გიორგი,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „ჯეო როუდ ინვესტის“ შორის 2018 წლის 28 მარტს გაფორმებული №90 ხელშეკრულების შესაბამისად, გათვალისწინებულია ბელიაშვილის ქუჩის და გუნიას ქუჩის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა ღვარსადენთან ერთად.

გუნიას ქუჩაზე, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების პროცესში, გამოიკვეთა გაუთვალისწინებელი გარემოება, წყლით გაჯერებული, მოძრავი გრუნტი.

საპროექტო და საზედამხედველო ორგანიზაციების პოზიციების გათვალისწინებით, ჩვენს სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია, ხელშეკრულების 9.4 პუნქტის შესაბამისად, ორგანიზაციამ სამუშაოების წარმოებისას იხელმძღვანელოს გაზრდილი ღირებილების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით (ხელშეკრულების საწყისი ღირებულება 320 996,48 ლარი, კორექტირებული ღირებულება 346 121,53 ლარი)

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს გააფორმოს შესაბამისი დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

სამართლებრივი

3.6 "XOMM 6038 0630180"

д. ГАЗОВОЕ, КУЛЬТОВЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО №139. №131
Факс/телефон: (0431) 26-74-37
577 42-42-85

Nº 39

„31“ abob 2018 8

ქალაქ ჭუტაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბატონ გორგი ჭილვარიას

ბატონიშვილი,

როგორც მოგეხსენებათ შვილის როვები ინვესტიციების და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს წერის 2018 წლის 28 მარტს გაფორმდა #90 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბელიაშვილისა და გუნიას ჭუჩებზე ბეტონის გზის სამუშაოების წარმოებას, ღვარსადენთან ერთად.

კუნიას ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობის ხარჯთაღრიცხვის 1-2 პუნქტები ითვალისწინებდა ზედმეტი გრუნტის მოჭრას საშუალოდ 35სმ სისქით. არსებულ პროექტს არ ვაჩნია გეოლოგიური დასკვნა. ვინაიდან გაგვაჩნდა გარკვეული გამოცდილება(ქაჩელის და ფურცელაძის ქუჩები) და ინფორმაცია აღნიშნულ უბანში მდებარე ქუჩებზე არსებული დაჭაობებული გრუნტის არსებობის შესახებ, ჩვენი კომპანიის მიერ არაერთი ზეპირი შემოთავაზებისა რომ მომხდარიყო პროექტში ივლილება და არ მოჭრილიყო საშუალო სისქი 35სმ, თქვენი დაკინებული მოთხოვნის მიხედვით განხორციელდა გრუნტის მოჭრის სამუშაოები პროექტის შესაბამისად, გრუნტის მოხსნის შედეგად, როგორც მოსალოდნელი იყო გამოჩნდა მოძრავი გრუნტი(იხ). დანართი ფოტოკოლაჟი), რომელიც ასევე გაჯერებულია კანალიზაციის წყლებით, რომლებიც გამოდის მოსახლეობიდან, ვინაიდან ამ ქუჩაზე არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა და ხდება მოსახლეობიდან გამომავალი საყოფაცხოვრებო წყლის ქვეში პირდაპირ ქუჩაში. ამ დროისათვის არსებული სფრუაცია აღ იძლევა საშუალებას იწარმოოს მომდევნო სახის სამუშაოები და დაიგოს შეტონის გზა. შესაბამისად პროექტი შენერებულია იმ დრომდე სანამ არ მოხდება არსებოლი სიტუაციის შესწავლა და გადამწყვეტი ზომების მიღება.

მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, თუ გამოყონდება რომ დაგეგმილი სამუშაოების კვლეული სამუშაოს განხორციელებისთვის არ არის საჭირო დოკუმენტია, მიმწოდებელი კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისთვის არ არის საჭირო დოკუმენტია, მიმწოდებელი კალდებულია სათანადო დოკუმენტების მომზებამდე შეაჩეროს კონკრეტული სამუშაოების კალდებულია სათანადო დოკუმენტის გაცნობებით გაცნობებით, რომ გამომდინარე იძებან რომ კანხორციელება. აღნიშნულის გათვალისწინებით გაცნობებით, რომ გამომდინარე იძებან რომ კანხორციელება. აღნიშნულის გათვალისწინებით გაცნობებით გაცნობებით, რომ გამომდინარე იძებან რომ კანხორციელება. აღნიშნულის გათვალისწინებით გაცნობებით გაცნობებით, რომ გამომდინარე იძებან რომ კანხორციელება. აღნიშნულის გათვალისწინებით გაცნობებით გაცნობებით, რომ გამომდინარე იძებან რომ კანხორციელება.

მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი შეისაბამება არსებულ სიტუაციას, ვინაიდან პრაქტიკულად შექმნებულია ხელშეკრულების გაფორმებული მიზნის მიღწევა არსებული პროექტის მიხვდვით.



გაცნობებით, რომ არსებული ხიტუაციიდან გამომდინარე, იძულებულები გავადით შეგვერდნა სამუშაოები მიმდინარე ჩლის 15 მაისიდან, რის ფარბაზე დაუკუპნებოდ ინტერიერის მერის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, ისე ას „საინიციაციო მონიტორინგის“ წარმომადგენელს, აღნიშნული პერიოდი უნდა იქნას გათვალისწინებული ხელშეკრულების ვალიდების დროს. გთხოვთ შეისწავლოთ აღნიშნული საკითხი და პროექტის ავტორთან შეთანხმებით მოხდეს შესაბამისი ვლილებების განხორციელება, რაც მოგვიან სამუშაოების გაგრძელების შესაძლებლობას.

დანართი: ფინანსურა - 2 გუნდები

ձեմ „Հայոց Ռուսա օնքավորություն“-ի

መስቀል ከዚህ:

1426701
31.05.200

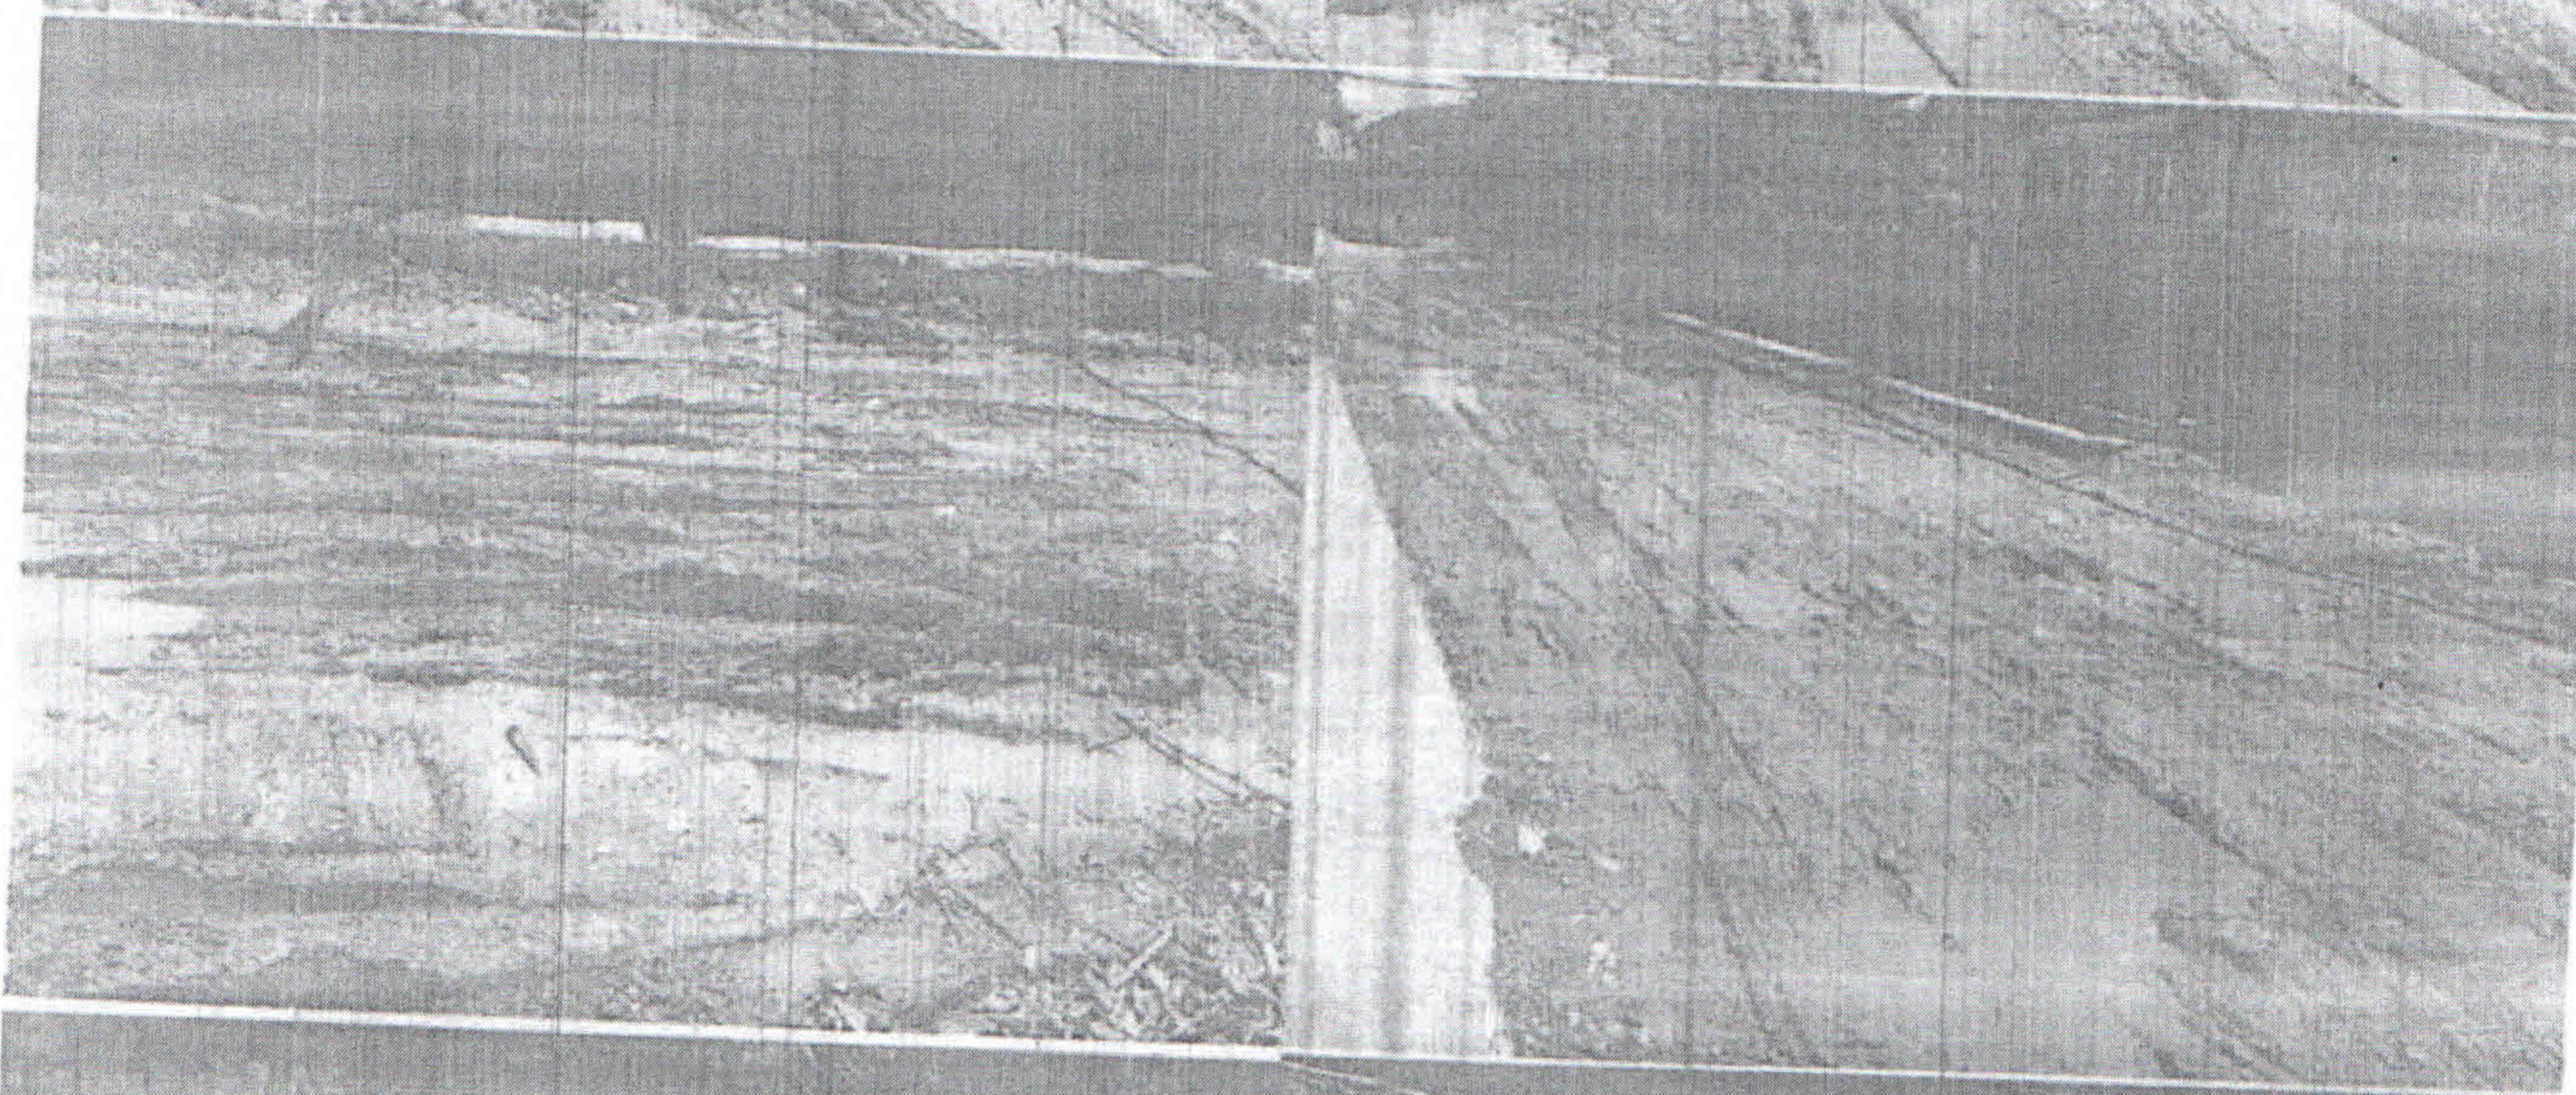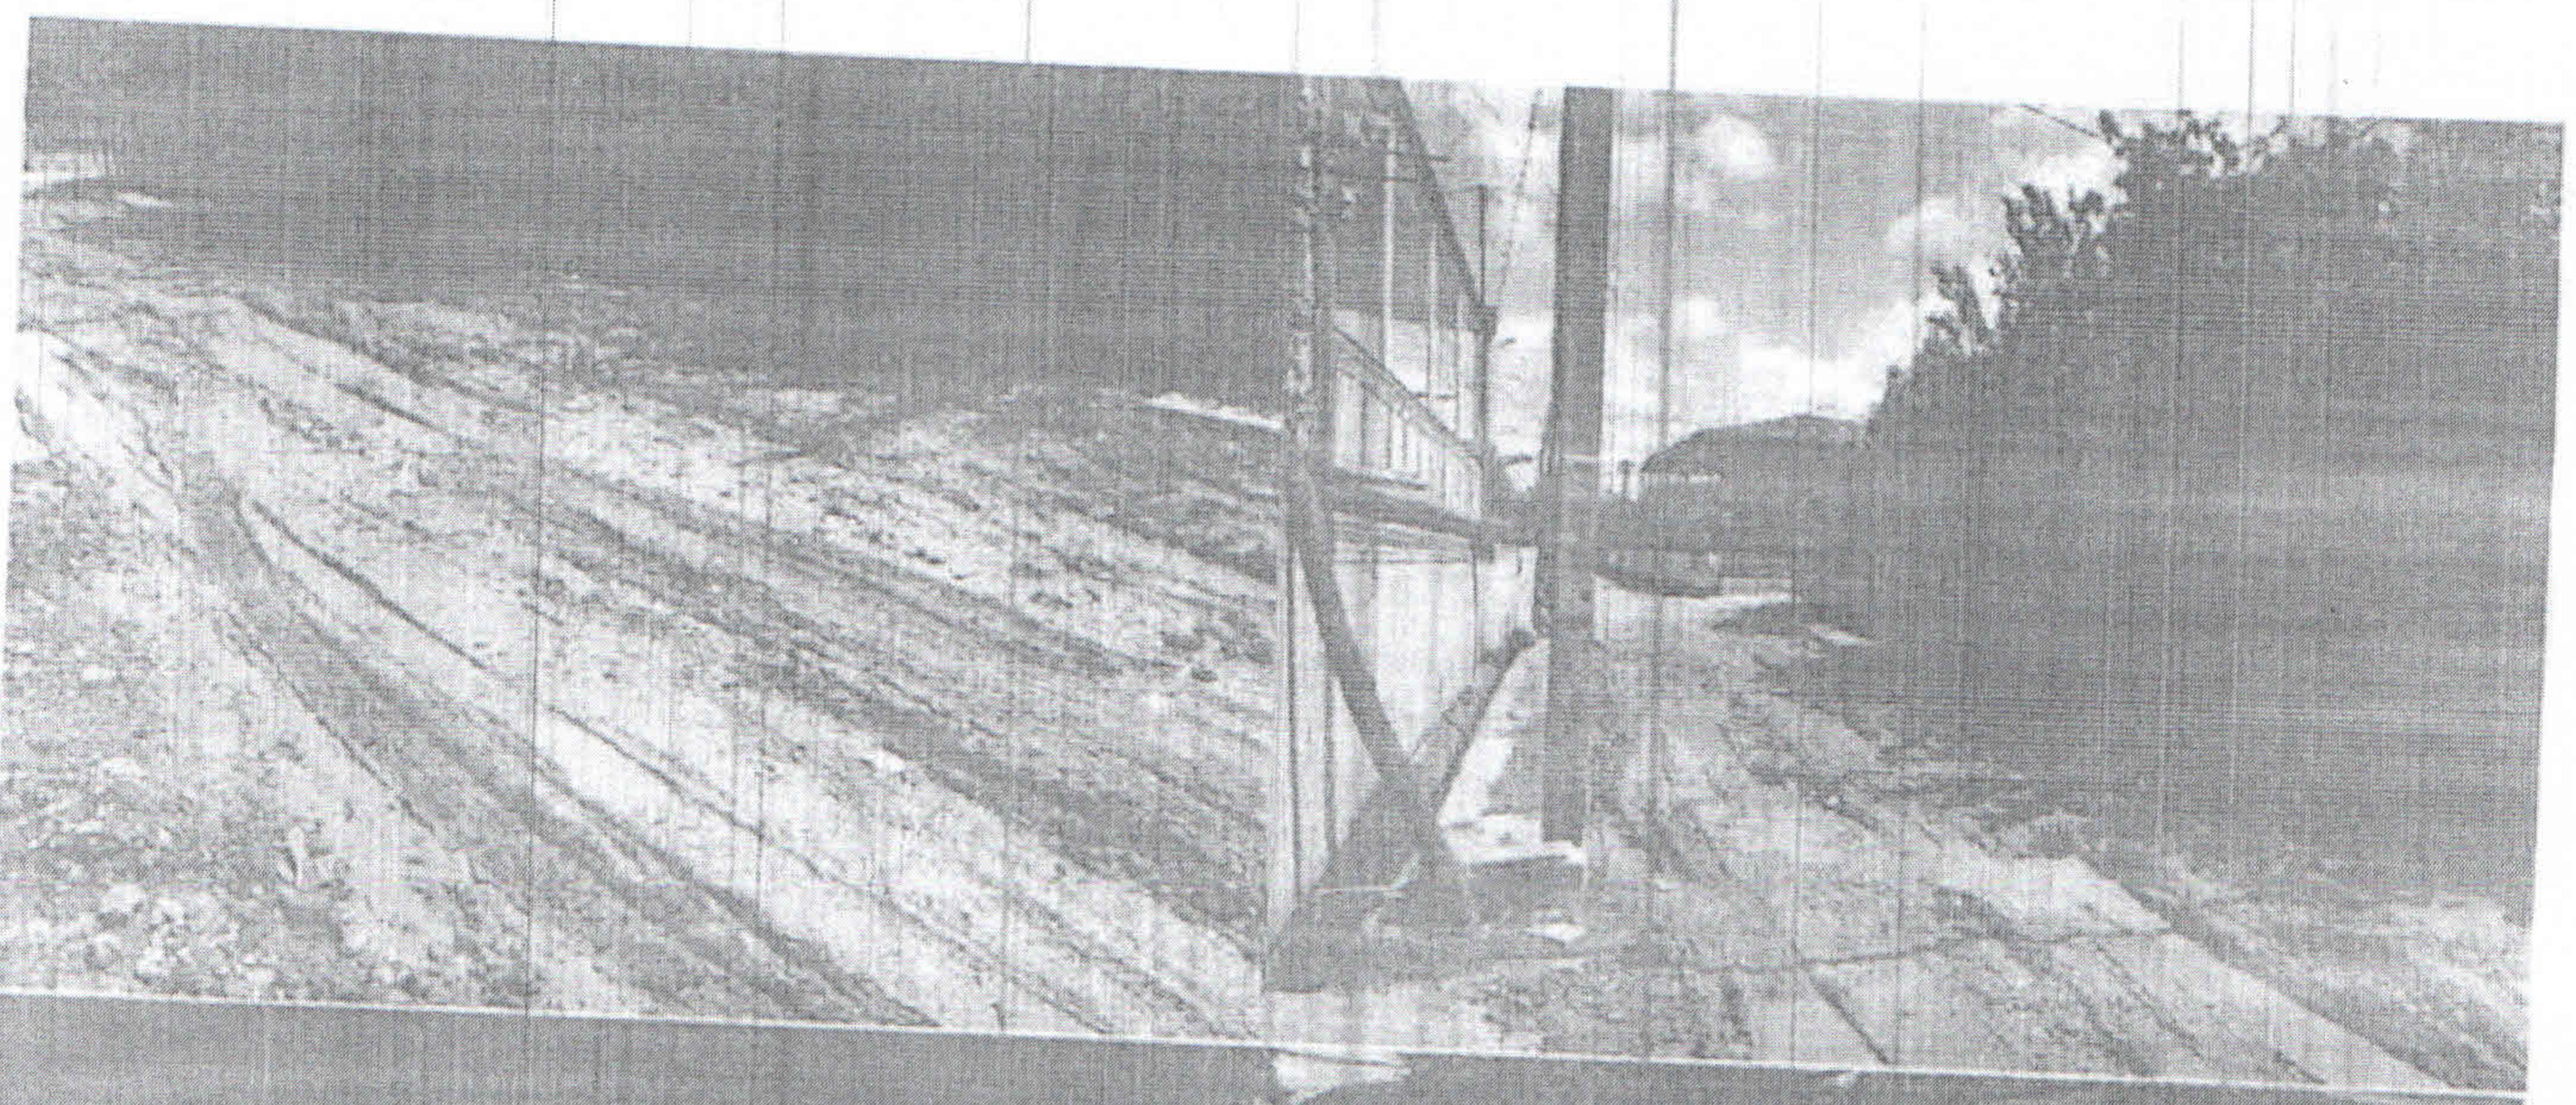



საქართველო

მ. პ. ს “ჯეო როუდ ინვესტი”

ა. ქათაისი, რუსთაველის ბაზირი №139, ბ31
ტელ/ფაქ: (0431) 26-74-37
577 42-42-85

№ 48

„18“ ივნისი 2018 წ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის
უფროსს ბატონ ბექა ყურაშვილს

ბატონო ბექა,


თქვენი 14.06.2018 წლის #01/14152 წერილის პასუხად გიგზავნით განფასებულ
კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას(იხ. დანართი). აღნიშნული ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია
საპროექტო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მოცულობების მიხედვით. თუმცა ჩვენს მიერ
მოხდა მისი მცირედი კორექტირება იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ არსებული ნახაზის
მიხედვით პვ0+00-დან პვ1+00-მდე მონკვეთში უკვე არსებობს ბეტონის საფარი, რომელიც არ
საჭიროებს დემონტაჟს. აღნშნულის შესახებ თქვენთვის ცნობილია ინფორმაცია.

გთხოვთ განიხილოთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და
თანხმობის შემთხვევაში გავაფორმოთ დანართი შეთანხმება.

დანართი: კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა - 2 ფურცელი

მცს „ჯეო როუდ ინვესტი“-ს


დირექტორი:

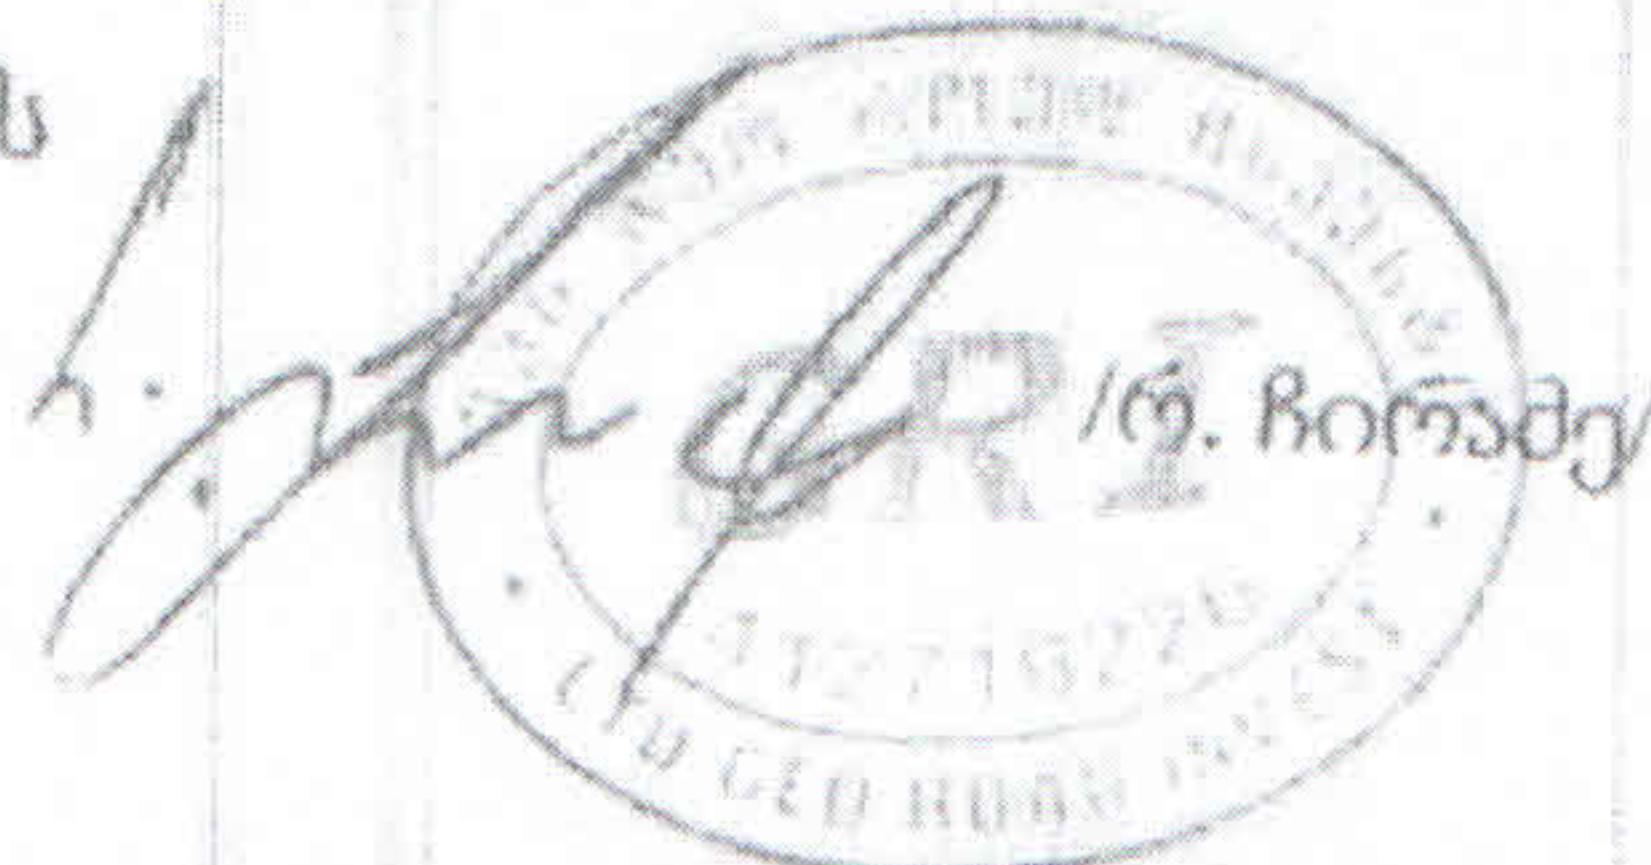

16035/01

18.06.2018.

შპს „სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრი“

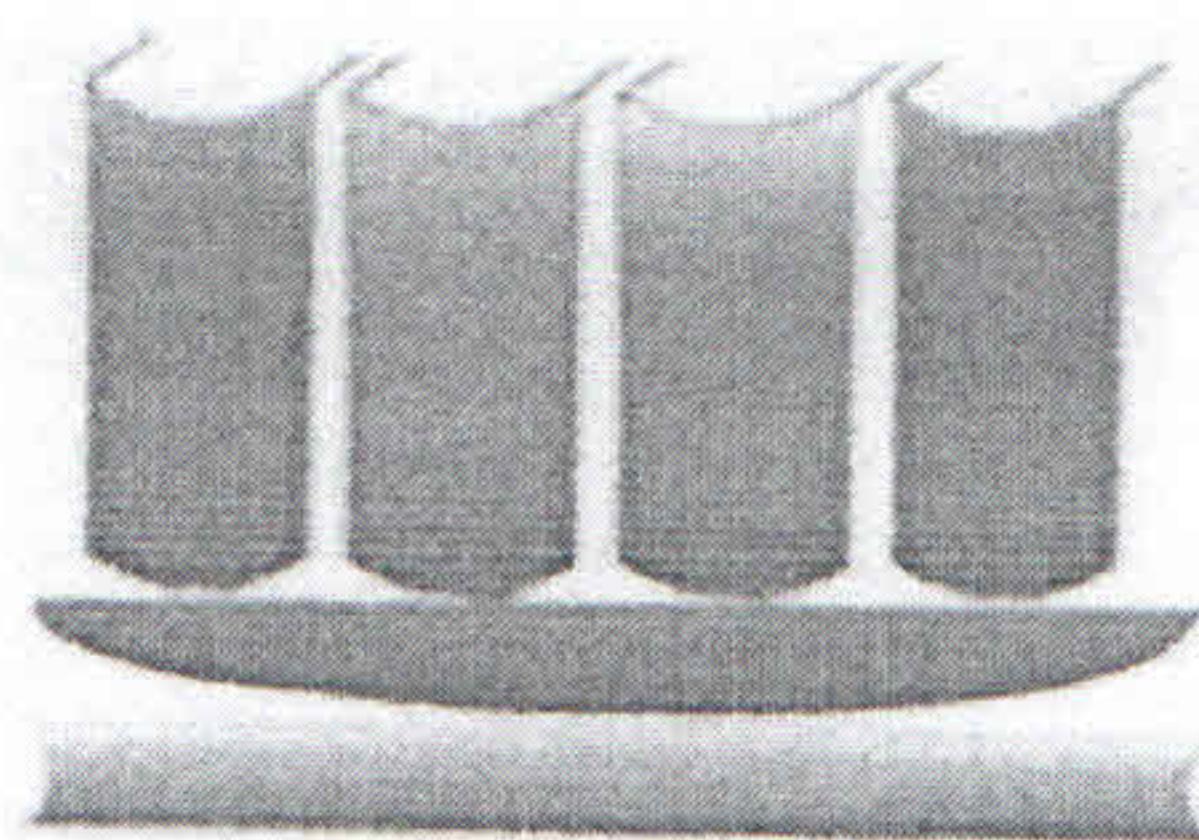

№49/2018

13 ივნისი, 2018 წ.

ქ.ქუთაისი, 9 აპრილის ქ.№10

samartlebrivi.analizi@gmail.com

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და
დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელს
ბატონ ბექა ყურაშვილს

ბატონო ბექა,

თქვენი, 2018 წლის 07 ივნისის №01/13595 წერილის პასუხად გეგზავნებათ,
ქ.ქუთაისში, გუნიას ქუჩის გზის საფარით მოწყობის სამუშაოების კორექტირებული
ხარჯთაღრიცხვა.

დანართი: „06“ ფურცლად;

პატივისცემით,

დირექტორი:

/ ნინო მუმლაძე/

№	№	აღმოჩენის დარღვეული	განაკვეთის ერთეული	რაოდენობა	გასაღი			ხელფასი			ტრანსპორტის და გაქცევის განაკვეთი	
					ერთ. გასაღი	ჯამი	ჯამი	ერთ. გასაღი	ჯამი	ერთ. გასაღი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	27-10-1.	საბურთვის ესაჲ. თვეთმეტედი გვლივი 5 გ.6. საბურთვის ესაჲ. თვეთმეტედი გვლივი 10 გ.6. მოსახლეების მანქანის 6000 ლ.	გ/სით.	0.0076	18.19							
5	51-6-1	ამავე ამავე გარემოს და გამოიყენეთ 10 გ.6. ამავე ამავე გარემოს და გამოიყენეთ 1-თავის განაკვეთის მიზანისას	გ/სით.	0.0074	17.71							
4	27-10-1.	დეველოპმენტის მდგრადი 139 კბ.მ. ნაკრების ესაჲ. თვეთმეტედი 18 გ.6. ნაკრების ესაჲ. თვეთმეტედი 10 გ.6. მოსახლეების მანქანის 6000 ლ.	გ/სით.	0.00269	102.66	6.44						
5	27-10-1.	სამრის 0.40 გვ. მოწყობა სისტემის 5 წელ დაშვებით საბურთვის და გარემოს მოწყობა 18 გ.6. საბურთვის და გარემოს მოწყობა 10 გ.6. საბურთვის და გარემოს მოწყობა 6 წელის შემდეგის 6000 ლ.	გ/სით.	0.00041	0.98	18.19	0.0074	17.71	3.54	18.19	17.71	
			გ/სით.	0.1862	445.58			0.011	26.32			
			გ/სით.	0.011	26.32							
			გ/სით.	0.0429	102.66							
			გ/სით.	0.00269	6.44							
			გ/სით.	0.00041	0.98							
			გ/სით.	0.0076	18.19							
			გ/სით.	0.0074	17.71							
			გ/სით.	0.00148	3.54							
			გ/სით.	0.0622	148.84							
			გ/სით.	0.011	26.32							


ვადე

N	გაფრთხების ნომერი	სამუშაოს დასახლება	განვა. ერთო.	ნირჩების ერთულება	რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	გრანული და განაზღები	ჯანმრთელი და განაზღები			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-სანიაღვრე არსები												
1	გა. 46-24-2	ქვედა სანიაღვრე ბეტონის არსებისა და ეზოუბის ქესაცლელებების არსების გადახურვის ფილტრების დაწყრევა პროცესი რეალისტიკი	მ^3		61.320							
2	1-17-3	მანქანური არსებისათვის მიწის მოჭრა მუქანიზმით ჩაღრმავებით საშუალებით $H=0.85 \text{ მ}$ პროცესი რეალისტიკი აქტივურო 0.65 მ^3 ბეჭდოური 79 კვტ.	$\text{მ}^3/\text{ლო}$	8.8	539.62							
3	1-64-3	სანიაღვრე არსებისათვის მოჭრა მუქანიზმით ჩაღრმავებით პროცესი რეალისტიკი	მ^3	4.8	294.34							
4		გრუნტის დამზადება ხელით გატანა 10 კბ-ზე	მ^3		348.160							
5	27-7-2,	ქვეშა ხერეშოვანი მოსამაღალებელი ზენის მოწყობა ბეტონის სანიაღვრეს მიღებისათვის სისქით 10 სე პროცესი რეალისტიკი ავტომატური 79 კვტ სატემპო 18 ტნ სპეციალური ქვეშა ხერეშონი ტრანსპორტირების 15 ტ	მ^3	0.6	1.85	821.95						
6	გა. 6-3-1.	სანიაღვრე არსების ბეტონის მიზის მოწყობა 3-250 პროცესი რეალისტიკი სხვა მანქანური ბეტონი 3-250 (ტრანსპორტირებისთვის) ყალიბის ფარი დახვრისადი ნუ-ჭახალი	მ^3		35.840							

N	მდგრადი N	სამუშაოს დასახელება	გასაძლიანობა	ხელფასი	გრანიტითი და გაჭავები		
					განაკვეთის ერთობელი	რაოდენობა	ერთ. ფასი
1	2	სახელის მიხედვით	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	4	5	6
1	3	სახელის მიხედვით	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	4	5	6
7	6-11-1.	სანიციური ერთეული ბაზების კლილების მოწყობა მ-250	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	0.28	15.053	61.440
8	7-26-8	სანიციური სამუშაო 25 გ.	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	0.117	1.15	1.15
9	23-23-1	სანიციური სამუშაო 100X70X8	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	0.3	145.50	32.00
10	23-4-3,	სანიციური სამუშაო 800X400	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	485.00	6.816
11	27-51-13-14	სანიციური სამუშაო 500X300	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	26.00	0.213
		სანიციური სამუშაო 500X300	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	30.940	0.0698
		სანიციური სამუშაო 500X300	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	8.710	0.335
		სანიციური სამუშაო 500X300	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	25.87	0.995
		სანიციური სამუშაო 30 სა	განაკვეთის ერთობელი	განაკვეთის ერთობელი	1	30.72	0.0317
		(1024X0.3X0.1=30.72)					0.97
		სანიციური სამუშაო					0.11
		სანიციური სამუშაო					0.01
		სანიციური სამუშაო					0.03
		სანიციური სამუშაო					3.81

六

/ 3. Xylophone

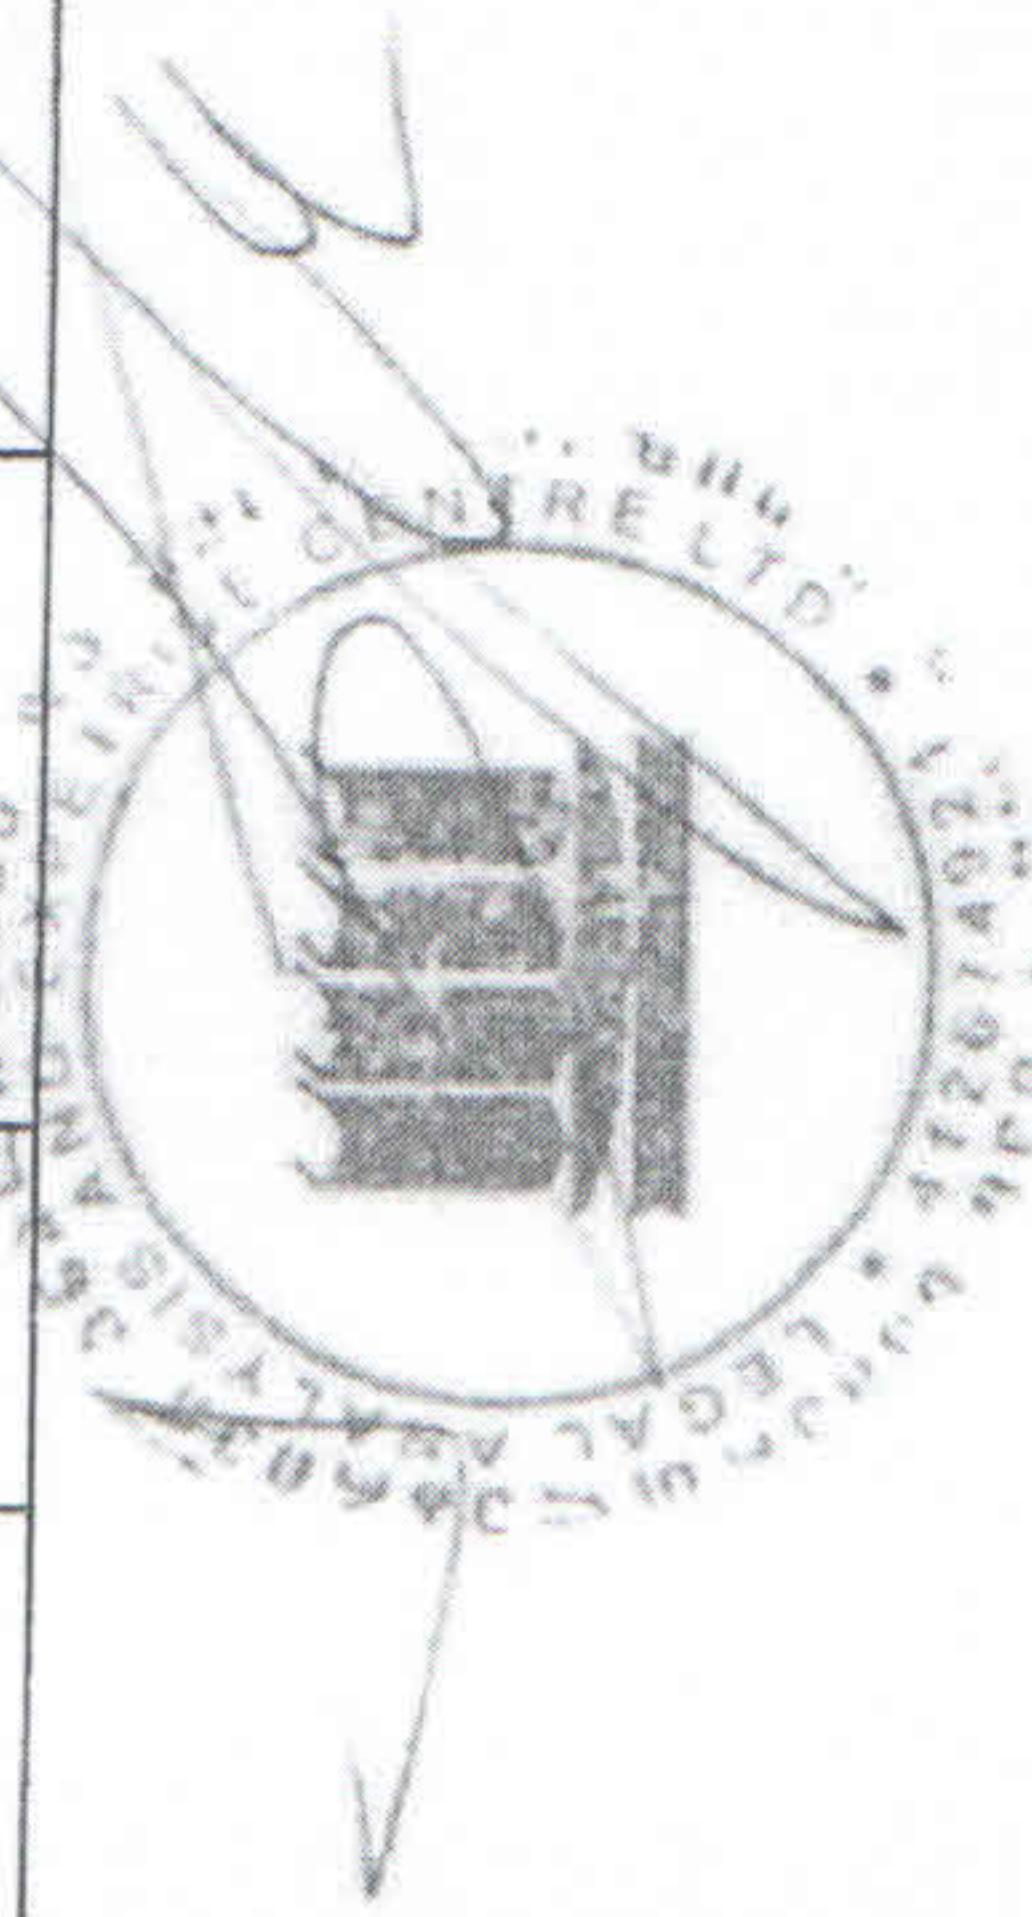



ქ. ქუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ. ფოსტა: info@emg.ge

წერილი № გ 941

21 ივნისი, 2018 წელი

ქ. ქუთათელაძის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების
სამსახურის ხელმძღვანელს

ბატონ ბექა ყურაშვილს

ასლი: შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი”-ს დირექტორს

ბატონ რევაზ ჩირაძეს

ბატონო ბექა,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქ. ქუთათელაძის მიმდინარეობის ბელიაშვილის და
გუნიას ქუჩების გზის ბეტონის საფარით მოწყობის (ღვარსადენთან ერთად)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (NAT180002112, ხელშეკრულება #90 28/03/2018),
რომელსაც ახორციელებს შ.კ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი”.

გუნიას ქუჩაზე პროექტი ითვალისწინებდა ზედმეტი გრუნტის მოჭრას.
საპროექტო ნიშნულზე დასვლის შემდგომ გამოჩნდა წყლით გაჯერებული
მოძრავი გრუნტები, რომელზეც შეუძლებელია გზის საფუძვლის და შემდგომ
საფარის მოწყობა და დღეის მდგომარეობით სამუშაოები შეჩერებულია
კორექტირებამდე, რომელიც აუცილებლად მიგვაჩნია ობიექტის წარმატებით
დამთავრებისათვის.

მიმდინარე წლის 20 ივნისს მომწოდებელმა მოგვმართა წერილობით და
წარმოგვიდგინა კორექტირებული სამუშაოების მოცულობები, რომელიც უნდა
დაამტკიცოს საპროექტო ორგანიზაციამ და წარმოგიდგინოთ შესათანხმებლად.



კუთათელაძის ქუჩა #8,
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 591 599 292
ელ. ფოსტა: info@emng.ge

ასევე გაცნობებთ, რომ კორექტირებულ სამუშაოთა მოცულობებში
წარმოდგენილია „მოჭრილი გრუნტის ადგილზე საფუძვლის მოწყობა სისქით
55 სმ მსხვილი ბალასტით“ და „ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან საფუძვლის
მოწყობა სისქით 30 სმ“, რომლებიც ძველ ხარჯთაღრიცხვაში არ არის
მოცემული.

დანართი: ოთხი ფურცელი

პატივისცემით,

იოვანე სიხარულოვა

შპს „სამუშაოთა მონიტორინგის ჯგუფი“
დირექტორი



კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ობიექტის დასახელება	გირებულება ლ	კორექტირებული ღირებულება ლ
1	ბელიაშვილის ქუჩა	179825,09	179825,09
2	გუნიას ქუჩა	141171,39	166296,43
	ჯამი	320996,48	346121,52



გვს "ჯგუფი როგორ ინვესტი" -ს დარღმულო.

“�”是“我愛你”的意思，是中國人對外宣傳的一個重要標語。
