

ქ. რუსთავი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „პარმაღი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თემურ შარიქაძეს სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (შპს „პარმაღი“) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170003968 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „მხარე“ - „შემსყიდველი“ ან/და „მიმწოდებელი“.
- 1.7 „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების აღწერა და მოცულობა მოცემულია ხელშეკრულებაზე თანდართულ დანართ №1-ში, ხარჯთაღრიცხვების დანართ №2-ში და სატენდერო დოკუმენტაციაში ატვირთულ ნახაზებში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 1 078 222.00 (ერთიმილიონ სამოცდათვრამეტიათას ორასოცდაორი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 4.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის-სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს ანგარიშსწორება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულება) (2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 13.69% - 147 608.59 (ასორმოცდაშვიდიათას ექვსასრვა ლარი და 59 თეთრი) ლარი, ხოლო 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 86.31% - 930 613.41 (ცხრასოცდაათიათას ექვსასცამეტი ლარი და 41 თეთრი) ლარი).

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ისა და მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „პარმაღი“-ს წარმომადგენელი.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:
 - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა.
 - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
 - „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

- 6.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 170 (ასამოცდაათი) კალენდარული დღე. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით)
- 6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქალაქი რუსთავი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
- გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.
- დ) საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებლის ვალდებულებები:

- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში.
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართი №1-ის, ხარჯთაღრიცხვების დანართი №2-ისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი.
- დ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საოპერატიული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით).
- 8.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:
- ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
 - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
 - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისთვის

- 9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დაუძლეველი ძალა

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 12.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია №PE40227-17 (ხელშეკრულების ღირებულების 5%) გაცემული სს „საქართველოს ბანკი“-ს მიერ, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2017 წლის 25 მაისიდან 2019 წლის 25 მარტის ჩათვლით.
- 12.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ/არაჯეროვნად შესრულების გამო.
- 12.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ №TRESGE22
ა/ა №GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე

ნოდარ შეროზია



„მიმწოდებელი“

შპს „პარმაღი“
მის: ქ. თბილისი, პეტრიწის №10
საიდენტიფიკაციო კოდი №205286849
სს „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ №BAGAGE22
ა/ა №GE37BG0000000607283000

შპს „პარმაღი“-ს დირექტორი



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნაგროზაშვილი

სატენდერო წინადადების ფასი 1078222 ლარი

ქალაქ რუსთავეში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ღირებულება (ლარი)
1	2	3
1	დემონტაჟის სამუშაოები	22560,78
2	სამშენებლო სამუშაოები	665752,41
3	ლითონკონსტრუქციები	1804,39
4	ღობე	11001,26
5	საქვბე	3962,58
6	თბოტექნიკა	24839,37
7	ვენტილაცია	3228,61
8	სანტექნიკა	17162,28
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	63995,72
10	ელექტროლობა	14488,48
	ჯამი	828795,88
	ბეგმიური დაგროვება (5%)	41439,79
	ჯამი	870235,67
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (5%)	43511,78
	ჯამი	913747,46
	დღგ (18%)	164474,54
	ჯამი	1078222,00

შ.პ.ს "პარმაღი"-ს

დირექტორი:



ხარჯთაღრიცხვა №1

ქალაქ რუსთავეში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (შენიშვნის დემონტაჟი)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი შექანიზებული		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გოფირებული მთითიბეული თუნუქის სახურავის დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილას (არაუმეტეს 5 კმ)	მ2	650			0,25	162,50	0,05	32,50	195,00
2	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი და დასაწყობება ადგილზე ხის მეორადი გამოყენების მიზნით	მ3	13			25,00	325,00			325,00
3	კედლებისა და ტიხრების დემონტაჟი ა/თვითმცლებზე დატვირთვით	მ3	700			5,25	3675,00			3675,00
4	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	1295,00					5,25	6798,75	6798,75
5	სართულშუა რკინაბეტონის დრუტანიანი ფილების დემონტაჟი, გაწმენდა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილას (არაუმეტეს 5 კმ მანძილისა)	მ2	1050,00			4,55	4777,50	5,25	5512,50	10290,00
	ჯამი	ლარი					8940,00		12343,75	21283,75
	ზედნადები ხარჯები (%)	ლარი	6%							1277,03
	ჯამი	ლარი								22560,78



შ.პ.ს "კარმაგი"-ს

დირექტორი:

[Handwritten signature]
/თ. შარიქაძე/

ხარჯთაღრიცხვა №2

ქალაქ რუსთავში (კურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (სამშენებლო ნაწილი))

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანკ. პერ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	ბეტონის საფარისა და საფუძვლის დაშლა მექანიზმებით	მ3	570,00					7,50	4275,00	4275,00
2	ათვითმკვლელებზე დატვირთვით 95%	მ3	30,00							300,00
3	ივკე ხელით 5% (პნ ჩაქუჩებით)	ტ	1200,00			10,00	300,00	7,50	9000,00	9000,00
4	ნაშალის გატანა ათვითმკვლელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	მ3	1300,00					4,20	5460,00	5460,00
	ბრუნების დამუშავება ექსკავატორით მიმდებარე ტერიტორიაზე დაყრით და გაშლით	მ3								
	II რეკონსტრუქციის კარგავი									
	ა) მონოლითური საძირკველი და ფილა -2,75 ნიშნულზე									
5	გრუნტის დატკეპნა გამკვრივებამდე სისქით 10სმ	მ3	83,50					5,71	476,79	476,79
	საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარეკით და დატკეპნა 20სმ	მ3	167,00					6,93	1157,31	1157,31
6	ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ3	203,70	8,05	1639,79					1639,79
	მონოლითური ბეტონის ფილის ქვეშ ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ	მ3	80,70			15,00	1210,50			1210,50
7	ბეტონი B7,5	მ3	82,30	90,00	7407,00					7407,00
	მონოლითური რეკონსტრუქციის ფილის მოწყობა 40სმ	მ3	342,20			8,00	2737,60			2737,60
	ბეტონი B-25	მ3	349,00	100,00	34900,00					34900,00
8	არმატურა Ø25 ა-III	ტ	3,92	1080,00	4233,60					4233,60
	არმატურა Ø20 ა-III	ტ	41,48	1080,00	44798,40					44798,40
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,87	1080,00	939,60					939,60
	საქსოვი მავთული	კგ	171,10	1,90	325,09					325,09
	ბ) მონოლითური ლენტური საძირკველი და ზედიერკველი									
	მონოლითური რეკონსტრუქციის ლენტური საძირკველისა და ზედიერკველის მოწყობა	მ3	281,00			32,00	8992,00			8992,00
9	ბეტონი B-25	მ3	286,60	100,00	28660,00					28660,00
	არმატურა Ø16 ა-III	ტ	23,98	1080,00	25898,40					25898,40
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,27	1080,00	291,60					291,60
	საქსოვი მავთული	კგ	140,50	1,90	266,95					266,95
	ყალიბის ფიცარი	მ2	1200,00	3,90	4680,00					4680,00
10	ლენტური საძირკველის დაფარვა პიდროსაიზოლაციით ხსნარით	მ2	281,60			0,80	225,28			225,28



11	ბეტონზე წასასმელი პიდროსაიზოლაციო მასალა	კმ	225,28	2,40	540,67						540,67
	საპირკვლის გვერდულების შევსება ქვიშახრეშებიანი ნარევით	მ3	200,00			1,50	300,00				300,00
	ქვიშახრეშებიანი ნარევი	მ3	244,00	8,05	1964,20						1964,20
	ბ) მონოლითური ფილა და რიგელები -0,05 ნიშნულზე										
12	მონოლითური რკინაბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	მ3	138,20			32,00	4422,40				4422,40
	ბეტონი B-25	მ3	141,00	100,00	14100,00						14100,00
	არმატურა Ø28 ა-III	ტ	2,64	1080,00	2851,20						2851,20
	არმატურა Ø12 ა-III	ტ	12,00	1080,00	12960,00						12960,00
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,37	1080,00	399,60						399,60
	საქსოვი მავთული	კმ	69,10	1,90	131,29						131,29
	ყალიბის ფიცარი	მ2	700,00	3,90	2730,00						2730,00
	ბ) მონოლითური სვეტი										
13	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის მოწყობა	მ3	29,60			70,00	2072,00				2072,00
	ბეტონი B-25	მ3	30,20	100,00	3020,00						3020,00
	არმატურა Ø18 ა-III	ტ	1,92	1080,00	2073,60						2073,60
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,73	1080,00	788,40						788,40
	საქსოვი მავთული	კმ	14,80	1,90	28,12						28,12
	ყალიბის ფიცარი	მ2	300,00	3,90	1170,00						1170,00
	დ) მონოლითური ფილა და რიგელები +3,250 ნიშნულზე										
14	მონოლითური რკინაბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	მ3	165,10			65,00	10731,50				10731,50
	ბეტონი B-25	მ3	168,40	100,00	16840,00						16840,00
	არმატურა Ø28 ა-III	ტ	11,77	1080,00	12711,60						12711,60
	არმატურა Ø12 ა-III	ტ	12,00	1080,00	12960,00						12960,00
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	1,65	1080,00	1782,00						1782,00
	საქსოვი მავთული	კმ	82,55	1,90	156,85						156,85
	დ) მონოლითური ფილა და რიგელები +6,550 ნიშნულზე										
15	მონოლითური რკინაბეტონის ფილისა და რიგელების მოწყობა	მ3	169,40			65,00	11011,00				11011,00
	ბეტონი B-25	მ3	172,80	100,00	17280,00						17280,00
	არმატურა Ø28 ა-III	ტ	11,77	1080,00	12711,60						12711,60
	არმატურა Ø12 ა-III	ტ	12,39	1080,00	13381,20						13381,20
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	1,65	1080,00	1782,00						1782,00
	საქსოვი მავთული	კმ	84,70	1,90	160,93						160,93
	ე) მონოლითური შიდა კიბე (კ-1)										
16	მონოლითური რკინაბეტონის შიდა კიბის მოწყობა 2ც	მ3	12,40			65,00	806,00				806,00
	ბეტონი B-25	მ3	12,65	100,00	1265,00						1265,00
	არმატურა Ø22 ა-III	ტ	3,32	1080,00	3585,60						3585,60
	არმატურა Ø10 ა-III	ტ	0,06	1080,00	64,80						64,80
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,21	1080,00	226,80						226,80



საქსოვი მავთული	კმ	6,20	1,90	11,78					
ყალიბის ფიცარი	მ2	50,00	3,90	195,00					
ე) მონოლითური გარეთა პანდუსი და კიბე (კ-2)									
17 სივრცითი უკვესება ხელით ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ3	8,00	8,05	64,40	3,905	31,24			95,64
18 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ I0სმ	მ3	2,00	14,00	28,00	3,50	7,00			35,00
მონოლითური ბეტონის კიბის ქვეშ ბეტონის მომზადება სისქით I0სმ	მ3	1,60			15,00	24,00			24,00
19 ბეტონი B7	მ3	1,70	80,00	136,00					136,00
მონოლითური რკინაბეტონის გარე პანდუსი და კიბის მოწყობა	მ3	6,10			15,00	91,50			91,50
ბეტონი B-25	მ3	6,20	100,00	620,00					620,00
20 არმატურა Ø10 ა-III	ტ	0,39	1080,00	421,20					421,20
არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,03	1080,00	32,40					32,40
საქსოვი მავთული	კმ	3,05	1,90	5,80					5,80
ვ) მონოლითური გარეთა კიბე (კ-3)									
21 სივრცითი უკვესება ხელით ქვიშახრეშოვანი ნარევით	მ3	2,00	8,05	16,10	3,50	7,00			23,10
22 საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ I0სმ	მ3	0,10	16,00	1,60	3,50	0,35			1,95
მონოლითური ბეტონის კიბის ქვეშ ბეტონის მომზადება სისქით I0სმ	მ3	0,30			15,00	4,50			4,50
23 ბეტონი B7	მ3	0,31	80,00	24,80					24,80
მონოლითური რკინაბეტონის გარეთა კიბის მოწყობა	მ3	1,20			32,00	38,40			38,40
ბეტონი B-25	მ3	1,30	100,00	130,00					130,00
24 არმატურა Ø10 ა-III	ტ	0,10	1080,00	108,00					108,00
არმატურა Ø8	ტ	0,02	1080,00	21,60					21,60
საქსოვი მავთული	კმ	0,60	1,90	1,14					1,14
III სახურავი									
25 პარაკეტის შელესვა შიდა მხრიდან ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ2	62,20	2,20	136,84	4,00	248,80			385,64
26 პოლიეთილენის ჰიდროიზაციის მეშვეობის მოწყობა	მ2	625,00	0,40	250,00	0,10	62,50			312,50
27 კემზის დამატებული ფენის მოწყობა H _{სპ} =15სმ	მ3	93,80	28,00	2626,40	3,00	281,40			2907,80
თბოიზოლაციის მოწყობა XPS-ით I0სმ	მ2	625,00			0,50	312,50			312,50
თბოსაბიზოლაციო მასალა XPS სისქით I0სმ	მ2	637,50	2,50	1593,75					1593,75
ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა არმირებული ბატი სისქით 5სმ	მ2	625,00			3,75	2343,75			2343,75
29 ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	31,25	80,00	2500,00					2500,00
მავთულგადე 200X200X5	მ2	625,00	3,60	2250,00	0,25	156,25			2406,25
30 პარაკეტზე ხის ფიცრის მოწყობა	მ3	1,26			20,00	25,20			25,20
31 ხის ფიცრი წიწვიანი სისქით 5სმ	მ3	1,33	380,00	505,40	1,00	37,80			505,40
პარაკეტის ზედპირის გადაღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით H _{სპ} =3სმ	მ2	37,80							37,80
ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	1,13	80,00	90,72					90,72

33	ლიბროკომის ქვედა ფენის მოწყობა	მ2	687,00				1,25	858,75		858,75
	ლიბროკომის ქვედა ფენა	მ2	769,50	3,70	2847,15					2847,15
	ტაზი თხევადი (პროპანი)	კმ	137,40	2,50	343,50					343,50
	ბიტუმი ნავთობის	კმ	103,00	0,70	72,10					72,10
	ლიბროკომის ზედა ორი ფენის მოწყობა	მ2	687,00				1,25	858,75		858,75
34	ლიბროკომის ზედა ფენა	მ2	1539,00	3,70	5694,30					5694,30
	ტაზი თხევადი (პროპანი)	კმ	274,80	2,50	687,00					687,00
	ბიტუმი ნავთობის	კმ	206,00	0,70	144,20					144,20
35	პარაპეტის მოწყობა მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცლით სისქით 0,5მმ	მ2	84,40				5,00	422,00		422,00
	მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცელი სისქით 0,5მმ	მ2	88,60	7,65	677,79					677,79
	ღუბელი ბეტონის	კმ	8,44	4,00	33,76					33,76
	თვითმკურნელი შურევი	ც	500,00	0,10	50,00					50,00
36	ძაბრის მოწყობა მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცლით სისქით 0,5მმ	ც	6,00	7,65	45,90		4,00	24,00		69,90
37	მუხლის მოწყობა მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცლით სისქით 0,5მმ	ც	12,00	2,50	30,00		2,00	24,00		54,00
38	მიღების მოწყობა მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცლით სისქით 0,5მმ	გრძმ	42,00				2,50	105,00		105,00
	მეტალოკრამიტის გლუვი ფერადი ფურცელი სისქით 0,5მმ	მ2	24,00	7,65	183,60					183,60
	ღუბელი ბეტონის	კმ	2,40	4,00	9,60					9,60
	IV კედლები									
39	სამშენებლო ბლოკის 40X20X20სმ წყობა (პეშის)	ც	27100				0,30	8130,00		8130,00
	სამშენებლო ბლოკი 40X20X20სმ	ც	27642	1,02	28194,84					28194,84
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ3	95,80	70,00	6706,00					6706,00
40	სამშენებლო ბლოკის 40X20X10სმ წყობა (პეშის)	ც	260,00				0,30	78,00		78,00
	სამშენებლო ბლოკი 40X20X10სმ (პეშის)	ც	265,00	0,60	159,00					159,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის მ-100	მ3	0,50	70,00	35,00					35,00
	V შიდა სარემონტო სამუშაოები									
	ა) სარდაფი									
41	შიდა კედლებზე ქვაბამბის მოწყობა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე სამაგრი პლასტმასის ანკერებით	მ2	321,00				1,00	321,00		321,00
	ქვაბამბა სისქით 5სმ	მ2	321,00	3,82	1226,22					1226,22
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	642,00	0,80	513,60					513,60
	პლასტმასის ანკერი	ც	2510,00	0,10	251,00					251,00
42	ფასადის ბადის მოწყობა და კედლებისა და ნაოთხალების შეღებვა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარით	მ2	321,00							160,50
	ფასადის ბადე	მ2	321,00	1,50	481,50					481,50
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	1605,00	0,30	481,50					481,50

43	ბეტონის იატაკის დაფარვა პიდროსაიზოლაციო ხსნარით	მ2	580,00				0,50	290,00		290,00
	ბეტონზე წასასმელი პიდროსაიზოლაციო მასალა	კგ	464,00	1,50		696,00				696,00
44	იატაკზე თბოსაიზოლაციო მასალის XPS-ის მოწყობა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე	მ2	580,00				0,25	145,00		145,00
	თბოსაიზოლაციო მასალა XPS სისქით 10სმ	მ2	591,60	4,24		2508,38				2508,38
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	1160,00	0,30		348,00				348,00
45	იატაკზე ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა არმირებული ბადით სისქით 4სმ	მ2	580,00				3,75	2175,00		2175,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	23,20	70,00		1624,00				1624,00
	მავთულბადე 200X200X5	მ2	580,00	3,82		2215,60	0,50	290,00		2505,60
	ბ) იატაკი									
46	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა $H_{\text{საშ}}=4\text{სმ}$	მ ²	1160,00				3,75	4350,00		4350,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	46,40	70,00		3248,00				3248,00
47	ხაოიანი მეტლახის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე	მ ²	141,00				7,00	987,00		987,00
	ხაოიანი მეტლახი	მ ²	148,05	12,75		1887,64				1887,64
	წებოცემენტი	კგ	846,00	0,25		211,50				211,50
	ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე	მ ²	130,00				7,00	910,00		910,00
48	ხელოვნური გრანიტი	მ ²	136,50	16,00		2184,00				2184,00
	წებოცემენტი	კგ	780,00	0,25		195,00				195,00
	ალუმინის კარნიზი კიბეზე	გრძ.მ	56,00	1,50		84,00				84,00
49	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	130,00				1,20	156,00		156,00
	წებოცემენტი	კგ	52,00	0,25		13,00				13,00
50	ლამინატის იატაკის მოწყობა	მ2	889,00				3,20	2844,80		2844,80
	ლამინატი მაღალი ხარისხის	მ2	933,45	13,00		12134,85				12134,85
51	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა (კუთხეებით, გადასაბმელებით)	გრძ.მ	612,00	1,20		734,40				734,40
	ბ) ჭერი									
52	ამსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა (კომპლექტი ლითონის პროფილებით და საკიდრებით)	მ2	59,00	10,20		601,80	3,20	188,80		790,60
53	თაბაშირბუჯის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ ²	915,00				3,75	3431,25		3431,25
	თაბაშირბუჯი 12,5მმ	მ ²	960,75	3,00		2882,25				2882,25
	ლითონის პროფილები სამაგრებით	გრძ.მ	2800,00	0,85		2380,00				2380,00
54	კარნისავების მოწყობა ჭაფუკლასტით 10სმ	გრძ.მ	660,00	2,50		1650,00	0,50	330,00		1980,00
55	კიბეების და ბაჩების ძირების შეღებვა გაჟოთ	მ2	33,00	2,80		92,40	5,00	165,00		257,40
	თაბაშირბუჯის შეკიდული ჭერის და კიბეების ძირების დაფითხვა და შეღებვა წყალუმუხლის საღებავით ორპირად	მ ²	948,00				3,75	3555,00		3555,00
56	ფოთი	კგ	474,00	0,25		118,50				118,50

57	წყალმუდის საღებავი	კმ	568,80	2,70	1535,76					1535,76
	პლასტმასის შეკიდული ჭკრის მოწყობა ლითონის პროფილებზე	მ²	138,00			3,75	517,50			517,50
	პლასტმასის შეკიდული ჭკრი მეტალის იმიტაციით კარნიზებით	მ²	144,90	7,80	1130,22					1130,22
	ლითონის პროფილები სამაგრებით	გრძმ	440,00	0,85	374,00					374,00
	დ) ტიხრები და კედლები									
58	ნაოთხალურბისა და კედლების შეღებვა გაჯით ოთახებში	მ²	2250,00	2,80	6300,00	5,00	11250,00			17550,00
	ლითონის პროფილები	გრძმ	1125,00	0,20	225,00					225,00
59	კედლების და ნაოთხალურბის დაფიხვა და შეღებვა									
	წყალმუდის საღებავით (ფასადის) ორპირად H=3მ	მ²	2250,00			3,75	8437,50			8437,50
	ფიფი	კმ	1125,00	0,25	281,25					281,25
	წყალმუდის საღებავი	კმ	1350,00	2,70	3645,00					3645,00
60	კედლების და ნაოთხალურბის შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით სველ წერტილებში	მ²	566,00	2,70	1528,20	4,00	2264,00			3792,20
	კედლებზე კაფელის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე H=2,8მ	მ²	540,00			6,00	3240,00			3240,00
61	კაფელი	მ²	567,00	12,75	7229,25					7229,25
	წებოცემენტი	კმ	3240,00	0,25	810,00					810,00
	კაფელის კუთხეების პროფილები	გრძმ	182,00	0,40	72,80					72,80
62	მღვ-ის ტიხრების მოწყობა სველ წერტილებში 2სმ 18X1,58X24C=36მ2	მ²	36,00	35,00	1260,00	6,00	216,00			1476,00
	ფიფადის მიღმადრატის მოწყობა 40X20X2 შეღებვით	გრძმ	120,00			1,20	144,00			144,00
63	ნიტროსაღებავი	კმ	4,32	2,90	12,53					12,53
	დუბელი	კმ	4,80	4,00	19,20					19,20
64	ლაზინირებული სიკით 20სმ ფილა სისქით 2სმ (სამაგრი დუბელებით)	მ2	80,00	15,00	1200,00	2,50	200,00			1400,00
	ე) კარ-ფანჯრები									
65	მღვ-ის ორფრთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი მოწყობილობებით (მღვ-ის სისქე 8მმ)	მ2	20,70	110,00	2277,00	15,00	310,50			2587,50
66	მღვ-ის ერთფრთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი მოწყობილობებით (მღვ-ის სისქე 8მმ)	მ2	43,47	110,00	4781,70	15,00	652,05			5433,75
67	მეტალპლასტმასის თეთრი ფერის ერთფრთიანი კარების დამზადება მონტაჟი 6სმ საკმებით	მ²	34,00	117,00	3978,00					3978,00
68	რკინის ერთფრთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი ორმხრივი ფიფადის ფურცლით 1,8-2მმ და საკმებით (ფიფადის ფურცლებს შორის თბოსაზოლაციო მასალა)	მ2	5,40	190,00	1026,00	25,00	135,00			1161,00
69	რკინის კარები გაწმენდა და შეღებვა ზეთის საღებავით ორპირად	მ2	10,80			3,75	40,50			40,50
	ზეთის საღებავი	კმ	3,24	2,90	9,40					9,40



70	მეტალოპლასტიკის თეთრი ფერის ერთფეროვანი კარების მონტაჟი 6სმ საკეტებით	მ²	7,40	110,00	814,00				814,00
71	ალუმინის (იზოპროფილით) ვიტრაჟების დამზადება და მონტაჟი მინაპაკეტით და ორფეროვანი კარებით საკეტებით	მ²	15,80	180,00	2844,00				2844,00
72	ალუმინის ვიტრაჟების დამზადება და მონტაჟი მინაპაკეტით და ერთფეროვანი კარებით, საკეტებით	მ²	22,65	180,00	4077,00				4077,00
73	თეთრი ფერის მეტალოპლასტიკის ფანჯრების დამზადება მონტაჟი მინაპაკეტით, ერთი ფერის გაღება-გადმოკიდებით, სისქით 6სმ	მ²	148,20	100,00	14820,00				14820,00
74	თეთრი ფერის რაფების მოწყობა 20სმ	გრძ.მ	75,30	15,00	1129,50				1129,50
75	ფოლადის მილკადრატების ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი მინაპაკეტით	მ²	4,60	80,00	368,00				368,00
76	საწიმრების მოწყობა მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცლით	გრძ.მ	75,30			5,00	376,50		376,50
	მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცელი 0,5მმ	მ²	11,90	8,70	103,53				103,53
	დუბელი	კმ	7,53	4,00	30,12				30,12
	მ კბე								
77	შიდა და გარე კიბის ალუმინის მოაჯირის კონსტრუქცია სახელურით h=90სმ (სამაგრი დეტალებით)	გრძ.მ	39,00	60,00	2340,00	29,00	1131,00		3471,00
	VI ფასადი								
78	ხარაჩოების მონტაჟი და დემონტაჟი შენობის პერიმეტრზე	მ2	980,00	0,40	392,00	1,00	980,00		1372,00
79	ზეირკვლის და კიბის ბაქის შეღებვა ქვიშაგამტების ხსნარით 1/2	მ2	110,00	2,80	308,00	4,00	440,00		748,00
80	ზეირკვლისა და კიბის ბაქის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით (დაბურჩაბული) სისქით 3სმ ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე	მ2	110,00			25,00	2750,00		2750,00
	ბაზალტის ფილებით (დაბურჩაბული) სისქით 3სმ	მ2	115,50	22,00	2541,00				2541,00
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	660,00	0,30	198,00				198,00
	ბაზალტის კარნიზის მოწყობა	გრძ.მ	122,00	3,00	366,00	1,50	183,00		549,00
81	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	14,64	0,30	4,39				4,39
	კედლებზე თბოსაბოლოაციო მასალის XPS-ის მოწყობა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე სამაგრი პლასტმასის ანკერებით	მ2	906,00			1,20	1087,20		1087,20
82	თბოსაბოლოაციო მასალა XPS სისქით 10 სმ	მ2	906,00	3,00	2718,00				2718,00
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	1812,00	0,30	543,60				543,60
	პლასტმასის ანკერი	ც	6342,00	0,10	634,20				634,20
83	კედლებისა და ნაოთხალებზე ფასადის ბადის მოწყობა და შეღებვა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარით	მ2	906,00			0,50	453,00		453,00
	ფასადის ბაღე	მ2	906,00	1,90	1721,40				1721,40
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	4530,00	0,30	1359,00				1359,00

84	კმდელებისა და ნაოთხალების დაშეფევა ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარით	მ2	906,00					3,75	3397,50		3397,50
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	906,00	0,35	317,10						317,10
85	სართულსშუა და პარაკეტის კარნიზის მოწყობა ქაფკლასტით ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე სივანით 8სმX25სმ	გრძმ	255,20					3,75	957,00		957,00
	კარნიზი ქაფკლასტის 8სმX25სმ	გრძმ	260,30	8,00	2082,43						2082,43
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	382,80	0,35	133,98						133,98
86	კარ-ფანჯრების კარნიზის მოწყობა ქაფკლასტით 3588X120მმ ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე	გრძმ	472,00					3,75	1770,00		1770,00
	კარნიზის ქაფკლასტის 3588X120მმ	გრძმ	481,44	4,50	2166,48						2166,48
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კმ	330,40	0,35	115,64						115,64
87	კარნიზების დაფითხვა	მ2	120,00					1,20	144,00		144,00
	ფასადის ფითხი	კმ	60,00	0,35	21,00						21,00
	ფასადის დაგრუნტება და შეღებვა ფასადის საღებავით ორპირად	მ2	906,00					3,75	3397,50		3397,50
88	საღებავი საგრუნტი გარე სამუშაოებისათვის	ლიტ	362,40	4,50	1630,80						1630,80
	ფასადის საღებავი თეთრი (კარნიზის)	ლიტ	72,00	4,50	324,00						324,00
	ფასადის საღებავი ფერადი	ლიტ	471,60	3,90	1839,24						1839,24
	ჯამი	ლარი			471791,41				121754,07	20369,10	613914,57
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%								14153,74
	ჯამი	ლარი									628068,31
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%								37684,10
	ჯამი	ლარი									665752,41



შ.პ.ს "კარმალი"-ს

დირექტორი:




[Handwritten signature]
/თ. შარიძე

ქალაქ რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი მშპს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა
(ლითონკონსტრუქციები)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. კერძ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) სახანძროუსაფრთხოების კიბეები 2ც									
1	სახანძროუსაფრთხოების კიბეების დამზადება და მონტაჟი ფოლადის კონსტრუქციებით	ტ	0,78			150,00	117,00			117,00
	ფოლადის კვადრატული მილი 60X40X2	გრძ.მ	14,30	5,35	76,51					76,51
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3	გრძ.მ	36,10	3,50	126,35					126,35
	ფოლადის შეგლეფი №16	გრძ.მ	17,60	22,00	387,20					387,20
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X3	გრძ.მ	18,10	4,40	79,64					79,64
	ფოლადის კუთხოვანა 40X40X3	გრძ.მ	38,20	3,50	133,70					133,70
2	ფოლადის ფურცელი 4მმ	მ2	7,30	38,20	278,86					278,86
	ლითონსაპკრელი და შესადგენელი მასალები (0,78ტ ლითონკონსტრუქციებზე)	კომპლ	1,00	15,00	15,00					15,00
	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდა და შედგენა ნიტროსაღებავით	მ2	41,50			3,75	155,63			155,63
	ორპირად									
	ნიტროსაღებავი	კგ	12,45	2,90	36,11					36,11
	ბ) სახურავზე ასასვლელი კიბე 1ც									
3	სახურავზე ასასვლელი კიბის დამზადება და მონტაჟი ფოლადის კონსტრუქციებით	ტ	0,17			150,00	25,50			25,50
	ფოლადის კვადრატული მილი	გრძ.მ	12,80	5,35	68,48					68,48
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X3	გრძ.მ	3,80	3,50	13,30					13,30
	ფოლადის ზოლივანა 50X3	გრძ.მ	42,00	1,50	63,00					63,00
	ფოლადის წნელი Φ20	გრძ.მ	17,90	1,90	34,01					34,01
	ლითონსაპკრელი და შესადგენელი მასალები	კომპლ	1,00	15,00	15,00					15,00



4	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა ნიტროსაღებავით ორპირად	მ2	8,00			3,75	30,00		30,00
	ნიტროსაღებავი	კგ	2,40	2,90	6,96				6,96
	ჯამი	ლარი			1334,11		328,13		1662,24
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%						40,02
	ჯამი	ლარი							1702,26
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	6%						102,14
	ჯამი	ლარი							1804,39

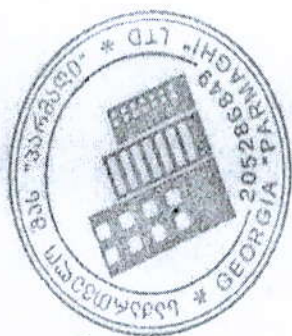

შ.პ.ს "კარმადი"-ს

დირექტორი:



[Handwritten signature]
/თ. შარიქაძე


ხარჯთაღრიცხვა №4

ქალაქ რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემინტაჟი და ახალი იმეს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (დობე)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განხ. კრო.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) დობე									
1	არსებული ბეტონის დეკორატიული ღობის დემინტაჟი ათვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	2,50			15,00	37,50			37,50
2	ნაშალის გატანა ათვითმცლელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	6,00					5,25	31,50	31,50
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად მიწის ადგილზე დაყრით და გაშლით	მ3	5,40			8,00	43,20			43,20
4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ3	1,20	16,00	19,20	5,00	6,00			25,20
5	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ3	4,50			20,00	90,00			90,00
	ბეტონი მ-200	მ3	4,59	90,00	413,10					413,10
	ფოლადკონსტრუქციების ღობის დამზადება და მონტაჟი ბეტონის საძირკველში	ტ	3,67			210,00	770,70			770,70
6	ფოლადის კვადრატული მილი 60X60X2	გრძ/მ	210,00	5,35	1123,50					1123,50
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X3	გრძ/მ	854,70	4,40	3760,68					3760,68
	ფოლადის ბადე 50X50X2,5	მ2	385,50	3,50	1349,25					1349,25
	არმატურა D6 ა-I	გრძ/მ	854,70	0,26	222,22					222,22
	ფოლადის ფურცელი 3მმ	მ2	1,43	33,90	48,48					48,48
	ფოლადის ზოლოვანა 50X5	გრძ/მ	40,00	1,50	60,00					60,00
	ლითონსაგურელი და შესადგენი მასალები (3,67ტ ფოლადის კონსტრუქციებზე)	კომპლ	1,00	15,00	15,00					15,00
	ბ) ალუაფის კარი და კუტიკარი									
7	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ3	0,27			8,00	2,16			2,16
8	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ3	0,06	16,00	0,96	5,00	0,30			1,26
9	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ3	0,23			20,00	4,60			4,60
	ბეტონი მ-200	მ3	0,24	90,00	21,60					21,60
	ალუაფისა და კუტიკარის დამზადება და მონტაჟი	მ2	11,20			20,00	224,00			224,00



10	ფოლადის კვადრატული მილი 60X60X3	გრძ/მ	10,50	5,35	56,18				56,18
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X20X2	გრძ/მ	30,50	2,90	88,45				88,45
	ფოლადის კვადრატული მილი 20X20X2	გრძ/მ	84,00	1,50	126,00				126,00
	ფოლადის ფურცელი 3მმ	მ2	0,01	33,90	0,34				0,34
	ფოლადის ანჯამა $\Phi 25$ L=120მმ (ალაყფის კარისათვის)	წყ	2,00	5,00	10,00				10,00
	ფოლადის ანჯამა $\Phi 20$ L=100მმ (კუტიკარისათვის)	წყ	3,00	5,00	15,00				15,00
	ლითონსაჭრელი და შესადუღებელი მასალები (0,22 ფოლადის კომპლექტები)	კომპლ	1,00	15,00	15,00				15,00
11	ფოლადის ღობისა და კარბების გაწმენდა და შეღებვა ზეთის ხალებით ორპირად	მ2	396,00			3,75	1485,00		1485,00
	ზეთის ხალები	კმ	39,60	2,90	114,84				114,84
	ჯამი	ლარი			7459,79		2663,46	31,50	10154,75
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%						223,79
	ჯამი	ლარი							10378,55
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	6%						622,71
	ჯამი	ლარი							11001,26



შ.პ.ს "კარმადი"-ს

დირექტორი:



[Handwritten signature]
/თ. შარიძე


ხარჯთაღრიცხვა №5

ქალაქ რუსთავეში (კურტაგელის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (საქვამდე)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) საბირკველი, იატაკი									
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის ლენტური საბირკვლების მოსაწყობად მიწის ადგილზე დაყრით და გაშლით	მ3	5,00			8,00	40,00			40,00
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ	მ3	1,60	16,00	25,60	5,00	8,00			33,60
	მონოლითური ბეტონის ლენტური საბირკვლების და არმირებული ბეტონის ფილის მოწყობა	მ3	3,80			30,00	114,00			114,00
	ბეტონი მ-300	მ3	3,88	100,00	387,60					387,60
3	არმატურა მ12 ა-III	გრძ/მ	66,00	0,96	63,36					63,36
	არმატურა მ6 ა-I	გრძ/მ	230,00	0,26	59,80					59,80
	საქსოვი მკეთილი	კმ	1,90	2,00	3,80					3,80
	ყვადობის ფიცარი	მ2	10,00	3,90	39,00					39,00
	ბ) ლითონკონსტრუქციები									
	ფოლადკონსტრუქციების კარკასის დამზადება და მონტაჟი ბეტონის საბირკველში	ტ	0,54			150,00	81,00			81,00
4	ფოლადის კვადრატული მიდი 80X80X3	გრძ/მ	44,50	9,60	427,20					427,20
	ფოლადის კვადრატული მიდი 80X40X3	გრძ/მ	34,40	7,60	261,44					261,44
	ფოლადის ფურცელი 4მმ	მ2	0,20	40,00	8,00					8,00
	ლითონსაგურელი და შესადგენელი მასალები (0,54ტ ფოლადის კონსტრუქციებზე)	კომპლ	1,00	15,00	15,00					15,00
5	ფოლადის კონსტრუქციების კარკასის გაწმენდა და შედგენილი ნაწილებით ორპირად ნიტროსაღებავი	მ2	21,50			3,75				80,63
		კმ	6,45	2,90	18,71					18,71
6	მეტალპლასტმასის თეთრი ფერის ერთფეროვანი კარებების დამზადება მონტაჟი ნსმ საკეტებით	მ²	2,10	100,00	210,00					210,00
	ბ) კარ-ფანჯარა									



7	თეთრი ფერის შეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამზადება მოინტაჟო მინაპაკეტით, ერთი ფრთის გაღება სისქით 6სმ	მ²	1,60	100,00	160,00					160,00
	დ) გარსაცმი									
	სენდვიჩპანელის გარსაცმის მოწყობა	მ2	68,00				5,00	340,00		
8	სენდვიჩპანელი 5სმ	მ2	71,40	18,00	1285,20					340,00
	თეთრმეტრული შურეფი	ც	408,00	0,05	20,40					1285,20
	ჯამი	ლარი			2985,11			663,63		20,40
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%							3648,73
	ჯამი	ლარი								89,55
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%							3738,28
	ჯამი	ლარი								224,30
		ლარი								3962,58

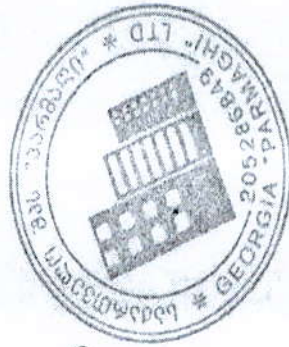

შპს "კარმადი"-ს

დირექტორი:




ა. შ. შ. /თ. შარიქაძე

ქალაქ რუსთავეი ცენტრალური ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (თბოზომარაგება)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ა) ქვაბი და რადიატორი									
1	თუჯის დასადგმელი ქვაბი 200კმტ	კომპლ	1	7203,00	7203,00	1271,00	1271,00			8474,00
2	ფოლადის მილი Ø273X6	გრძმ	10,00	45,00	450,00					450,00
3	რადიატორი პანელური h=0,6მ, L=1მ	ც	24	95,00	2280,00	40,00	960,00			3240,00
4	რადიატორი პანელური h=0,6მ, L=1,5მ	ც	34	140,00	4760,00	40,00	1360,00			6120,00
5	რადიატორი კვანძი	ც	116,00	10,20	1183,20					1183,20
6	კვანძი Ø50	ც	1,00	50,00	50,00					50,00
7	კვანძი Ø40	ც	4,00	40,00	160,00					160,00
	ბ) მიღება/გაყვანილობა									
	მიღება/გაყვანილობის მონტაჟი									
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø50 (ცივი წყლის)	გრძმ	668,00			0,50	334,00			334,00
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø50 (ცხელი წყლის)	გრძმ	32,00	8,50	272,00					272,00
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø40 (ცხელი წყლის)	გრძმ	4,00	8,50	34,00					34,00
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø32 (ცხელი წყლის)	გრძმ	300,00	4,45	1335,00					1335,00
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø25 (ცხელი წყლის)	გრძმ	160,00	2,75	440,00					440,00
	პლასტმასის ფოლგებიანი მილი Ø20 (ცხელი წყლის)	გრძმ	100,00	1,70	170,00					170,00
	თბოთსიზოლაციის მასალა Ø40	გრძმ	72,00	0,98	70,56					70,56
	სამკაპი Ø40XØ40XØ20	გრძმ	10,00	1,20	12,00					12,00
	სამკაპი Ø32XØ32XØ20	ც	58,00	1,20	69,60					69,60
	სამკაპი Ø25XØ25XØ20	ც	32,00	1,20	38,40					38,40
	გადამყვანი Ø40XØ32	ც	26,00	1,20	31,20					31,20
	გადამყვანი Ø32XØ25	ც	2,00	0,80	1,60					1,60
	მუხლი Ø40	ც	2,00	0,80	1,60					1,60
	მუხლი Ø20	ც	8,00	0,80	6,40					6,40
		ც	174,00	0,60	104,40					104,40

ქურო #20 (შ.ს)	ც	116,00	0,60	69,60					69,60
ქურო #50	ც	8,00	1,20	9,60					9,60
ქურო #40	ც	75,00	1,20	90,00					90,00
ქურო #32	ც	40,00	1,20	48,00					48,00
ქურო #25	ც	25,00	0,80	20,00					20,00
პაკლი დიდი	ც	5,00	6,00	30,00					30,00
ჯამი	ლარი			18940,16		3925,00			22865,16
მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%							568,20
ჯამი	ლარი								23433,36
ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%							1406,00
ჯამი	ლარი								24839,37



შპს "კარმადილ"-ს

დირექტორი:




[Handwritten signature]
/თ. შარიძე

ქალაქ რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ეკვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (ვენტილაცია)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) სამზარეულოს ვენტილაცია									
	სამზარეულოში სავენტილაციო ქსელის მოწყობა	კომპლ.	1			300,00	300,00			300,00
	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი L=3000მ ³ /სთ P=300პა. სტატიკური წნევით	კომპლ.	1	922,00	922,00					922,00
	სახურავის დეფლექტორი 350X350	ცალი	1	36,00	36,00					36,00
	სამაგრი ფორნიტურა (დეტელი, ჭანჭიკი, ქანში და სხვა)	ცალი	500	0,10	50,00					50,00
	გამწოვი ქოლგა (2000X700) მმ.	ცალი	1,0	200,00	200,00					200,00
	გამწოვი სავენტილაციო გისოსი პაერის რეგულირებადი დამაკრებით (200X200) მმ. (გ.ს.გ.)	ცალი	7,0	20,00	140,00					140,00
	პაერის გადამდენი სავენტილაციო გისოსი: (800X200) მმ.	ცალი	1,0	38,00	38,00					38,00
	ფოლადის მოთუთიბული პაერსატარი d=0,60მმ.	მ ²	38,0	12,00	456,00					456,00
	ავტომატი სამფაზა 16ა	ცალი	1,0	8,50	8,50					8,50
	სპილენძის ელ კაბელი 4X4	გრ.მ.	40,0	4,50	180,00					180,00
	პაერსატარსა და ვენტილიატორი უმცირესი ბრეზენტი	მ2	0,6	18,00	10,80					10,80
	ბ) სველი წერტილების ვენტილაცია									
	პაერსატარების მოწყობა პლასტმასის მილებით	გრ.მ.	45			0,70	31,50			31,50
	პლასტმასის მილი Ø150X3,2	გრ.მ.	45	6,00	270,00					270,00
	პლასტმასის მუხლი Ø150X3,2	ც	12	6,00	72,00					72,00
	პლასტმასის სამკაპი Ø150X3,2	ც	5	6,00	30,00					30,00
	ცხურა	ც	9	8,00	72,00					72,00
	ცილიკონი	ქილა	1	6,00	6,00					6,00



5	გამწოვი ვენტილატორების მონტაჟი	(კალი	9	16,00	144,00				
	ჯამი	ლარი			2635,30		331,50		144,00
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%						2966,80
	ჯამი	ლარი							79,06
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	6%						3045,86
	ჯამი	ლარი							182,75
									3228,61

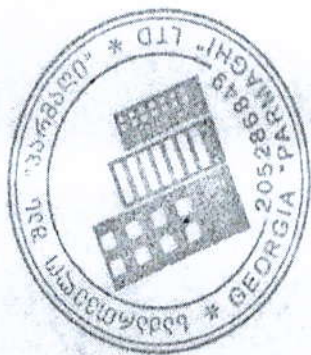

შ.პ.ს. "კარმალი"-ს

დირექტორი:

ა. შიქიძე
/თ. შარიქაძე/



ქალაქ რუსთავეში ცურთაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემინტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (სანტექნიკა)


№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) მიწის სამუშაოები									
1	მიწის დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ3	9,5					4,50	42,75	42,75
2	იგივე ხელით 5%	მ3	0,5			8,00	4,00			4,00
3	ნაწილი ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	18,5					4,50	83,25	83,25
4	მიწის დამუშავება მსხვილი ქვიშით 0-5მმ	მ3	2	16,00	32,00	4,00	8,00			40,00
5	ტრანშეას შევსება ბალსტით	მ3	7	8,00	56,00	4,00	28,00			84,00
	ბ) კანალიზაციის ჭა									
	სანიაღვრე შემკრები ჭების მოწყობა	კომპლ	1			100,00	100,00			100,00
6	რკინაბეტონის ჭის ძირი Ø13	ც	1	30,00	30,00					30,00
	რკინაბეტონის ჭის რგოლი h=13 Ø13	ც	1	100,00	100,00					100,00
	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა	ც	1	30,00	30,00					30,00
	ჭის პოლიმერული ხუფი	ც	1	200,00	200,00					200,00
	გ) წყალგაყვანილობა									
	წყლის მოღვაწეანობის მიხტაჟი	გრძმ	610,00			1,00	610,00			610,00
	პლასტმასის მილი Ø50	გრძმ	10,00	8,50	85,00					85,00
	პლასტმასის ფოლგაიანი მილი Ø25 (ცხელი წყლის)	გრძმ	200,00	1,70	340,00					340,00
	პლასტმასის ფოლგაიანი მილი Ø20 (ცხელი წყლის)	გრძმ	200,00	0,98	196,00					196,00
	პლასტმასის მილი Ø20	გრძმ	200,00	0,98	196,00					196,00
	ვინტილი Ø50	ც	1,00	5,00	5,00					5,00
	ქურო Ø50 უ.ხ.	ც	1,00	1,20	1,20					1,20
	უტუცერი Ø50 გ.ხ.	ც	1,00	1,20	1,20					1,20
	ქურო Ø50	ც	1,00	1,20	1,20					1,20
	სამკაპი Ø50	ც	1,00	1,20	1,20					1,20
	გადამყვანი Ø50-Ø25	ც	12,00	1,20	14,40					14,40
	სამკაპი Ø50-Ø25	ც	18,00	1,20	21,60					21,60
	სამკაპი Ø25	ც	20,00	0,60	12,00					12,00
	სამკაპი Ø25-Ø20	ც	20,00	0,60	12,00					12,00
7	პლასტმასის მილი Ø25	გრძმ	80,00	1,20	96,00					96,00



ქურო 025	ც	16,00	0,60	9,60					9,60
მუხლი 025 90°	ც	44,00	0,60	26,40					26,40
კინტილი 020	ც	18,00	6,00	108,00					108,00
მუხლი 020 90°	ც	90,00	0,60	54,00					54,00
ქურო 020	ც	30,00	0,60	18,00					18,00
მუხლი 020 90°	ც	20,00	0,60	12,00					12,00
მუხლი 020 90°	ც	35,00	0,60	21,00					21,00
მუხლი 020 90°	ც	50,00	0,60	30,00					30,00
კვანტილი (უნიტაზის ბაზოკის)	ც	30,00	6,00	180,00					180,00
სამკაპი 020	ც	60,00	0,60	36,00					36,00
უტკა 020	ც	20,00	0,60	12,00					12,00
მუხლი 020 45°	ც	30,00	0,60	18,00					18,00
მუხლი 050 90°	ც	60,00	1,20	72,00					72,00
პლასტმასის მილი 020 ცხელი წყლის	გრძმ	80,00	1,20	96,00					96,00
პაკლი	ც	20,00	5,00	100,00					100,00
დ) კანალიზაცია									
კანალიზაციის გაყვანილობის მიწაზე	გრძმ	220,00			1,50	330,00			
პლასტმასის მილი 150X3.2	გრძმ	20,00	6,00	120,00					330,00
სამკაპი 0150	ც	3,00	6,00	18,00					120,00
გადამყვანი 0150X0100	ც	4,00	6,00	24,00					18,00
პლასტმასის მილი 100X3.2	გრძმ	140,00	4,00	560,00					24,00
მუხლი 0100 45°	ც	36,00	3,00	108,00					560,00
მუხლი 0100 90°	ც	32,00	3,00	96,00					108,00
მუხლი 0150 45°	ც	10,00	5,00	50,00					96,00
მუხლი 0150 90°	ც	8,00	5,00	40,00					50,00
სამკაპი 0100 ირიბი	ც	8,00	3,00	24,00					40,00
სამკაპი 0100	ც	16,00	3,00	48,00					24,00
პლასტმასის მილი 150X3.2	გრძმ	60,00	3,00	180,00					48,00
მუხლი 050 90°	ც	27,00	3,00	81,00					180,00
მუხლი 050 45°	ც	22,00	3,00	66,00					81,00
ტრაპი 050	ც	9,00	15,00	135,00					66,00
ლიმონიკი 050	ც	27,00	3,00	81,00					135,00
უნიტაზის გარმიშკა	ც	26,00	5,00	130,00					81,00
ხელსაბანის სოფონი	ც	27,00	5,00	135,00					130,00
სილიკონი დიდი	ქილა	20,00	5,00	100,00					135,00
ბალგარკის ქვა №125	ც	15,00	3,50	52,50					100,00
მიღების სამაგრი	ც	100,00	1,00	100,00					52,50
									100,00



რეკვიზიტი №150	ც	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
ე) მოწყობილობები							
9 უნიტაზი ბაშოკით (ბაგუშების)	კომპლ	24,00	153,00	3672,00	40,00	960,00	10,00
10 ხელსაბანი ონკანით (ბაგუშების)	კომპლ	24,00	100,00	2400,00	40,00	960,00	4632,00
11 უნიტაზი ბაშოკით	კომპლ	2,00	90,00	180,00			3360,00
12 ხელსაბანი ონკანით	კომპლ	3,00	120,00	360,00			180,00
13 ტუალეტის აქსესუარები	კომპლ	2,00	30,00	60,00			360,00
14 უქანგავი ლითონის ნიჟარა ონკან და კარადით (ბუფეტის)	კომპლ	6,00	90,00	540,00			60,00
15 უქანგავი ლითონის ორიანი ნიჟარა ონკან კარადით (საერთო სამზარეულოსი)	კომპლ	1,00	90,00	90,00			540,00
16 ელექტროქურა	ც	2,00	500,00	1000,00			90,00
ჯამი	ლარი			12684,30		3000,00	1000,00
მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%					126,00
ჯამი	ლარი						380,53
ხედინალები ხარჯები	ლარი	6%					16190,83
ჯამი	ლარი						971,45
							17162,28



შ.პ.ს "პარნაგი"-ს

დირექტორი:



[Handwritten signature] /თ. შარტყიძე


ქალაქ რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობა (ტერიტორიის კეთილმოწყობა)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი შეკანონებები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) ბორდიურების მოწყობა									
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაერთი	მ3	8,03			10,00	80,34			80,34
2	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	206,00			2,10	432,60			432,60
	ბეტონი მ-200	მ3	8,03	90,00	723,06					723,06
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ3	0,12	80,00	9,89					9,89
	ბ) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
3	ტალახნარევი ხრეშოვანი მასისა და დზაიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით 15სმ=40სმ ა/თეიომცლებზე დატვირთვით 95%	მ3	323,00			1,00	323,00			323,00
4	ოვკე ხელით 5%	მ3	17,00			8,00	136,00			136,00
5	ნაშაღის გატანა ა/თეიომცლებით ნაქარში 5კმ მანძილზე	ტ	629,00					4,50	2830,50	2830,50
6	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ3	170,00			3,50	595,00			595,00
	ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ3	207,40	8,30	1721,42					1721,42
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ2	850,00	0,90	765,00					765,00
8	საფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით 0-5მმ სისქით 5სმ	მ3	42,50	13,00	552,50	3,00	127,50			680,00
	დაწნეხილი ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 8 სმ ქვიშაცემენტის ნარევეზე 2,5--3სმ	მ2	850,00			4,40	3740,00			3740,00
9	დაწნეხილი ბეტონის ფილა სისქით 8სმ ქვიშა	მ3	867,00	11,00	9537,00					9537,00
	ცემენტი მ-400	ტ	25,50	13,00	331,50					331,50
			5,10	168,00	856,80					856,80
	ბ) ტროტუარი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									



[illegible]

ბუქონი B-22,5	მ3	0,10	90,00	9,00					
ჯამი	ლარი			42438,72			10869,72		5791,73
მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%							
ჯამი	ლარი								
ზედნაღები ხარჯები	ლარი	6%							
ჯამი	ლარი								
									9,00
									59100,16
									1273,16
									60373,32
									3622,40
									63995,72

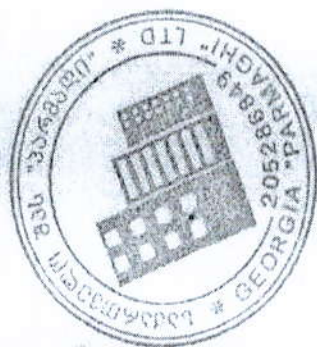

შ.პ.ს "კარმადი"-ს

დირექტორი:



ა. შ. შ. /თ. შარდია

ქალაქ რუსთავში ცურბრაველის ქუჩაზე მდებარე №10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი მშენებლობისათვის მიწის გაცემის შესახებ (ეკონომიკური განვითარების მინისტრის განცხადებით)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანკ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) შიდა ელექტრობა									
	ელექტრობის მონტაჟი	წერტი	214			15,00	3210,00			3210,00
	ლედბანელური 220-240ვ/50-60ჰერცი 32w/6400k (კორიდორში)	ც	11	32,00	352,00					352,00
	სანათი (ტიპი I) კიბის უჯრედში	ც	10	15,00	150,00					150,00
	სანათი (ტიპი II) ოთახებში	ც	118	25,00	2950,00					2950,00
	სანათი (ტიპი III) სველ წერტილებში	ც	21	8,00	168,00					168,00
1	ჩამორეკული ორიანი	ც	23	6,50	149,50					149,50
	ჩამორეკული ერთიანი	ც	31	6,50	201,50					201,50
	როზეტი	ც	101	6,50	656,50					656,50
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	155	0,50	77,50					77,50
	სპილენძის ელ კაბელი 2X1,5 (სანათებზე)	გრძ.მ	1200	0,90	1080,00					1080,00
	სპილენძის ელ კაბელი 2X2,5	გრძ.მ	600	1,40	840,00					840,00
	სპილენძის ელ კაბელი 4X2,5	გრძ.მ	300	3,50	1050,00					1050,00
2	ავტომატების ყუთი	ც	1	120,00	120,00					120,00
	ავტომატი 16ა	ც	12	8,00	96,00					96,00
	ბ) გარე განათება									
3	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების მოსაწყობად ა/ოკთმცდლებზე დატვირთვით	მ3	0,6			12,00	7,20			7,20
	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა ჩასატანებელი დეტალებით	მ3	0,6			20,00	12,00			12,00
	ბეტონი მ-300	მ3	0,61	118,00	72,22					72,22
4	ჩასატანებელი დეტალები	ც	6	5,00	30,00					30,00
5	განათების დეკორატიული ბოძების მონტაჟი	კომპლ	6	80,00	480,00					480,00
6	ტრანშეას დამოშავება ხელით ელ კაბელების ჩაწოლა და მიწის უკუმიყრა	მ3	10,2			12,00	122,40			122,40
7	პლასტმასის გოფირებული მილი Ø32	გრძ.მ	170	0,70	119,00					119,00
8	სპილენძის ელ კაბელი 2X6 სანათების კვებისათვის	გრძ.მ	170	4,20	714,00					714,00
9	სპილენძის ელ კაბელი 2X2,5 სანათების კვებისათვის	გრძ.მ	30	1,40	42,00					42,00
	ჯამი	ლარი			9348,22		3351,60			12699,82
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	3%							280,45



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE40227-17

25 მაისი 2017 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს პარმალი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 205286849

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ი.პეტრიწის ქ., №10, ბ. 36

ბენეფიციარი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 216433287

საგარანტო თანხა: 54,000 (ორმოცდათოთხმეტი ათასი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT170003968

შხედევლობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ. რუსთავში ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე #10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 54,000 (ორმოცდათოთხმეტი ათასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდის პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრით და სიტყვით, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან, მოთხოვნას თან უნდა ერთვის მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 25 მარტი 2019 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაკრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

მადრიცვებით:
ეთერ ჩხეიძე
გარანტიის საინსპექტორს უფროსი

