

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, ამხანაგობა „განთიადი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი თავმჯდომარის ზოია გუროვის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N480 და 2017 წლის 12 აპრილის N733 განკარგულებებით და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის N128 განკარგულების, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170004598 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „შესყიდვის ობიექტი“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - NAT170004598 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთევა ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი

- 2.1. ხელშეკრულების ობიექტია: ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა დანართი N1-ის, დანართი N2-ის და თანმდევი ნახაზების მიხედვით (CPV კოდი: 45200000);
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც დაერთევა ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი;
- 2.3. ტექნიკურ დავალებაში დაფიქსირებული ყველა მოწავეში, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები, მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 220 958.00 (ორასოციათას ცხრაასორმოცდათვრამეტი ლარი) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით;
- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

4. მიწოდების პირობები და ვადები

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ჩათვლით: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე;
- 4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2017 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), დადასტურებული შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ;
- 6.2. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტსა და შესრულებული სამუშაოს აქტ ფორმა N2-თან ერთად წარედგინება შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგაქტურა/სასაქონლო ზედნადები და ასფალტო-ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნა;
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის (საბოლოო) გაფორმებამდე მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).
- 6.4. შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), სამუშაოს დასრულების შემდგომ ექსპერტიზის დასკვნა, მიღება-ჩაბარების აქტი წარედგინება ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ;
- 6.5. ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ 6.1. პუნქტით გასაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფის თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის პროცესი, დასრულების შემდეგ).
- 6.6. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის 22 ივნისის N105 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

7. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

- 7.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 7.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.
- 7.3. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 7.4. შესრულებული სამუშაოების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში. რა პერიოდშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოჩენა, დეფექტის/ნაკლის აღმოჩენიდან არაუმეტეს 1 თვეში. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო მიყენებული ზიანის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 7.5. საგარანტიო პერიოდში დეფექტის/ნაკლის შედეგად შემსყიდველსა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8. ანგარიშსწორების პირობები

- 8.1. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ეროვნულ ვალუტაში, ეტაპობრივად, (დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 69.20%; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 30.80%), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;
- 8.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 80%-ის ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (მიღება-ჩაბარება, ფორმა N2, საგადასახადო ა/გაქტურა ან/და ზედნადები) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება იმავე წესით, ასფალტო ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნის და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი

ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს, ან/და სხვა აკრედიტებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას)).

8.3. საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება (არაუმეტეს 4 ეტაპი) ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 20%-ისა და არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით.

8.4. პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აუნაზღაურდება მხოლოდ პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ;

8.5. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

9.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;
- ბ) აანაზღაუროს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

- ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს შესყიდვის ობიექტების ჩამონათვალი, დააზუსტოს შესასრულებელ სამუშაოთა ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯამური ღირებულების ფარგლებში;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) დაიცვას შესასრულებელი სამუშაოების თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი, რომელიც გაწერილი იქნება 15 დღიან პერიოდებზე, გეგმა-გრაფიკის ბოლო ეტაპი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტს;
- ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში დაიწყოს სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- გ) ხელშეკრულების გაფორმებამდე შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებებში მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებლის პრეტენზია არ განიხილება.
- დ) სამუშაოს შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა;
- ე) სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში წარმოადგინოს ფოტოილუსტრაცია კონკრეტულ მონაკვეთზე სამუშაოების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ;
- ვ) სოფელ ქვემო ოსიურში გზის მოასფალტების სამუშაოები შეასრულოს ამხანაგობა „განთიადი“-ს თავმჯდომარის ზოია გუროვის 2017 წლის 5 ივნისის მომართვაში გაწერილი ვალდებულებების შესაბამისად;
- ზ) ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ 6.1. პუნქტით გასაზღვრული ინსპექტირების ჯგუფის თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის პროცესი, დასრულების შემდეგ);
- თ) მიწის სამუშაოების წარმოებისას საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის“ ხაშურის ფილიალის, შპს „საქართველოს რკინიგზის“, სს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ხაშურის სერვის ცენტრის, შპს „ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოტონიკი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-ქართლი“-ს პასუხისმგებელი წარმომადგენლების დასწრება;
- ი) საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული

ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამგეში ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამგეში პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

კ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

ლ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

მ) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებელი სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

10. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 4%-ის (თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში 2%) ოდენობით, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამგეში დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული

10.2. თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს პრეტენდენტს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

10.4. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო მოსალოდნელი რისკის თავიდან აცილების მიზნით, ხელშეკრულების 10.1. პუნქტის შესაბამისად, ტენდერში გამოიყენება გარანტიის მექანიზმი – მიმწოდებლის მიერ „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია №069929, გაცემული 2017 წლის 20 ივნისის სადაზღვევო კომპანია „უნიონი“-ს მიერ თანხით 8 838.32 (რვაათას რვაასოცდათვრამეტი ლარი და 32 თეთრი) ლარი, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 20 ივნისიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

11.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებითი განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

11.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

11.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

11.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ერთობლივი საქმიანობის (აშხანაგობის) მონაწილეები შემსყიდველი ორგანიზაციის წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად;

11.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით,

იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ს „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.7. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

11.8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

11.9. შემსყიდველი უფლებამოსილია გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების 10 დღეზე მეტი ვადით ჩამორჩენის შემთხვევაში (გარდა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული საბოლოო ეტაპისა) ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის ვადების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევ მხარეს დაეკისრება ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.6. პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა (პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე);

11.10. ერთობლივი საქმიანობის შეწყვეტა იწვევს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეწყვეტას. ამასთან, ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) მონაწილეები პასუხს აგებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეწყვეტით დამდგარი შედეგისთვის.

11.11. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ შეფერხების ფაქტის წარმოშობისას დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი

უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

16.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

16.2. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი;

16.3. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის ან/და პირების დასკვნის საფუძველზე მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

16.4. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

16.5. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და კონტროლის ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული ქონების ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17. ქვეკონტრაქტორები

17.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (ქვეკონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება შეთანხმების სახით, წერილობითი ფორმით და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

17.2. მიმწოდებელმა მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს ქვეკონტრაქტორების საკვალიფიკაციო მონაცემები.

17.3. მესამე მხარეების მიერ მიმწოდებლის წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების დაწყების შემთხვევაში, შემსყიდველს მათთან დაკავშირებით არ ეკისრება არანაირი ფინანსური პასუხისმგებლობა.

18. სხვა პირობები

18.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად (სამი „შემსყიდველს“, ერთი „მიმწოდებელს“), რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერილ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

18.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

18.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

18.7. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

19. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ბ.ა.



მიმწოდებელი:

ამხანაგობა „განთიადი“

ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,

დიდმის მასივი, VI კვ., III კორპ., ბინა N12;

სს „საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22;

ა/ა GE35BG0000000236783000; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ამხანაგობა „განთიადი“-ს თავმჯდომარე

ზოია გუროვი



ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის მოასფალტების
სამუშაოების შესყიდვა

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტია: ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის მოასფალტების სამუშაოების შესყიდვა.
2. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.
- 2.2. შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა N2) შეიტანება მხოლოდ იმ სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარისხიც აკმაყოფილებს სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.
- 2.3. შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირები ხელის მოწერით ადასტურებენ შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობას სატენდერო მოცულობებთან და ღირებულებებთან.
- 2.4. ობიექტზე სამუშაოების დამთავრება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც ფორმდება შემსყიდველი ორგანიზაციის ინსპექტორების ჯგუფის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე;
- 2.5. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოებზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მოხსენებითი ბარათის, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, ასფალტო-ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნის და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედანდები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.
- 2.6. პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებებში მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე პრეტენზია არ განიხილება.
- 2.7. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის განმავლობაში დაიწყოს სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 2.8. სამუშაოს შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა;
- 2.9. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ფოტოვიზუალური კონკრეტულ მონაკვეთზე სამუშაოების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ;
- 2.10. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.
- 2.11. ასფალტო-ბეტონის ნიმუშის აღების ან/და სამშენებლო მოედანზე ექსპერტიზის ჩატარების პროცესი უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით.
- 2.12. მიმწოდებელი ვალდებულია მიწის სამუშაოების წარმოებისას საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის“ ხაშურის ფილიალის, შპს „საქართველოს რკინიგზის“, სს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ხაშურის სერვის ცენტრის; შპს „ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-ქართლი“-ს პასუხისმგებელი წარმომადგენლების დასწრება;
- 2.13. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის ლაბორატორიული დასკვნა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა

წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას).

2.14. საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება (არაუმეტეს 4 ეტაპი) ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 20%-ისა და არაუმეტეს 80%-ის ოდენობით.

3. საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ჩათვლით; ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე;

4. მიწოდების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

5. შესრულებული სამუშაოების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში. რა პერიოდშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა, დეფექტის/ნაკლის აღმოჩენიდან არაუმეტეს 1 თვეში. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო მიყენებული ზიანის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6. პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში (2014 წლის 26 აპრილიდან 2015, 2016 წლების და მიმდინარე წლის 26 აპრილამდე) განხორციელებული უნდა ქონდეს მინიმუმ 1 500 000 ლარის ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები და ამავე პერიოდში ერთი დასრულებული ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ქონდეს არანაკლებ 300 000 ლარის სამუშაოები (საავტომობილო გზების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია), რაზეც უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გაცემული დადებითი რეკომენდაცია, (რეკომენდაციის მოთხოვნა არ ვრცელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე, ასეთ შემთხვევაში სატენდერო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას სამუშაოების შესრულების ხარისხისა და ვადების გათვალისწინებით), ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N2-ის შესაბამისად. დანართი N2-ში მითითებულ თითოეულ სამუშაოზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტები პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ნოტარიული წესით დამოწმებული);

7. პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ, პრეტენდენტს საკუთრებაში, იჯარით, ქირით ან/და ლიზინგით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

8.

N	დასახელება	რაოდენობა	განზომილება
1	ავტოგრეიდერი	1	ცალი
2	კომპრესორი	1	ცალი
3	სანგრევი ჩაქურჩი	2	ცალი
4	ასფალტდამგები	1	ცალი
5	ექსკავატორი	1	ცალი
6	სატკეპნი პნევმატური	1	ცალი
7	სატკეპნი ვიბრაციული	1	ცალი
8	საგზაო ფრეზი	1	ცალი
9	ავტოთვიტმცლელი	2	ცალი
10	ელექტროვიბრატორი	2	ცალი

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის საკუთრების, იჯარის, ქირის ან/და ლიზინგის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ტექნიკურ პასპორტთან ერთად) ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. იჯარის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

9. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან იჯარით უნდა გააჩნდეს ასფალტო-ბეტონის ქარხანა ან/და წარმოადგინოს ასფალტო-ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო-ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან იჯარის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. იჯარის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან ხელშეკრულების ვადა უნდა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადას.

10. პრეტენდენტს უნდა ჰქავდეს არანაკლებ ორი თანამშრომელი, რომელსაც ექნება შესაბამისი სამუშაოების შესრულების გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რაზეც უნდა წარმოადგინოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ელექტრონული სისტემის საშუალებით. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი N2-ის შესაბამისად.

11. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი, რომელიც გაწერილი იქნება 15 დღიან პერიოდებზე, გეგმა-გრაფიკის ბოლო ეტაპი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტს, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში: შემსყიდველი უფლებამოსილია გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების 10 დღეზე მეტი ვადით ჩამორჩენის შემთხვევაში (გარდა გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული საბოლოო ეტაპისა) ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
12. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. რაზეც შემსყიდველს უფლება აქვს, მოითხოვოს შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
13. სატენდერო დოკუმენტაციის გაფასებული ცხრილი N1 ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იქნას (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) პრეტენდენტი იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიერ ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ (უფლებამოსილი პირის შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება). გაფასებული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას).
14. თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად სამუშაოების განხორციელების შესაძლებლობა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას). პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი ვადის შესაბამისად, არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში, ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
15. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 4%-ის (თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში 2%) ოდენობით, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული.
16. თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოითხოვოს პრეტენდენტს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
17. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

ხელშეკრულება N105-ის დანართი N1

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის მოასფალტება

ცხრილი N1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატიული ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I მიწის სამუშაოები										
1	ტალახოვანზრეშოვანი, სავალი ნაწილის ზედა ფენის, გვერდულზე არსებული გრუნტის და სამშენებლო ნაგვის მოხსნა ბულდოზერით, 30 მ-ზე შეგროვებით	100მ³		7						1005.9	1005.9
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0	0							
	ბულდოზერი 59კვტ (80 ცხ.ძ)	მან/სთ	4.79	33.53					30	1005.9	1005.9
	სხვა მანქანები	ლარი	0	0							
2	მოგროვილი გრუნტის დატვირთვა შეგროვება ექსკავატორით V-0,583 შეგროვება	100მ³		7				54.250		1461.79	1516.039
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.55	10.85			5	54.25			54.25
	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V-0,583	მან/სთ	3.47	24.29					60	1457.4	1457.4
	სხვა მანქანები	ლარი	0.209	1.463					3	4.39	4.39
3	გრუნტის გაზიდვა ნაყარში 3კმ-მდე	ტნ	165	1155					3	3465	3465
	ჯამი:	ლარი						54.25		5932.69	5986.94
	II საგზაო სამოსი										
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	100მ³		3.2		2364.8		240		819.2	3424
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15	48			5	240			240
	ავტოგრიდერი 79კვტ(108 ცხ.ძ)	მან/სთ	2.16	6.912					50	345.6	345.6
	სატკეპნი საგზაო პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	2.73	8.736					40	349.44	349.44
	მოსარწყავ-მოსარევი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	0.97	3.104					40	124.16	124.16
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	122	390.4	6	2342.4					2342.4
	წყალი	მ3	7	22.4	1	22.4					22.4

2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქ 10სმ, დატკეპვით და წყლით მორწყვით კ=1,26	1000მ²	5.04	6374.59	831.60	8680.39	15886.58
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	33	166.32	5	831.6	831.6
	ავტოგრეიდერი 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მან/სთ	1.91	9.6264		50	481.32
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მან/სთ	11.2	56.448		40	2257.92
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	24.8	124.992		40	4999.68
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	4.14	20.8656		40	834.624
	ქვის წამტრევეზის მანაწილებელი	მან/სთ	0.53	2.6712		40	106.848
	ფრაქციული ღორღი	მ3	126	635.04	9.8	6223.39	6223.39
	წყალი	მ3	30	151.2	1	151.2	151.2
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/მ2	ტნ	3.02	3110.6		27.18	3137.78
	ავტოგულდრონატორი 3500 ლ	მან/სთ	0.3	0.906		30	27.18
	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	3.1106	1000	3110.6	3110.6
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით 15-სმ.	1000მ²	5.04	58938.516	952.06	3779.50	63670.07
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.78	190.4112	5	952.056	952.056
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მან/სთ	3.7	18.648		40	745.92
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	11.1	55.944		40	2237.76
	ასფალტბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	15.2208		50	761.04
	სხვა მანქანები	ლარი	2.3	11.592		3	34.776
	ასფალტბეტონი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	139.5	703.08	83.5	58707.18	58707.18
	სხვა მასალა	ლარი	15.3	77.112	3	231.336	231.336
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,4კგ/მ2	ტნ	2.02	2080.6		18.18	2098.78
	ავტოგულდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	0.3	0.606		30	18.18
	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	2.0806	1000	2080.6	2080.6
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით სისქ.4სმ	1000მ²	5.04	44805.80	945.00	4092.48	49843.28
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.5	189	5	945	945

	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მან/სთ	3.7	18.648				40	745.92	745.92
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	11.1	55.944				40	2237.76	2237.76
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	15.2208				50	761.04	761.04
	მანქანები	ლარი	2.3	11.592				30	347.76	347.76
	ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	97.7	492.408	90.548	44586.560				44586.56
	სხვა მასალა	ლარი	14.5	73.08	3	219.24				219.24
	გვერდულების ღორღის საფუძვლის მოწყობა დატკეპვით სისქ.15სმ	მ²		1739		3192.39		373.02	851.59	4416.99
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0429	74.6031			5	373.02		373.02
	ავტოგრეიდერი 79კვტ(108 ცხ.ძ)	მან/სთ	0.00269	4.67791				50	233.90	233.90
7	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	0.0074	12.8686				40	514.744	514.74
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	0.00148	2.57372				40	102.9488	102.95
	ღორღი (0-40 მმ) კ= 1.22	მ3	0.1862	323.8018	9.8	3173.26				3173.26
	წყალი	მ3	0.011	19.129	1	19.13				19.13
	მიერთებები მარცხნივ									
	არსებული საფუძვლის მოჭრა გრეიდერით და მოგროვება	100მ²		0.53				37.895	65.05	102.95
1	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	14.3	7.579			5	37.895		37.895
	ავტოგრეიდერი 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მან/სთ	2.39	1.2667				50	63.335	63.335
	სხვა მანქანები	ლარი	1.08	0.5724				3	1.7172	1.7172
	მოგროვილი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ³ ავტოთვითმცლელზე	100მ³		0.53				4.1075	110.678	114.786
2	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.55	0.8215			5	4.1075		4.1075
	ექსკავატორი პნევმოთელიან სვლაზე V-0,5მ³	მან/სთ	3.47	1.8391				60	110.35	110.346
	სხვა მანქანები	ლარი	0.209	0.11077				3	0.33	0.33
3	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში ჯემ-მდე	ტნ	165	87.45				5	437.25	437.25
	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	100მ²		0.23		169.97		17.25	58.88	246.10
4	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15	3.45			5	17.25		17.25
	ავტოგრეიდერი 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მან/სთ	2.16	0.4968				50	24.84	24.84

	სატკეპნი საგზაო პნევმოსელაზე 18ტ	მან/სთ	2.73	0.6279				40	25.12	25.12
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	0.97	0.2231				40	8.924	8.924
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	122	28.06	6	168.36				168.36
	წყალი	მ3	7	1.61	1	1.61				1.61
5	საფუძელის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (20-40მმ) ხ-10სმ.	1000მ²		0.263		371.30		43.395	452.96	867.66
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33	8.679			5	43.395		43.395
	ავტოგრიდერი 79კვტ(108 ცხ.ძ)	მან/სთ	1.91	0.50233				50	25.12	25.12
	საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მან/სთ	11.2	2.9456				40	117.82	117.82
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	24.8	6.5224				40	260.90	260.90
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	4.14	1.08882				40	43.55	43.55
	ქვის მანაწილებელი მანქანა	მან/სთ	0.53	0.13939				40	5.58	5.58
	ღორღი ფრაქციული (0-40მმ)	კუბ/მ	141	37.083	9.8	363.41				363.41
6	წყალი	კუბ/მ	30	7.89	1	7.89				7.89
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6კვ/მ²	ტნ		0.158		162.74			1.42	164.162
	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	0.3	0.0474				30	1.422	1.422
7	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	0.16274	1000	162.74				162.74
	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით ხ-5სმ.	1000მ²		0.263		2565.76		49.50	197.22	2812.48
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.64	9.89932			5	49.50		49.50
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მან/სთ	3.7	0.9731				40	38.92	38.92
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	11.1	2.9193				40	116.77	116.77
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	0.79426				50	39.71	39.71
	სხვა მანქანები	ლარი	2.3	0.6049				3	1.815	1.815
	ასფალტობეტონი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	116.3	30.5869	83.5	2554.01				2554.01
8	სხვა მასალა	ლარი	14.9	3.9187	3	11.7561				11.7561
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,4კვ/მ²	ტნ		0.105		108.15			0.95	109.095
	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	0.3	0.0315				30	0.945	0.945

	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	0.10815	1000	108.15				108.15
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით სისქ.3სმ	1000მ²		0.263		1756.700	49.13		197.22	2003.05
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.36	9.82568			5	49.128		49.128
9	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	მან/სთ	3.7	0.9731				40	38.92	38.92
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	11.1	2.9193				40	116.77	116.77
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	0.79426				50	39.71	39.71
	სხვა მანქანები	ლარი	2.3	0.6049				3	1.815	1.815
	ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	73.3	19.2779	90.548	1745.575				1745.575
	სხვა მასალა	ლარი	14.1	3.7083	3	11.1249				11.125
	მირთვები (მარჯვნივ)									
1	არსებული საფუძვლის მოჭრა გრეიდერით და მოგროვება	1000მ²		0.43			30.745		52.78	83.52
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	14.3	6.149			5	30.745		30.745
	ავტოგრეიდერი 79 კპტ (108 ცხ.ძ)	მან/სთ	2.39	1.0277				50	51.385	51.385
	სხვა მანქანები	ლარი	1.08	0.4644				3	1.3932	1.3932
2	მოგროვილი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით V-0,5მ3 ავტოთვითმძღვლელებზე	1000მ³		0.43			3.33		89.80	93.14
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.55	0.6665			5	3.3325		3.3325
	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V-0,5მ3	მან/სთ	3.47	1.4921				60	89.526	89.526
	სხვა მანქანები	ლარი	0.209	0.08987				3.08	0.277	0.277
3	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 5კმ-მდე	ტნ	165	70.95				5	354.75	354.75
4	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	1000მ³		0.22		162.58	16.5		56.32	235.4
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15	3.3			5	16.5		16.5
	ავტოგრეიდერი 79კვტ(108 ცხ.ძ)	მან/სთ	2.16	0.4752				50	23.76	23.76
	სატკეპნი საგზაო პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	2.73	0.6006				40	24.024	24.024
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	0.97	0.2134				40	8.536	8.536
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	122	26.84	6	161.04				161.04
	წყალი	მ³	7	1.54	1	1.54				1.54

5	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0- 40მმ) h-10სმ.	1000მ²	0.217		306.36		35.81		373.74	715.90
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	33	7.161		5	35.805			35.81
	ავტოგრიდერი 79კვტ.	მან/სთ	1.91	0.41447				50	20.72	20.72
	საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მან/სთ	11.2	2.4304				40	97.22	97.22
	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10ტ	მან/სთ	24.8	5.3816				40	215.26	215.26
	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	4.14	0.89838				40	35.94	35.94
	ქვის მანაწილებელი მანქანა	მან/სთ	0.53	0.11501				40	4.60	4.60
	ღორღი ფრაქციული (0- 40)	მ3	141	30.597	9.8	299.85				299.85
6	წყალი	მ3	30	6.51	1	6.51				6.51
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/მ²	ტნ		0.13		133.9			1.17	135.07
	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	0.3	0.039				30	1.17	1.17
7	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	0.1339	1000	133.9				133.9
	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით h-5სმ.	1000მ²	0.217		2117.00		40.84		162.93	2320.77
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.64	8.16788		5	40.8394			40.84
	სატკეპნი მანქანა 5ტ	მან/სთ	3.7	0.8029				40	32.12	32.12
	სატკეპნი თვითმ. გლუვი 10ტ.	მან/სთ	11.1	2.4087				40	96.35	96.35
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	0.65534				50	32.77	32.77
	სხვა მანქანები	ლარი	2.3	0.4991				3.4	1.70	1.70
	ასფალტობეტონი მსხვილმარცვლოვანი	ტნ	116.3	25.2371	83.5	2107.30				2107.30
8	სხვა მასალა	ლარი	14.9	3.2333	3	9.70				9.70
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,4კგ/მ²	ტნ		0.087		89.61			0.78	90.39
	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	0.3	0.0261				30	0.783	0.783
9	ბიტუმის ემულსია	ტნ	1.03	0.08961	1000	89.61				89.61
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით სისქ.3სმ	1000მ²	0.217		1449.44		40.54		162.93	1652.91
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.36	8.10712		5	40.5356			40.54
	საგზაო მტკეპნავი თვითმ. გლუვი 5ტ.	მან/სთ	3.7	0.8029				40	32.12	32.12

სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი I0ტ	მან/სა	11.1	2.4087					40	96.35	96.35
ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სა	3.02	0.65534					50	32.77	32.77
სხვა მანქანები	ლარი	2.3	0.4991					3.4	1.70	1.70
ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი	ტნ	73.3	15.9061	90.548	1440.266					1440.266
სხვა მასალა	ლარი	14.1	3.0597	3	9.179					9.179
ჯამი:					130260.81		3710.70		21045.36	155016.87
ჯამი I+II:					130 260.81		3 764.95		26 978.04	161 003.81
მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	%		3							3 907.82
ჯამი:										16 4911.63
ზედნადები ხარჯები	%		6							9 894.70
ჯამი:										174 806.33
გეგმიური დაგროვება	%		4							6 992.25
ჯამი:										181 798.58
*გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%		3							5 453.96
ჯამი:										187 252.54
დღგ	%		18							33 705.46
სულ ჯამი დღგ-ს გათვალისწინებით										220 958.00

შენიშვნა:

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი
გიორგი გურასპაშვილი



მიმწოდებელი:

ამხანაგობა „განთიადი“-ს
თაემჯდომარე
ზოია გუროფი



ხელშეკრულება N105-ის დანართი N2

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ოსიაურში გზის მოასფალტების

სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

1	სამუშაოს დასახელება	საერთო ღირებულება (ლარი)	1-15 დღე	16-30 დღე	31-45 დღე
			ღირებულება	ღირებულება	ღირებულება
2	3	4	5	6	
1	მიწის სამუშაოები	5986.94	2000.00	3986.94	
2	საგზაო სამოსი	155 016.87		143 992.87	11 024.00
3	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	3 907.82		2 907.82	1 000.00
	ჯამი	164 911.63	2000.00	150 887.63	12 024.00
	ზედნაღები ხარჯები 6%	9 894.70	120.00	9 053.26	721.44
	ჯამი	174 806.33	2 120.00	159 940.89	12 745.44
	გეგმიური დაგროვება 4%	6 992.25	84.40	6 397.64	509.82
	ჯამი	181 798.58	2 204.80	166 338.52	13 255.26
	* გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	5 453.96			5 453.96
	ჯამი	187 252.54	2 204.80	166 338.52	18 709.22
	დღგ 18%	33 705.46	396.86	29 940.93	3 367.66
	სულ ჯამი:	220 958.00	2 601.66	196 279.46	22 076.88

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

გიორგი გურასპაშვილი




მიმწოდებელი:

ამხანაგობა „განთიადი“-ს
თავმჯდომარე

ზოია გუროვი




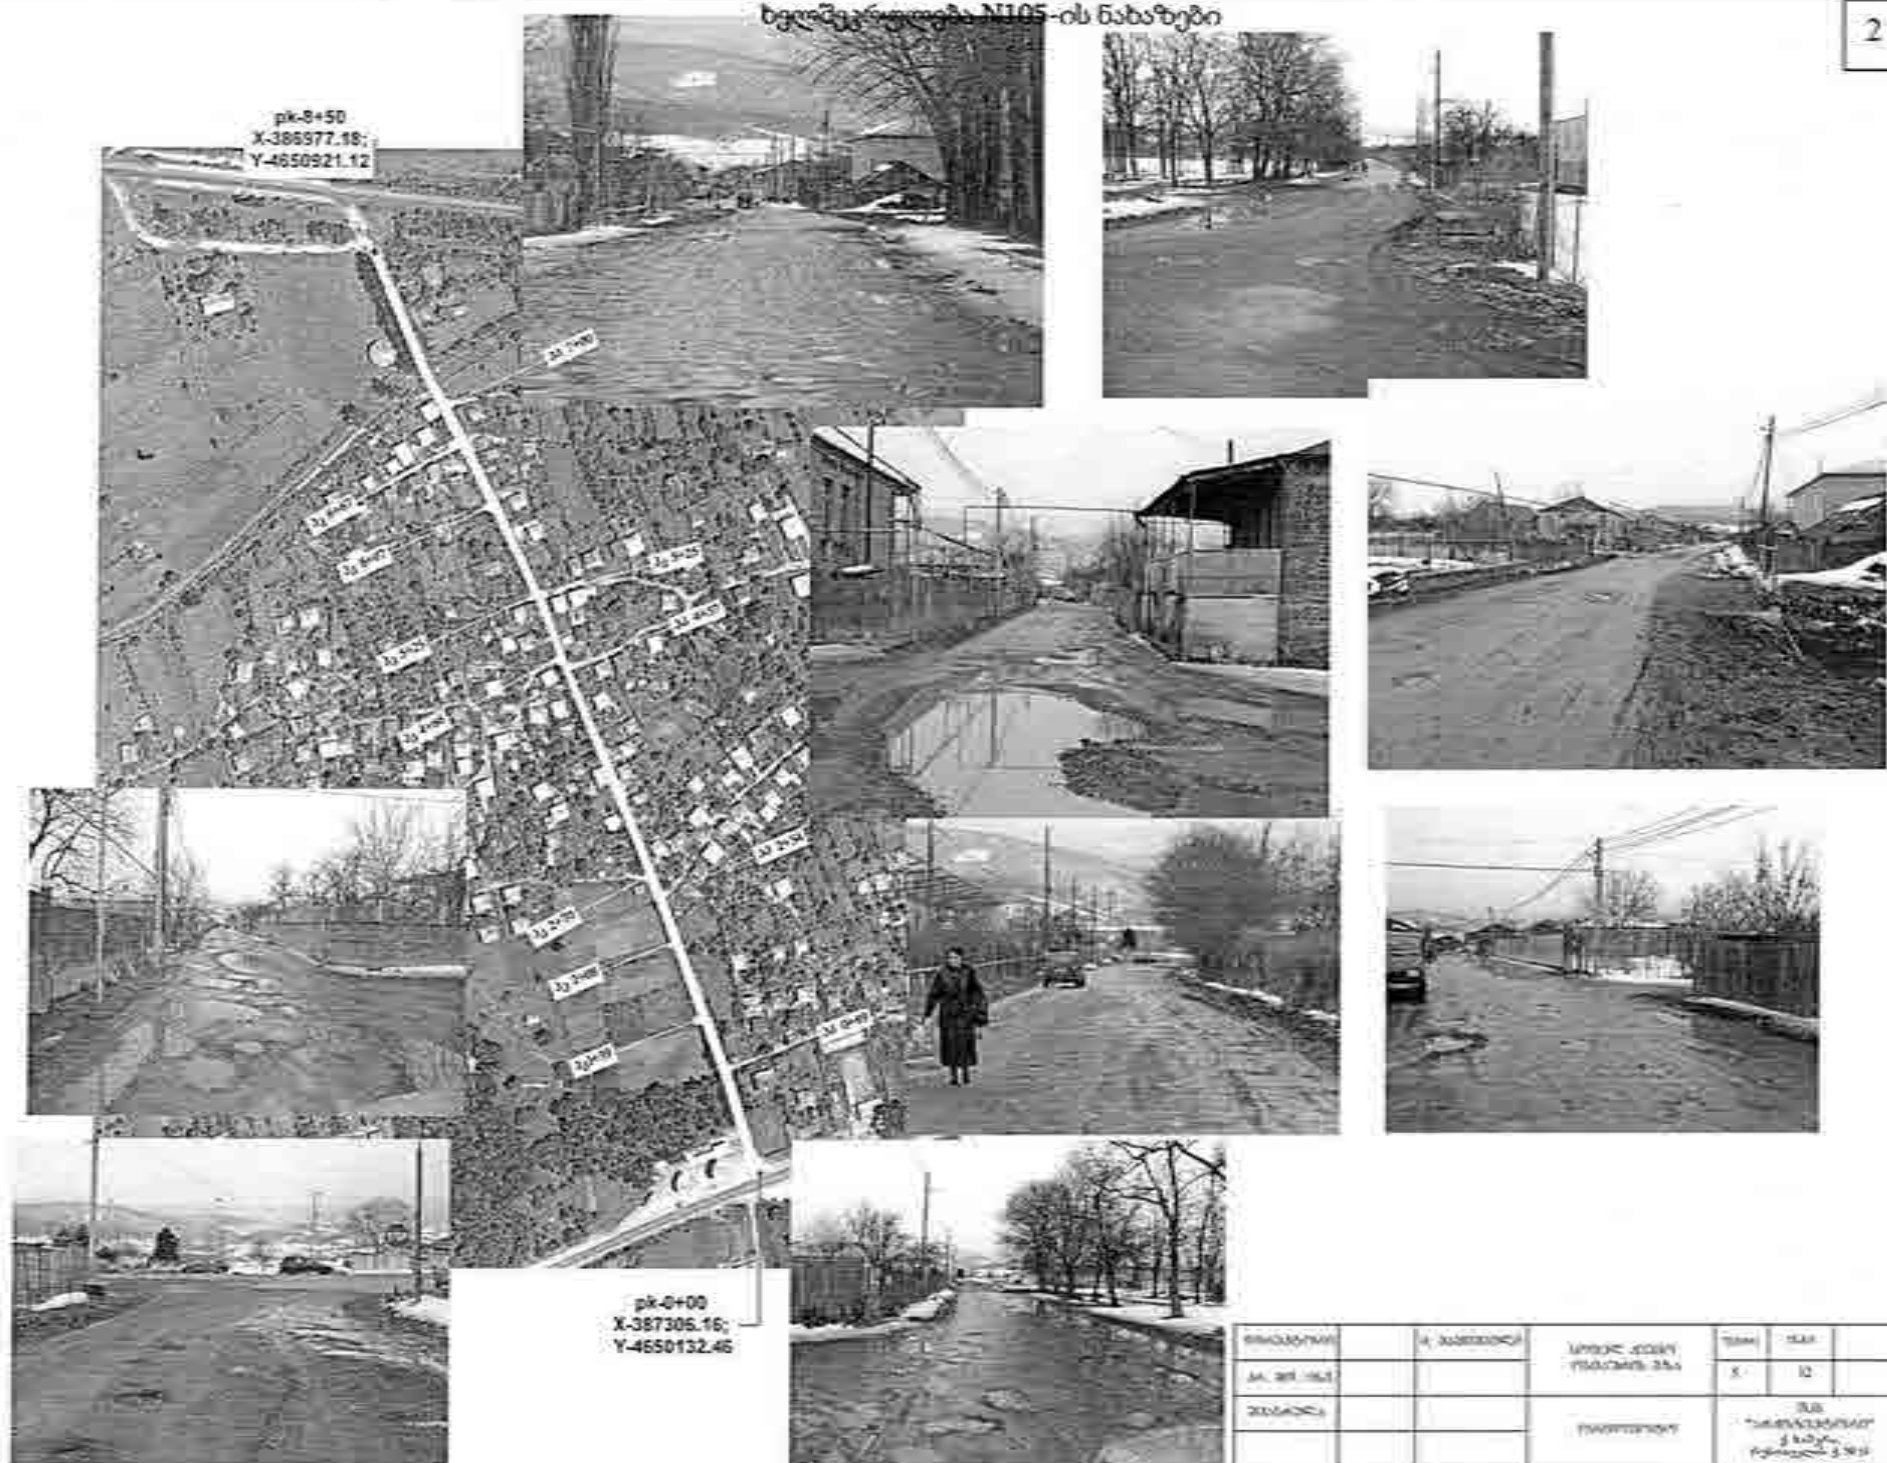

pk-8+50
X-386977.18;
Y-4650921.12

pk-0+00
X-387306.16;
Y-4650132.46


მნიშვნელობა	დ. პოლიტიკა	საქონლის მფლობელი	ფაქტ	მნიშვნელობა
მ. მ. მ. მ.			8	12
მნიშვნელობა		მნიშვნელობა	მნიშვნელობა	
			მნიშვნელობა	

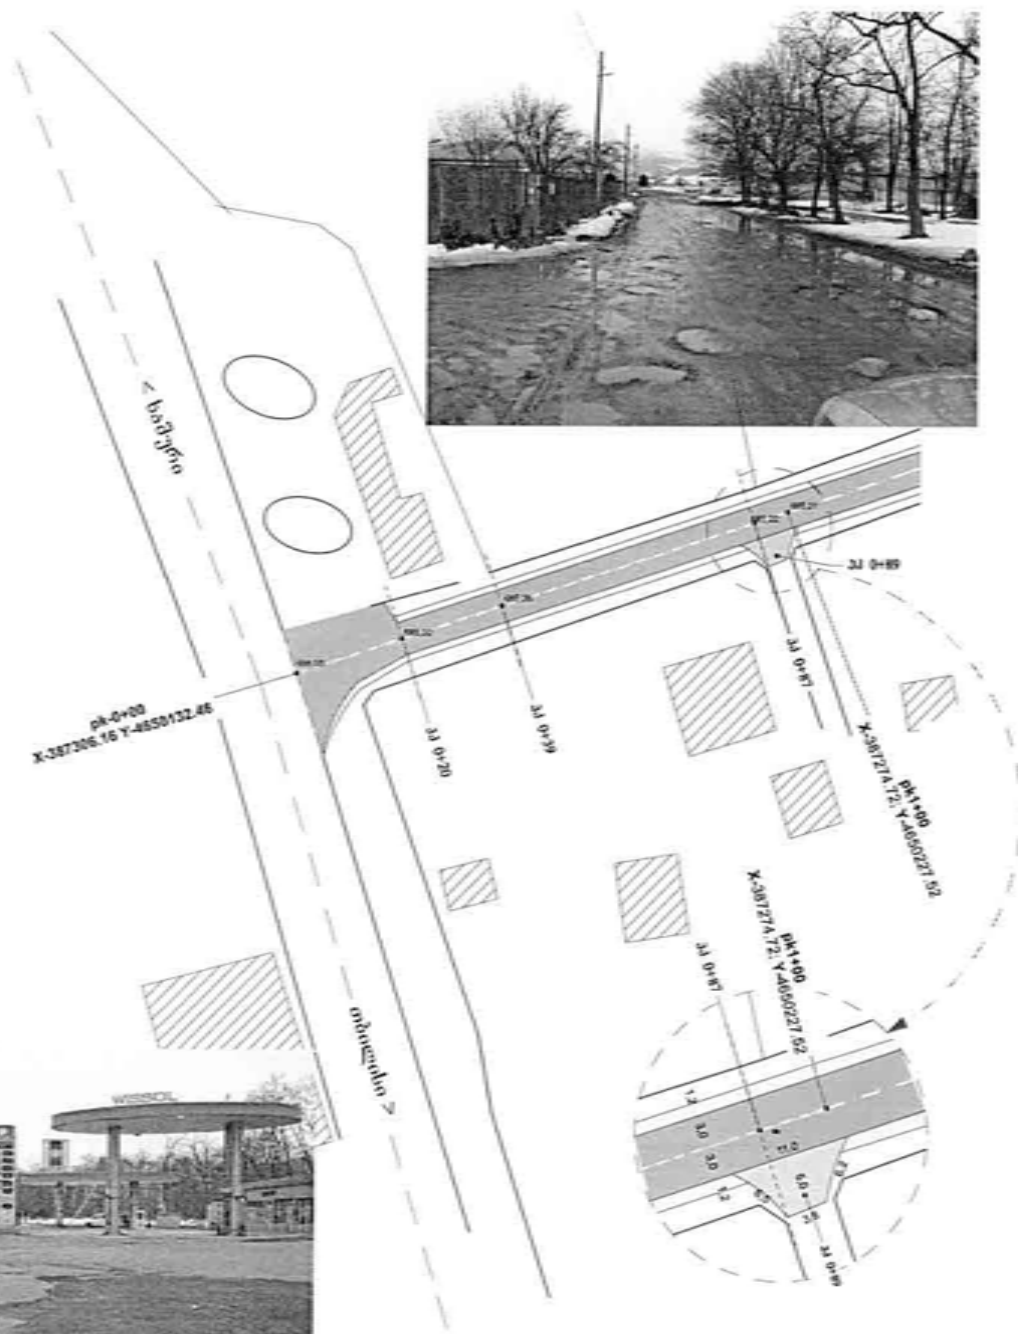



ПОСЛЕДСТВИЯ РАБОТ




НАИМЕНОВАНИЕ	К. КОЛИЧЕСТВО	МЕТ. РАБОТ ПОДЪЕЗДОВ, МЕТ. РАБОТ ПОДЪЕЗДОВ	ТОП. РАБ.	ИТОГ
А. РАБ. ПОДЪЕЗДОВ			3	12
РАБОТЫ				
		133.84		33

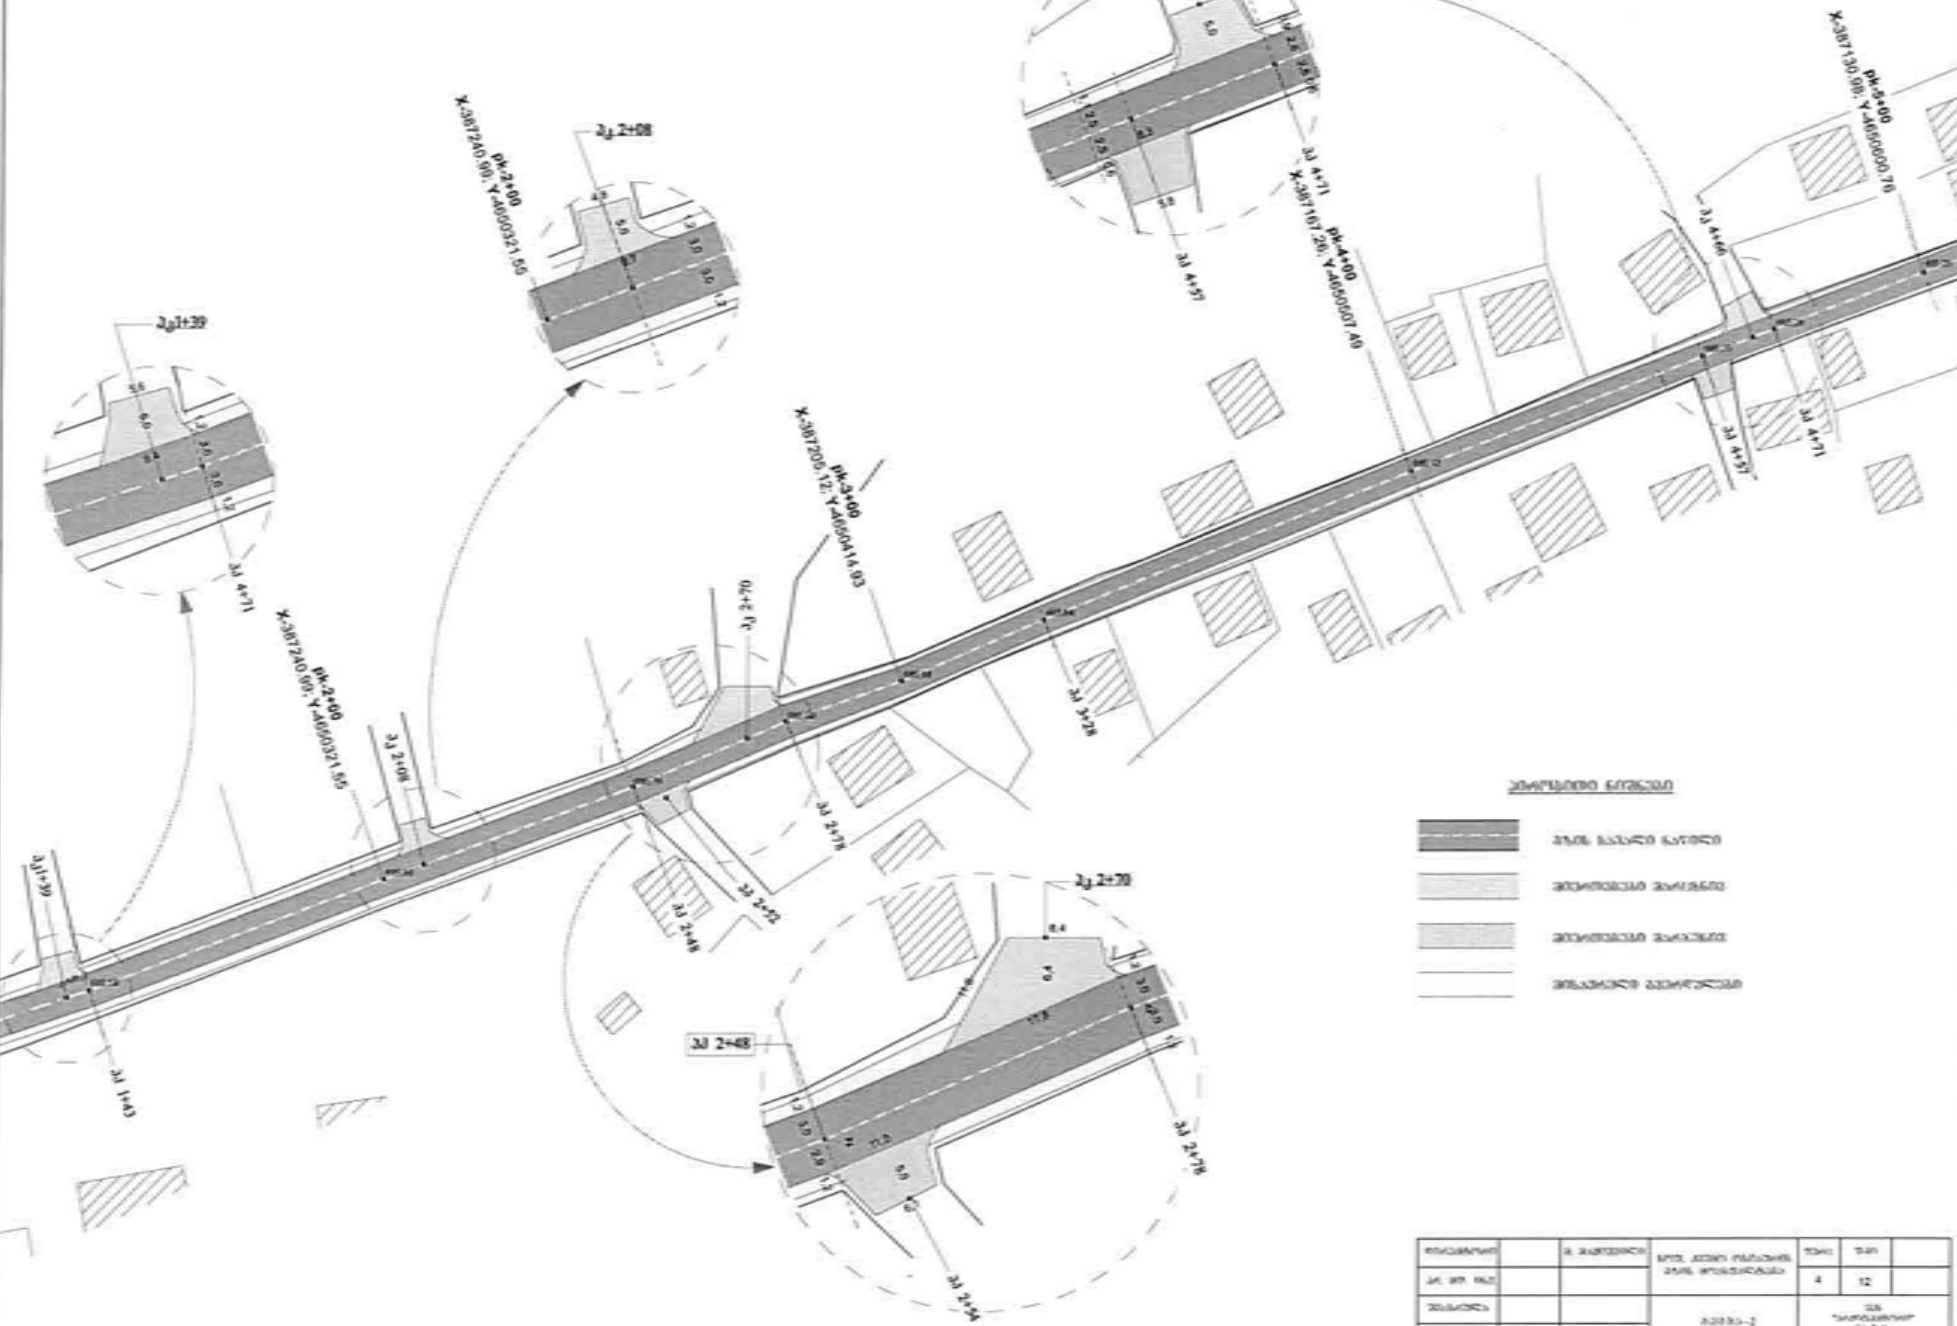



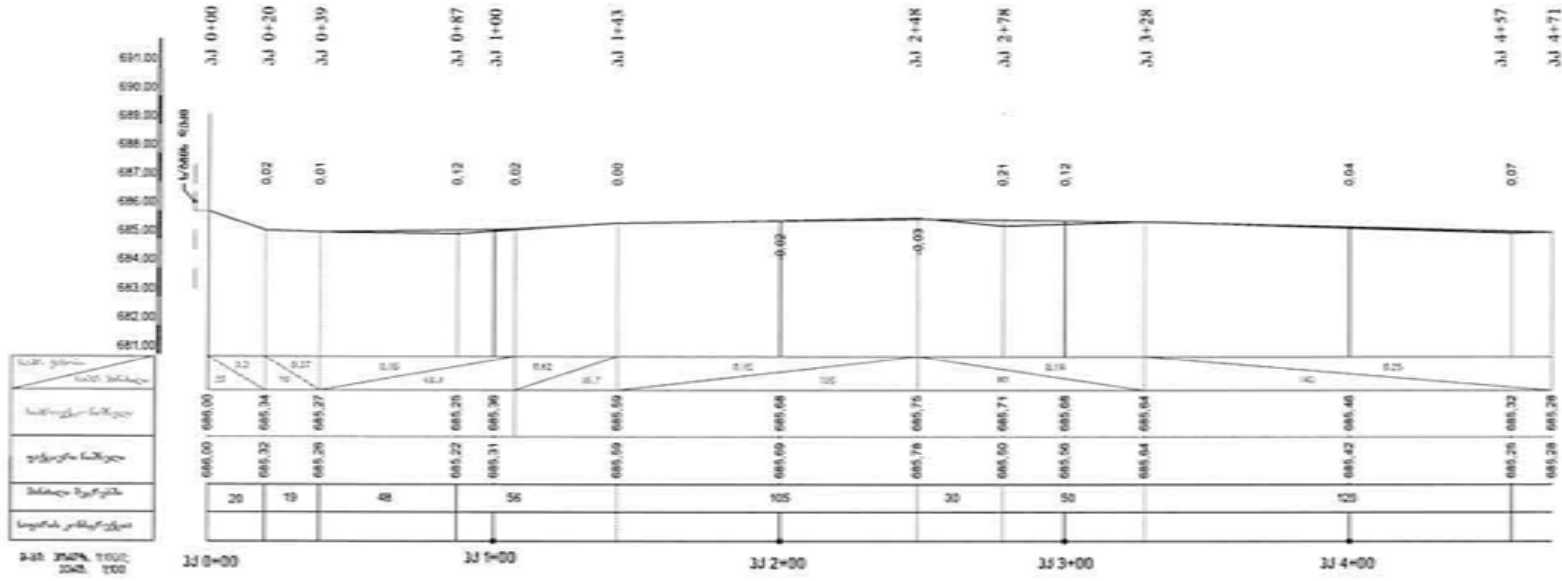


مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي

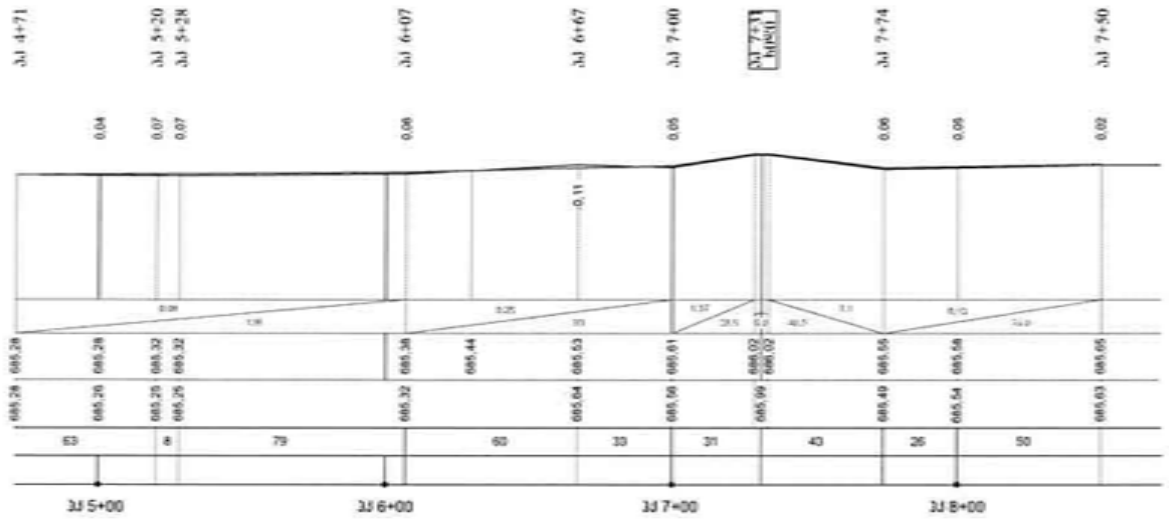


مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي
مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي	مقطع عرضي

3.3 0+20




33 H-43




33 3+28



33 0+39




3d 2+48



33 4-57




33 0+87



33 2+78



33 4+71




අනුප්‍රාප්තිකයා	2. ප්‍රාග්ධනමය	විද්‍යා, සෞඛ්‍ය සහ පරිසර මාලිකා, ප්‍රවෘත්තිමය ප්‍රවේශය	පිටුව 7	පිටුව 12	
ප්‍රාග්ධනමය		ප්‍රාග්ධනමය ප්‍රවේශය	සහ "ප්‍රාග්ධනමය" යන පදයෙන් යුක්තව		


3J 5+20




3J 6+67




3J 7+74



3J 5+28




3J 7+00



3J 8+50



3J 6+07




3J 7+31

მოსი



განმარტებული	მ. შავერდიაძე	ს/პ. შავერდიაძე	მ/შ. შავერდიაძე	მ/შ. შავერდიაძე	მ/შ. შავერდიაძე
პ. შ. შ. შ.				8	12
შეამოწმა			შ. შ. შ.	შ. შ. შ.	
				შ. შ. შ.	

საფარი საფარი, კონკრეტული
 კმ 0+00 - კმ 3+00, 5+20-8+50,



საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული (ნარევი სისქ. 10სმ)
 საფარის ზედა ფენა ფრეზირებული ღორღი (0.400) სისქ. 10სმ
 საფარის ფენის სისქე 10" 400გრ.
 საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული ფრეზირებული
 ანუ, ცხელი ნარევი ცილა - " მარკა II სისქ. 6 სმ
 საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული ფრეზირებული
 ანუ, ცხელი ნარევი ცილა - " მარკა II სისქ. 4 სმ

შენიშვნა: საფარის სისქე 1000სმ						
მ.	საფარის ფენის	საფარის სისქე	საფარის სისქე	საფარის სისქე	საფარის სისქე	საფარის სისქე
1	საფარის ქვედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
2	საფარის ზედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
3	საფარის ქვედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
4	საფარის ზედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
5	საფარის ქვედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
6	საფარის ზედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
7	საფარის ქვედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ
8	საფარის ზედა ფენა	10სმ	-	-	-	10სმ

საფარი საფარი, კონკრეტული
 კმ 3+00 - კმ 5+20,



საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული (ნარევი სისქ. 10სმ)
 საფარის ზედა ფენა ფრეზირებული ღორღი (0.400) სისქ. 10სმ
 საფარის ფენის სისქე 10" 400გრ.
 საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული ფრეზირებული
 ანუ, ცხელი ნარევი ცილა - " მარკა II სისქ. 6 სმ
 საფარის ქვედა ფენა ქვიშა-გრუნტული ფრეზირებული
 ანუ, ცხელი ნარევი ცილა - " მარკა II სისქ. 4 სმ

მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.
მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.
მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.
მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.	მ.პ.პ.პ.

30706 3-200006 20720006 207000 201

№	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201		KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
		207000	207000					
1	0.85	00	5+20	520	8.5	4420	10	442.0
2		5+20	5+30	10	8.5	85	20	17.0
3		5+30	7+25	195	7.2	1411	10	141.1
4		7+33	8+50	117	8.4	983	10	98.3
KAKTAPYBAY 201				843		6899		689.4

30706 3-200006 20720006 207000 202

№	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201		KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
		207000	207000										
		207000	207000										
1	0.85	0+00	0+20	20	14.0	280	14.0	280	10	28			
2		0+20	2+78	258	8.0	1548	8.0	1548	10	154.8			
3		2+78	3+00	22	5.5	121	5.5	121			20	24.2	
4		3+00	5+20	220	5.8	1100	5.8	1100	10	110	10	110.0	
5		5+20	7+22	242	8.0	1212	8.0	1212	10	121.2	10	121.2	
6		7+22	7+28	17	8.85	110	8.85	110	10	11.3			
7		7+28	8+50	115	5.0	585	5.0	585	10	58.5	10	58.5	
KAKTAPYBAY 201				850		5040		5040	402			322.00	

30706 3-200006 20720006 207000 203

№	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
1	0+00	5	5.8	29.0			0.020	34	34.0	10	3.4	20	6.8
2	2+78	5	5.7	28.5	10	2.85	0.017	28.5	28.5	10	2.85	20	5.7
3	2+78	5	7.0	35.0	10	7.0	0.045	35	35.0	10	7.0	20	14
4	4+00	5	5.9	29.5	10	3.45	0.021	34.5	34.5	10	3.45	20	6.9
5	5+20	5	7	35.0	10	7.0	0.021	35	35.0	10	7.0	20	14
6	7+22	5	5.4	27.0	10	2.7	0.019	27	27.0	10	2.7	20	5.4
7	7+28	5	5.8	29.0	10	2.9	0.017	29	29.0	10	2.9	20	5.8
KAKTAPYBAY 201				260		25	0.058	260	260		26.00		53
KAKTAPYBAY 201				260		25	0.058	260	260		26.00		53
8	0+00	5	7	35.0	10	7.0		35.0	35.0	10	7.0	20	14
9	2+78	5	7.8	39.0	10	7.8		39.0	39.0	10	7.8	20	15.6
10	4+00	5	8.4	42.0	10	8.4		42.0	42.0	10	8.4	20	16.8
11	5+20	5	7.8	39.0	10	7.8		39.0	39.0	10	7.8	20	15.6
12	7+22	5	7.0	35.0	10	7.0		35.0	35.0	10	7.0	20	14
KAKTAPYBAY 201				260		25		260	260		26.0		40

30706 3-200006 20720006 207000 204

№	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
1	0+00	0+20	20.0	1.2	24.0	15	3.6	
2	0+20	0+53	43.0	1.2	51.6	15	7.8	
3	0+74	2+48	174.0	1.9	174.0	15	26.1	
4	2+57	2+78	21.0	1.9	21.0	15	3.15	
5	2+78	2+98	18.0	1.9	18.0	15	2.7	
6	2+98	4+00	104.0	1.9	104.0	15	15.6	
7	4+00	4+53	53.0	1.9	53.0	15	7.95	
8	4+53	5+19	66.0	1.9	66.0	15	9.9	
9	5+28	5+67	39.0	1.9	39.0	15	5.85	
10	5+67	6+93	126.0	1.2	151.0	15	22.65	
11	7+11	7+28	17.0	1.2	20.0	15	3	
12	7+34	8+50	116.0	1.2	139.0	15	20.85	
KAKTAPYBAY 201				797.0		861.0		129.15

30706 3-200006 20720006 207000 205

№	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
1	0+20	1+25	105.0	1.2	126.0	15	18.9	
2	1+43	2+04	61.0	1.2	73.0	15	10.95	
3	2+13	2+51	48.0	1.2	58.0	15	8.7	
4	2+78	3+0	21.0	1.2	25.0	15	3.75	
5	3+00	4+52	152.0	1.2	182.0	15	27.3	
6	4+72	5+28	48.0	1.1	53.0	15	7.95	
7	5+28	6+03	74.0	1.2	88.0	15	13.35	
8	6+12	6+52	50.0	1.2	60.0	15	9	
9	6+72	7+27	55.0	1.0	55.0	15	8.25	
10	7+29	8+58	121.0	1.2	145.0	15	21.75	
KAKTAPYBAY 201				745.0		878.0		131.7

KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201	KAKTAPYBAY 201
1	0+00	0+20	20.0	1.2	24.0	15	3.6	
2	0+20	0+53	43.0	1.2	51.6	15	7.8	
3	0+74	2+48	174.0	1.9	174.0	15	26.1	
4	2+57	2+78	21.0	1.9	21.0	15	3.15	
5	2+78	2+98	18.0	1.9	18.0	15	2.7	
6	2+98	4+00	104.0	1.9	104.0	15	15.6	
7	4+00	4+53	53.0	1.9	53.0	15	7.95	
8	4+53	5+19	66.0	1.9	66.0	15	9.9	
9	5+28	5+67	39.0	1.9	39.0	15	5.85	
10	5+67	6+93	126.0	1.2	151.0	15	22.65	
11	7+11	7+28	17.0	1.2	20.0	15	3	
12	7+34	8+50	116.0	1.2	139.0	15	20.85	
KAKTAPYBAY 201				797.0		861.0		129.15

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია

N 069929

ვის: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა -ს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ამხანაგობა "განთიადი"-მ (ს/კ 202477925) (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვესო ოსიაურში გზის მოასფალტების სამუშაოები) სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერში - NAT170004598 წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე.

ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:


8 838.32 (რვა ათას ოცდათვრამეტი ლარი და 32 თეთრი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის უპირობოდ გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

გარანტიის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ წყდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლისას;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით და/ან მათი გარანტისათვის დაბრუნებით;
- ბენეფიციარისათვის იმ თანხის გადახდით, რომელიც მითითებულია ბენეფიციარის მოთხოვნაში;

წინამდებარე გარანტია ძალაშია: 2017 წლის 20 ივნისიდან 2017 წლის 10 ოქტომბრამდე.

ვასილ აბრაზაძე



გენერალური დირექტორი



20 ივნისი 2017 წელი

ქ.თბილისი, დ.გაბრეკელის N19

129-130

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ქ. ხაშური

22 ივნისი 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის 22 ივნისის N105 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს

გიორგი პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი

გოდერძი კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

გრიგოლ გოგალაძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ულუმბელაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ზურაბ გუგუბერიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

პაატა კობალაძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ვეფხვია ბლიაძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების შტატგარეშე მოსამსახურე

ლაშა მალბაზიშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი ოსიაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
