

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდგომის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ხელშეკრულება სამუშაოს შესყიდვის შესახებ # 60-7-118-2171

ქ. თბილისი

2018 წ. 20.09

I. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2018 წლის 20.09, ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, (შემდგომში “შემსყიდველი”) წარმოდგენილი რეაბილიტაციის მმართველის სულხან ზუმბურაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „თბომშენს“ (შემდგომში “მიმწოდებელი”) შორის, წარმოდგენილი დირექტორის ლუტუშა კვანტალიანის სახით, რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. “მიმწოდებელი” იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები (CPV კოდი: 45310000, 45320000, 45330000, 45350000) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #1-ის (ხარჯთაღრიცხვა), დანართი #2-ის (ტექნიკური პირობა) და დანართი #3-ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები) შესაბამისად.

2.2. დანართი #1, დანართი #2 და დანართი #3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

III. სამუშაოს ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1 ხელშეკრულების საერთო თანხა განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #1-ის მიხედვით და შეადგენს **419554,90**(ოთხასცხრამეტი ათას ხუთასორმოცდაათობმეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში – „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე და „მიმწოდებლის“ მიერ საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან 8 (რვა) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.3 იმ შემთხვევაში თუ “მიმწოდებლის” მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა, “შემსყიდველი” “მიმწოდებელს” უხდის საავანსო თანხას („ხელშეკრულების ღირებულების“ არაუმეტეს 30%-ისა). „მიმწოდებლის“ მხრიდან შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის (საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკიდან) წარმოდგენის შემთხვევაში, საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით მეტი ვადით. ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას. საბანკო გარანტიის შესაბამისი ანგარიშფაქტურა წარმოდგენილი უნდა იყოს ავანსის გადახდიდან 2 (ორი) სამუშაო დღეში.

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდგობის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

3.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

4.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ.

4.3. „მიმწოდებელი“ სამუშაოს ასრულებს წინამდებრე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. სამუშაოები უნდა შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ტექნიკური პირობის, ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები შესაბამისად.

4.4 „მიმწოდებელი“ სამუშაოებს ასრულებს საკუთარი მასალით (მასალები უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არ მყოფი) და იგი პასუხს აგებს მის ხარისხზე.

4.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან დადებული ხელშეკრულების ასლები.

4.6 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან. „მიმწოდებელი“ სუბკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ისევე აგებს პასუხს როგორც საკუთარი ძალებით შესრულებულზე. სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას შესრულებული სამუშაოების ვადებზე ასევე ხარისხსა, წინამდებრე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან და დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობაზე „შემსყიდველის“ წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ „მიმწოდებელი“, მიუხედავად იმ გარემოებისა სამუშაოები აწარმოა თავისი საკუთარი ძალებით, თუ შესამე პირების - სუბკონტრაქტორების მეშვეობით.

4.7 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოების მიმდინარეობის და დასრულების შესახებ აცნობოს „შემსყიდველს“. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება საკუთარი ძალებით უზრუნველყოს ფარული სამუშაოების ჩვენება, მიუხედავად ფარული სამუშაოების შემდეგ განხორციელებული სამუშაოებისა, ამ ხელშეკრულების 12.4 პუნქტში მითითებული პირისათვის.

4.8. ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად და შემდგომ სამუშაოების შესრულების დროს „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაიცვას საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“, საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის – „ელექტროსადგურების და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“-ს, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“,

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“-ს მოთხოვნები, მათ შორის (და არა მხოლოდ):

ა) ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, პერსონალისა და ტექნიკის ცვლილების გათვალისწინებით) და დაშვების თარიღამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე, წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“ და მიაწოდოს ინფორმაცია თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) და მათი ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების მითითებით. (საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების და საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მოთხოვნა);

ბ) მაღლივ/სიმაღლეზე სამუშაოებზე, საცეცხლე, სამშენებლო, სადემონტაჟო, ელექტრულ, ეგზ-ების დაცვის ზონაში სამუშაოებზე, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე, ყველა სხვა სახის სამუშაოებში მონაწილე პირები და მთლიანობაში, ობიექტზე დაშვებული მივლინებული სამშენებლო-სამონტაჟო საწარმოს ყველა მუშაკი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

გ) „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია მის მიერ მივლინებული პერსონალისათვის მინიჭებული ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების და უფლებების შესაბამისობაზე კვალიფიკაციასთან, აგრეთვე პერსონალის მიერ მოქმედი წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე.

დ) „მიმწოდებლის“ მიერ მივლინებულ იმ პირებს, რომლებსაც შეიძლება მუშაობა მოუწიოთ მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, ელექტრულ/ელექტროდანადგარებთან, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში, თან უნდა ჰქონდეთ ზემოაღნიშნული წესების მიხედვით გათვალისწინებული, დადგენილი ფორმის მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები, რომელშიც იქნება ჩანაწერი ელექტროდანადგარებში, მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, სპეციალურ სამუშაოზე მუშაობის წესების და ნორმების ცოდნის შემოწმების გავლის, მათთვის მინიჭებული შესაბამისი უფლების და ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფის შესახებ. არასათანადოდ გაფორმებული საკვალიფიკაციო მოწმობების, ცოდნის შემოწმების ვადაგადაცილების ან/და საკვალიფიკაციო მოწმობების არარსებობის შემთხვევაში „მიმწოდებლის“

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

მივლინებული შესაბამისი პერსონალი ობიექტზე არ დაიშვება, ხოლო ამ მიზეზით სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების ან საერთოდ შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ხელშეკრულების 11.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

ე) ობიექტზე დაშვებისას „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა ვალდებულია თან იქონიოს აუცილებელი დამცავი საშუალებები (მათ შორის, დამცავი ჩაჩქანები, დამცავი ქამარი და დამზღვევი ბაგირი), რომელთა გარეშეც აღნიშნული პერსონალი არ დაიშვება ობიექტზე.

ვ) „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს განწესით ან/და განკარგულებით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #3-ში განსაზღვრული სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.

V. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

5.1 სახელშეკრულებო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა;

5.2 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

5.3 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

VI. სამუშაოს შესრულების წესი

6.1 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც სამშენებლო ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

VII. ნორმატიული დოკუმენტები

7.1. მუშაობის პროცესში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ყველა მოქმედი ნორმებისა და წესების მიხედვით. აღნიშნული ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ან/ და მათი შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ შედეგზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება „მიმწოდებელს“.

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

VIII. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

8.2 სამუშაოს დასრულებისთანავე „მიმწოდებელი“ ატყობინებს „შემსყიდველს“ სამუშაოს დასრულების შესახებ.

8.3 შეტყობინების მიღების შემდეგ „შემსყიდველის“ სამუშაოთა მიმღები ჯგუფი ამოწმებს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან. ხარვეზების არ არსებობის შემთხვევაში „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე.

IX. სამუშაოს შესრულების, გარანტიის ვადები და ადგილი

9.1 „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან 105(ასხუთი) კალენდარული დღეში, ვადამდე შესრულების უფლებით.

9.1.1.ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში.

შენიშვნა:ობიექტზე დაშვების პროცედურები გაწერილია წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.8 პუნქტში და დანართი #3-ში (სამუშაოს შესრულების უსაფრთხოდ გაწევის წესი და პირობები).

9.2 სამუშაოების უნდა ჩატარდეს შემდეგ მისამართზე (სამუშაოების შესრულების ადგილი): თერჯოლის რ-ნი სოფ. სარბევი და ქ. ზესტაფონი, საქარხნო ქ.N9.

9.3 შესაბამისი ექსპლუატაციის პირობებში „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო მომსახურების ვადა არის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან სადრენაჟე ან სანიაღვრე და შემოღობვის სამუშაოებზე 5(ხუთი) წელი, ხოლო სხვა დანარჩენზე 2 (ორი) წელი.

9.4 საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში თუ გამოვლინდება რაიმე ხარვეზი ან შეუსაბამობა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზი „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან 30(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

X. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

10.1 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების გარანტია ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 2%, რომელიც წარმოდგენილია „მიმწოდებლის“ მიერ გამოყენებული იქნება შემდეგ შემთხვევებში თუ:

ა) „მიმწოდებლის“ მხრიდან სამუშაოს შესრულების ვადა ირღვევა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღეზე მეტი ხნის ვადით.

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ბ) „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ საბანკო გარანტიის საფუძველზე უპირობოდ და შეუქცევადად იღებს მთელ გარანტირებულ თანხას (ხელშეკრულების ღირებულების 2%).

10.3 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენება არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-XI მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებებისაგან.

XI. მხარეთა პასუხისმგებლობა

11.1 „მიმწოდებლის“ მიზეზით სამუშაოს დაგვიანებით შესრულების, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, სამუშაოს სრულად და ჯეროვნად შესრულების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.2 ამ ხელშეკრულების 11.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო „მიმწოდებელს“ გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ არ გამოასწორებს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზს ამ ხელშეკრულებით საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორებისთვის დადგენილ ვადებში - შესატყვისი ვადის გასვლიდან ხარვეზის გამოსწორების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.3 „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

11.5 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ფაქტიურად შესრულებული ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა „მიმწოდებლისათვის“ გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

შეიძლება გახდეს „მიმწოდებლის“ მხრიდან „შემსყიდველისათვის“ 11.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

XII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

12.1 “მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს “შემსყიდველი” კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ “შემსყიდველი” კონტროლის მიზნით, გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით “შემსყიდველი”.

12.2 “მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

12.3 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს “მიმწოდებელს” მოცემული ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან.

12.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს “შემსყიდველის” მხრიდან უზრუნველყოფს სსე-ის ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გიორგი ტყეშელიაძე, ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ზურაბ ამირიძე, ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი გოჩა აგაშენაშვილი, ქ/ს „ქუთაისი 220“-ს ქვესადგურის უფროსი ჯიმშერ დადვანი, ქ/ს „ფერო 220“-ს ქვესადგურის უფროსი იური გამრეკელაშვილი. 4.8 პუნქტის კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის ტექნიკური უსაფრთხოების ინსპექციის სამსახურის უფროსი მერაბ კვირიკაშვილი.

12.5 “შემსყიდველის” მოთხოვნის შემთხვევაში “მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს თავის ან “შემსყიდველის” მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

12.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის მიხედვით. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ასევე განხორციელდება სამუშაოს შესრულების ვადის დაცვის მონიტორინგით.

XIII. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა, ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ სათანადო ცნობას.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

XIV. ურთიერთობა მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით.

14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

XV. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

15.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

15.2. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

15.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;

15.2.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებობის დადგენის შემთხვევაში;

15.3 “შემსყიდველს” შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

15.3.1 თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

15.3.2. “მიმწოდებლის” გაკოტრების შემთხვევაში;

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

15.3.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.

15.3.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15.4 ამ მუხლის 15.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” ვალდებულია აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

15.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

XVI. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

16.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

16.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

XVII. დავათა განხილვა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხები

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

XVIII. ხელშეკრულების სხვა პირობები

18.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

18.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

18.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.4 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

XIX. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეებს შორის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის 30 აპრილის ჩათვლით, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის ბოლომდე.

XX. მხარეთა რეკვიზიტები:

“შემსყიდველი”:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“
ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2

საიდ. კოდი: 204995176
ს/ს „თი ბი სი ბანკი“

ბანკის კოდი № TBCBGE 22
ანგარიშის
GE02TB060000102467636

სულხან-სუმბურძე
რეაბილიტაციის მმართველი



“მიმწოდებელი”:

შპს "თბომშენი"

ქ. ქუთაისი, ლომოურის II ჩიხი #4

საიდ. კოდი: 212681249
ს/ს „თი ბი სი ბანკი“

ბანკის კოდი № TBCBGE 22
ანგარიშის № GE07TB0300000030467709
მობ; 599697716

ლუტუმა კვანტალიანი
დირექტორი



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

დანართი#1,

ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

#	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება (შემენა-მონტაჟი)	განზ. ერთეული	მოცულობა ან რაოდენობა	ერთეულის ფასი დღგ-ს გარეშე (ლარი)	საერთო ფასი დღგ-ს გარეშე (ლარი)
	ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის მოწყობის სამუშაოები				
	პერფორირებული გეოტექსტილის ფილტრიანი მილების მონტაჟის სამუშაოები				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0,5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	მ ³	912,2	2	1824,40
2	ქვაბულის ძირის მოშანდაკება ხელით	მ ²	45,6	7	319,20

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

3	საწრეტი საფილტრი შრის მოწყობა არხებში მცხვილმარცვლოვანი ბალასტით კალიბრი 0-70 მმ	მ ³	702	11	7722,00
4	სადრენაჟე პოლივინილქლორიდის პერფორირებული, გეოტექსტილის ფილტრიანი მილის მონტაჟი დიამეტრი 150 მმ	გრმმ	452,73	9,7	4391,48
5	სადრენაჟე პოლივინილქლორიდის პერფორირებული, გეოტექსტილის ფილტრიანი მილის მონტაჟი დიამეტრი 200 მმ	გრმმ	521,8	14	7305,20
6	საკანალიზაციო ჭის ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ვიბრაციული სატკეპნით. დატკეპნა ფენა-ფენა	მ ³	10	12	120,00
7	სადრენაჟე ქსელისათვის 1000 მმ შიდა დიამეტრის ჭის მოწყობა ასაწყობი რ/ბეტონის ელემენტებისაგან (რ/ბეტონის ჭის ძირი, რ/ბეტონის ჭის რგოლი h-1.0მ, d-1.0მ, რ/ბეტონის ჭის სახურავი თუჯის ხუფით)	ც	11	350	3850,00
ღია გადამღვრელი არხის რეაბილიტაცია					

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

1	არხისა და მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა ბარდებისაგან, ხეებისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან	მ ²	540	1,2	648,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და გადაადგილება 30 გრძმ მანძილზე ტერიტორიის დასაპროფილებლად	მ ³	90	5	450,00
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით	მ ³	140	3	420,00
4	ქვაბულში ძირის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე	მ ³	7,2	15	108,00
5	ზედმეტი გრუნტის ადგილზე გასწორება ხელით	მ ³	14	5	70,00
ტერიტორიის შევსების სამუშაოები					

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

1	ტერიტორიის პროფილირება ბულდოზერით, ზედმეტი გრუნტის ადგილზე გასწორება	მ ²	26710	0,3	8013,00
2	მსხვილმარცვლოვანი ბალასტის (კალიბრი 0-70 მმ) შემოზიდვა და ბულდოზერით ტერიტორიის პროფილირება და დატკეპვნა (სისქე 20სმ)	მ ³	6652,5	10	66525,00
3	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან (ღორღი ბუნებრივი ქვის 10-40 მმ) ბალასტის საფარზე პროფილირებით და დატკეპვნით (სისქე 10 სმ)	მ ³	2671	12	32052,00
ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე გარე შემოღობვის სამუშაოები					
არსებული ძველი ამორტიზირებული შემოღობვის დემონტაჟი					
1	ბეტონის მონოლითური ჩამოსხმული ბოძების დემონტაჟი 2,50X0,40X0,40 (იხ. ფოტო)	ც	151	1	151,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობების, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

2	ბეტონის მონოლითური ჩამოსხმული ფილის დემონტაჟი 1,50X3,70X0,10მ (იხ. ფოტო)	ც	141	1,5	211,50
3	ლითონის გისოსების დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე 3,70X0,70მ	ც	81	3	243,00
4	ბეტონის ბოძების დემონტაჟი 0,15X0,15X3,0 (იხ. ფოტო)	ც	71	1	71,00
5	ბეტონის ფილის დემონტაჟი 0,05X0,70X3,7 (იხ. ფოტო)	ც	72	2	144,00
6	ამორტიზირებული ლითონის კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადის დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე 3,98X1,50მ-45ც, , 2,0X1,20მ-32ც,	ც	77	3	231,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

7	ამორტიზირებული ლითონის ჭიშკრის დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე 4,80X2,50	ც	1	50	50,00
8	მიწის (გრუნტის) მოჭრა მოსწორება ტერიტორიიდან გატანით	მ ³	75	20	1500,00
ახალი ღობის მოწყობის სამუშაოები (ნახაზის მიხედვით)					
1	ღობის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება ხე-მცენარეებისაგან	მ ²	1040	1,2	1248,00
2	ტრანშეას გაჭრა ღობისთვის 0.20X0.25მ	მ ³	44,5	10	445,00
3	ლითონის დგარებისთვის ორმოს ამოღება 0,75X0,40X0,40მ-354ც	მ ³	42,4	10	424,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

4	ხრემის მოწყობა ტრანშეასა და დგარის ორმოებში 5სმ-ზე	მ ³	13,9	12,39	172,22
5	ლითონის 3-მეტრიანი კვადრატული მილის 60X60X3მმ მოწყობა შეღებვით (შავი ფერი)	ც	354	25	8850,00
6	არმატურის დამზადება-ჩაწყობა (4 ლერო 12 მმ,ა-III, საკიდით ნმმ. ა-1, ყოველ 0,4 მ-ზე) ქარგლის გამოყენებით	გრძ.მ	1034	10	10340,00
7	ტრანშეის მთელი პერიმეტრის (ცოკოლის) და დგარების ორმოების ბეტონირება ქარგლის გამოყენებით	მ ³	118,8	150	17820,00
8	ცოკოლზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეფრქვევა (შებრიზგვა)	მ ²	672	2	1344,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

9	ლითონის დგარებზე სამ-სამ ადგილას უნდა მოხდეს 4სმ-იანი კვადრატული მილის 40X40X2მმ მიღუღება (ორივე მხრიდან) მავთულბადის სექციის დასამაგრებლად, შეღებვით (შავი ფერი)	ც	2124	0,9	1911,60
10	ლითონის კუთხოვანით 45X45X3მმ ღობის სექციის ჩარჩოს დამზადება შეღებვით (წითელი ფერი)	გრძ.მ	3540	7	24780,00
11	მავთულბადის გასამაგრებლად კვადრატული მილის მოწყობა 20X20X2მმ) შეღებვით (წითელი ფერი)	გრძ.მ	708	2,85	2017,80
12	მავთულბადის დამზადება (ლითონის კუთხოვანებში მოწყობა) მავთულის სისქე არანაკლებ 3,5მმ. (ბადის ქსოვა "რაბიცა-გროსოტი") ბადის უჯრის ზომა: არაუმეტეს 45X45მმ ძირითადი ზომა 3,0X2,0მ შეღებვით (წითელი ფერი) იხ. სურათი	მ ²	2124	10	21240,00
13	კვადრატული მილის დგარების თავზე ლითონის დამცავი ფურცლის მოწყობა (დადუღებით) 80X80X2მმ შეღებვით (შავი ფერი)	ც	354	1,5	531,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

14	ცენტრალურ შესასვლელში ახალი ორფრთიანი ლითონის კარის კუტი კარით მონტაჟი ავტომატური გაღება-დაკეტვის მექანიზმით 5,70მ, საყრდენი ბოძების ბეტონირებით და შეღებვით (იხ. ნახაზი და ტექ. პირობა)	კომპ	1	1980	1980,00
15	ახალი ორფრთიანი ლითონის კარის მონტაჟი 6,0მ, (ანჯამებით, საბოქლომე საყურეებით ორ ადგილას) საყრდენი ბოძების ბეტონირებით და შეღებვით (იხ. ნახაზი)	კომპ	1	1735	1735,00
16	შემოღობვის და ჭიშკრის დგარების თავზე (ერთის გამოტოვებით, ყოველ მეორე დგარზე) უნდა მოეწყოს ბურთისებრი ჰერმეტიკული პლასტმასის სანათი დიამეტრი არანაკლებ 25სმ ლედ-დიოდური ნათურით არანაკლებ 15 ვტ-იანი	ც	181	25	4525,00
17	ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით 2X4მმ2	გრძ.მ	1100	2,2	2420,00
18	ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით 2X2.5მმ2	გრძ.მ	450	1,8	810,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

19	გოფრირებული მილი ელ. სადენისთვის (სპეციალური სამაგრებით უნდა მიმაგრდეს ღობის ცოკოლზე)	გრძ.მ	1100	0,8	880,00
20	გამანაწილებელი კოლოფი (გარე გამოყენების)	ც	181	2,5	452,50
21	ელ. ავტომატი ა-40-იანი	ც	1	20	20,00
22	ფოტო ელემენტის (შესაბამისი სიმძლავრის) მოწყობა დაერთება ელ ქსელზე	კომპ	1	120	120,00
23	ტრანშეის გათხრა. გრუნტის ამოღება და უკუჩაყრა ელ. კაბელისთვის (ტრანშეის სიღრმე და სიგანე ადგილზე დაზუსტდეს)	გრძ.მ	50	5	250,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

24	გზის გადაკვეთის ადგილას ბეტონის ბალიშებზე ლითონის გარსაცმის დ-50მმ მილის მოწყობა (ელ. კაბელისთვის)	გრძ.მ	15	15	225,00
25	ჭიშკრის გადასასვლელებზე ბეტონის ბალიშის მოწყობა (ბეტონი სისქით 15სმ. არმატურა 12მმ-იანი ბადის მოქსოვა ბიჯით20X20სმ.) ორ ადგილას	მ ²	40	22	880,00
დამიწების კონტურის მოწყობა ქვესადგურის ლობისთვის					
1	დამიწების კონტურისთვის მრგვალი 2მ-იანი ფოლადის დ-16მმ-იანი ღეროს მოწყობა ნიადაგში ლობის დგართან მიდულეებით ნახაზის მიხედვით ცალი-120	გრძ.მ	240	3	720,00
ქუთაისი -220-ის ტერიტორიაზე არსებული ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟი					
1	ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი 25,50X5,0მ სიმაღლე-4მ. (იხ. შენობის ფოტოები) (დემონტირებული ვარგისი მასალები, ლითონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები დასაწყობდეს ობიექტის ტერიტორიაზე დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპლექტი	1	5100	5100,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

2	ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი 25,0X8,30მ სიმაღლე-3,5მ. (იხ. შენობის ფოტოები) (დემონტირებული ვარგისი მასალები, ლითონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები დასაწყობდეს ობიექტის ტერიტორიაზე დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპლექტი	1	6500	6500,00
3	ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი 9,60X5,80მ სიმაღლე-4მ. (იხ. შენობის ფოტოები) (დემონტირებული ვარგისი მასალები, ლითონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები დასაწყობდეს ობიექტის ტერიტორიაზე დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე)	კომპლექტი	1	2227	2227,00
4	ობიექტის ტერიტორიიდან ზედმეტი გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე				1000,00
ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე შიდა შემოღობვის სამუშაოები					
არსებული ძველი ამორტიზირებული შიდა შემოღობვის დემონტაჟი					

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

1	ბეტონის მონოლითური ჩამოსხმული ბოძების დემონტაჟი 2,50X0,40X0,40 (იხ. ფოტო)	ც	14	5	70,00
2	ბეტონის მონოლითური ჩამოსხმული ფილის დემონტაჟი 1,50X3,70X0,10მ (იხ. ფოტო)	ც	10	10	100,00
3	ამორტიზირებული ლითონის კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადის დემონტაჟი და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	მ2	530	1	530,00
ახალი ღობის მოწყობის სამუშაოები					
1	ლითონის დგარებისთვის ორმოს ამოღება 0,55X0,40X0,40მ-245ც	მ ³	21,5	10	215,00
2	წვრილი ფრაქციის ღორღის მოწყობა ქვაბულში(0.05X0.40X0.40მ)-245ც	მ ³	2	14	28,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

3	ლითონის 2-მეტრიანი კვადრატული მილის 60X60X3მმ მოწყობა შეღებვით (შავი ფერი) (მიღები ერთმანეთისგან დაშორებული უნდა იყოს 2-მეტრით)	ც	245	12	2940,00
4	ლითონის დგარების ბეტონირება	მ ³	19,6	134	2626,40
5	მოთუთიებული ლითონის ბადის მოწყობა ლითონის 2,5მმ-იანი სისქის მავთულით. ბიჯით (5X5სმ),სიმაღლე 1,50მ	გრძმ	490	10,5	5145,00
6	ლითონის დგარებზე სამ ადგილას უნდა მოხდეს მოთუთიებული გლინულას (კატანკა)არანაკლებ 3,5მმ-იანი გაჭიმვა ლითონის ბადის დასამაგრებლად გრძ,მ 490X 3	გრძმ	1470	1,2	1764,00
7	დგარების თავზე ლითონის ფურცლის მოწყობა 80X80 მმ, შეღებვით	ც	245	1,2	294,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

8	ახალი ორფრთიანი ლითონის კარი კუტი კარით მონტაჟი 6,0მ, (ანჯამებით, საბოქლომე საყურეებით ორ ადგილას, სახელურიანი საკეტი მექანიზმი) საყრდენი ბოძების ბეტონირებით და შეღებვით (იხ. ნახაზი)	კომპ	4	1990	7960,00
9	ახალი ორფრთიანი ლითონის კარის მონტაჟი 6,0მ, (ანჯამებით, საბოქლომე საყურეებით ორ ადგილას) საყრდენი ბოძების ბეტონირებით და შეღებვით (იხ. ნახაზი)	კომპ	2	1750	3500,00
10	შემოღობვის და ჭიშკრის დგარების თავზე (ერთის გამოტოვებით, ყოველ მეორე დგარზე) უნდა მოეწყოს ბურთისებრი ჰერმეტიკული პლასტმასის სანათი დიამეტრი არანაკლებ 25სმ ლედ-დიოდური ნათურით არანაკლებ 15 ვტ-იანი	ც	130	25	3250,00
11	ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით 2X4მმ2	გრძ.მ	550	2,4	1320,00
12	ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვით ორმაგი იზოლაციით 2X2.5მმ2	გრძ.მ	245	1,8	441,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

13	გოფრირებული მილი ელ. სადენისთვის (სპეციალური სამაგრებით უნდა მიმაგრდეს ღობის ცოკოლზე)	გრძ.მ	550	0,8	440,00
14	გამანაწილებელი კოლოფი (გარე გამოყენების)	ც	130	1,5	195,00
15	ელ. ავტომატი ა-40-იანი	ც	1	20	20,00
16	ფოტო ელემენტის (შესაბამისი სიმძლავრის) მოწყობა დაერთება ელ ქსელზე	კომპ	1	100	100,00
17	ტრანშეის გათხრა. გრუნტის ამოღება და უკუჩაყრა ელ. კაბელისთვის (ტრანშეის სიღრმე და სიგანე ადგილზე დაზუსტდეს)	გრძ.მ	550	3	1650,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

18	გზის გადაკვეთის ადგილას ბეტონის ბალიშებზე ლითონის გარსაცმის დ-50მმ მილის მოწყობა (ელ. კაბელისთვის)	გრძ.მ	15	10	150,00
ქ/ს “ფერო 220“-ის სააკუმულატორო ოთახის გადატიხვრის სარემონტო სამუშაოები					
1	რკინის კარის დემონტაჟი	ც	1	5	5,00
2	ღიობის გამონგრევა კარების ასაწევად	მ ²	0,48	10	4,80
3	იატაკზე ღორღის მოწყობა	მ ³	3,8	14	53,20
4	იატაკზე ბეტონის მოწყობა არმირებით, არმატურის აIII დ10	მ ³	1,6	200	320,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

5	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	16	10	160,00
6	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა წებო ცემენტის გამოყენებით	მ²	16	28	448,00
7	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსის მოწყობა ზსმ	გრძ.მ	14	10	140,00
8	თაბაშირ მუყაოს ტიხრის მოწყობა ფოლგირებული თბოიზოლაციით (მინა-ბამბა)	მ²	39	24	936,00
9	ტიხრის კედლის გამაგრება მილ-კვადრატებით 70X70	გრძ.მ	25,5	10,99	280,25

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

10	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ ²	120	9	1080,00
11	ტიხარში მეტალო-პლასტმასის კარის ბლოკის მოწყობა, ფურნიტურით 1ც	მ ²	2,2	130	286,00
12	არსებული გამწოვი სისტემის დემონტაჟი	ც	1	10	10,00
13	თვალის გამოსარეცხი საშუალება (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	1	150	150,00
14	საწარმოო მოხმარების კანალური გამწოვი ვენტილატორი გათვლილი ხანგრძლივ მუშაობაზე, რკინის კორპუსით და ელ. დაცვით. (220-230ვ; 50ჰვ; ბრუნვის სიხშირე არანაკლებ 2500 ბრუნი/წუთი; კანალის დიამეტრი 150მმ შეძენა.	ც	1,00	80	80,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის საშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

15	ჰერსატარი მილი, თხელფურცლოვანი გაღვანიზირებული ფოლადისაგან 150X150 მმ, თავისივე ცხურით 200X100 მმ - ყოველ 1.5 მეტრში (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით და სამაგრი კომპლექტით)	გრძ.მ	8,00	30	240,00
16	კედლებზე დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	7	105,00
17	სავენტილაციო ხვრელის გამონგრევა	წერტ	1,00	10	10,00
18	ელ.სადენი სპილენძის ბარდვით 3X2.5მმ ²	გრძ.მ	50,00	2,2	110,00
19	საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	40,00	1,5	60,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

20	გარე დაყენების როზეტი	ც	1,00	5	5,00
21	გარე დაყენების ჩამრთველი ერთ კლავიშოანი	ც	2,00	5	10,00
22	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1,00	2	2,00
23	ავტომატო 40ა-იანი	ც	1,00	20	20,00
24	ავტომატი 25ა-იანი	ც	2,00	15	30,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

25	გერმეტულად დახურული სანათი (კედელზე ან ჭერზე მოსაწყობად) (2ცალი ავარიული განათებისთვის)	ც	6,00	25	150,00
ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის სააკუმულატორო ოთახის მოწყობის სარემონტო სამუშაოები					
1	ბეტონის ტიხრების დემონტაჟი	მ ²	18	10	180,00
2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ ²	11	10	110,00
3	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა წებო ცემენტის გამოყენებით	მ ²	11	28	308,00
4	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსის მოწყობა 8სმ	გრძ.მ	14	10	140,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

5	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ ²	50	9	450,00
6	არსებული გამწოვი სისტემის დემონტაჟი	ც	1	10	10,00
7	თვალის გამოსარეცხი საშუალება (ტექნიკური პირობის შესაბამისად)	ც	1	151,17	151,17
8	საწარმოო მოხმარების კანალური გამწოვი ვენტილატორი გათვლილი ხანგრძლივ მუშაობაზე, რკინის კორპუსით და ელ. დაცვით. (220-230ვ; 50ჰც; ბრუნვის სიხშირე არანაკლებ 2500 ბრუნი/წუთი; კანალის დიამეტრი 150მმ შეძენა.	ც	1,00	80	80,00
9	ჰაერსატარი მილი, თხელფურცლოვანი გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150X150 მმ, თავისივე ცხურით 200X100 მმ - ყოველ 1.5 მეტრში (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით და სამაგრი კომპლექტით)	გრძ.მ	8,00	30	240,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

10	კედლებზე დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	17,00	7	119,00
11	ელ.სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ ²	გრძ.მ	40,00	2,2	88,00
12	საკაბელო არხი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	40,00	1,5	60,00
13	გარე დაყენების ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	2,00	5	10,00
14	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1,00	1	1,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

15	ავტომატო 40ა-იანი	ც	1,00	20	20,00
16	ავტომატი 25ა-იანი	ც	2,00	15	30,00
17	გერმეტულად დახურული სანათი (კედელზე ან ჭერზე მოსაწყობად) (2ცალი ავარიული განათებისთვის)	ც	6,00	15	90,00
18	კედელზე მოსაწყობი ლითონის კონსტრუქციის თაროები "სტელაჟი" ხის ფიცრებით არანაკლებ 40 მმ-იანი სისქის ლითონის კუთხოვანა არანაკლებ 45X45X2 მმ, (კუთხოვანის შეღებვით ზეთოვანი საღებავით, ხის ფიცრების შეღებვა ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით თვალსაჩინოების მიზნით შეიღების ფერადი ხსნარით (დამაგრდეს კედელზე) ნახაზის მიხედვით	მ ²	40	47	1880,00

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

19	სამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის გატანა ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელზე		500,00
	ჯამი		299288,72
	ზედნადები ხარჯები(არაუმეტეს 10%-სა)		29928,87
	ჯამი		329217,59
	გეგმიური დაგროვება(არაუმეტეს 8%-სა)		26337,41
	საერთო ღირებულება დღ-ს გარეშე		355555,00
	დღ 18%		63999,89924
	საერთო ღირებულება დღ-ს ჩათვლით		419554,90

“შემსყიდველი”:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

სულხან ზუმბულოძე
რეაბილიტაციის მმართველი



“მიმწოდებელი”:

შპს "თბომშენი"

ლუტუშა კვანტალიანი
დირექტორი



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

დანართი#2,

ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების "ტექნიკური პირობა":

1. "მიმწოდებელმა" სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველის ფუნქციონირებისთვის ნორმალური რიტმის შენარჩუნების პირობებში.
 2. რემონტთან დაკავშირებული ყველა მასალა (ექსპლოატაციაში არმყოფი, ახალი) შეძენილი უნდა იყოს "მიმწოდებლის" მიერ.
 3. შემოთავაზებული თვალის გამოსარეცხი საშუალება უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს:
 - 1 ცალი არანაკლებ 500მლ მოცულობის არამსხვრევად სტერილურ ბოთლში;
 - უნდა მოყვებოდეს კედელზე ჩამოსაკიდი;
 - ბოთლი გავსებული უნდა იყოს ფიზიოლოგიური ხსნარით;
 - თითოეულ კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს მარტივად აღქმადი პიქტოგრამული მოხმარების ინსტრუქცია;
 - თითოეულ ბოთლს უნდა გააჩნდეს თვალის ფორმის (თვალზე უსაფრთხოდ მისადებად) რბილი მისასხურებელი, რომელსაც ექნება სადინარული ჭრილები ბოთლის ვერტიკალურ და გადმოტრიალებულ მდგომარეობაში თვალში გამოსარეცხად;
 4. ყველანაირი სანათის ტიპი და ფორმა შეთანხმებული იქნას „შემსყიდველთან“.
 5. კედლების დამუშავება და შეღებვა ნიშნავს: დამუშავდეს კედელი წებო-ემულსიის ხსნარით, ფითხით (დაიშპაკლოს და გაიშკურკოს) რამდენიმე ფენად, შეიღებოს სულ მცირე ორი ფენა საღებავით, სრულ დაფარვამდე.
 6. ოთახის კედლების ფერი შეთანხმებული იქნას "შემსყიდველთან".
 7. ავტომატური ორფრთიანი კარები :
- ავტომატურ ორფრთიან კარებს უნდა გააჩნდეს ფრთების გაღება-დაკეტვის სხვადასხვა პოზიციებზე გაჩერების საშუალება, ფრთის გაღების მაქსიმალური კუთხე შეადგენს 110 გრადუსს.
- ელ.ენერჯის გათიშვის შემთხვევაში კარებს უნდა ჰქონდეს მყისიერი საიმედო ფიქსაციის საშუალება, ასევე გასაღების საშუალებით შესაძლებელი უნდა იყოს ავტომატიკის გათიშვა და მექანიკურ მართვაზე გადასვლა.

ავტომატური ორფრთიანი კარების კომპლექტში შედის:

ა) გაღება-დაკეტვის მექანიზმი-2ც, მექანიზმის კორპუსი უნდა იყოს უჟანგავი მეტალის ან სპეციალური საღებავით დამუშავებული, რომელიც არ საჭიროებს პერიოდულ შეზღვევას

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი მპს „თბომშენი“

და მუშაობს მძიმე კლიმატურ პირობებში, წარმოდგენილი უნდა იყოს გამლები მექანიზმის შემდეგი სერთიფიკატები მართვის სისტემის ხარისხის UNI ISO 9001, გარემოს დაცვის UNI ISO 14001 და დაცვის კლასი IP-54 (ფირმა „კრონო“ ან ანალოგიური), ელ. ენერჯის ძაბვა (50-60H), კვება (220-230WT)

ბ) მართვის ბლოკი-1 ც) რადიო სიგნალის მიმღები-1 ც

დ) დისტანციური მართვის პულტი-2 ც

ე) დიოდური სასიგნალო ნათურა-1 ც

- შენიშვნა: 1. წინამდებარე ტექნიკურ პირობას თან ერთვის ნახაზები-22 გვერდი
2. წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის სადრენაჟე ქსელის მოწყობის პროექტი-21 გვერდი*

“შემსყიდველი”:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

სულხან ზუმბურიძე
რეაბილიტაციის მმართველი



“მიმწოდებელი”:

მპს "თბომშენი"


ლუტუშა კვანტალიანი
დირექტორი



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

თვალის გამოსარეცხი საშუალების


სავარაუდო ნიმუშები

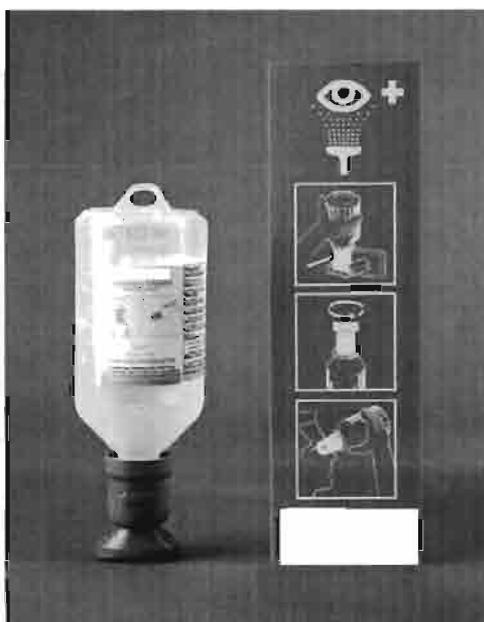

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“




ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

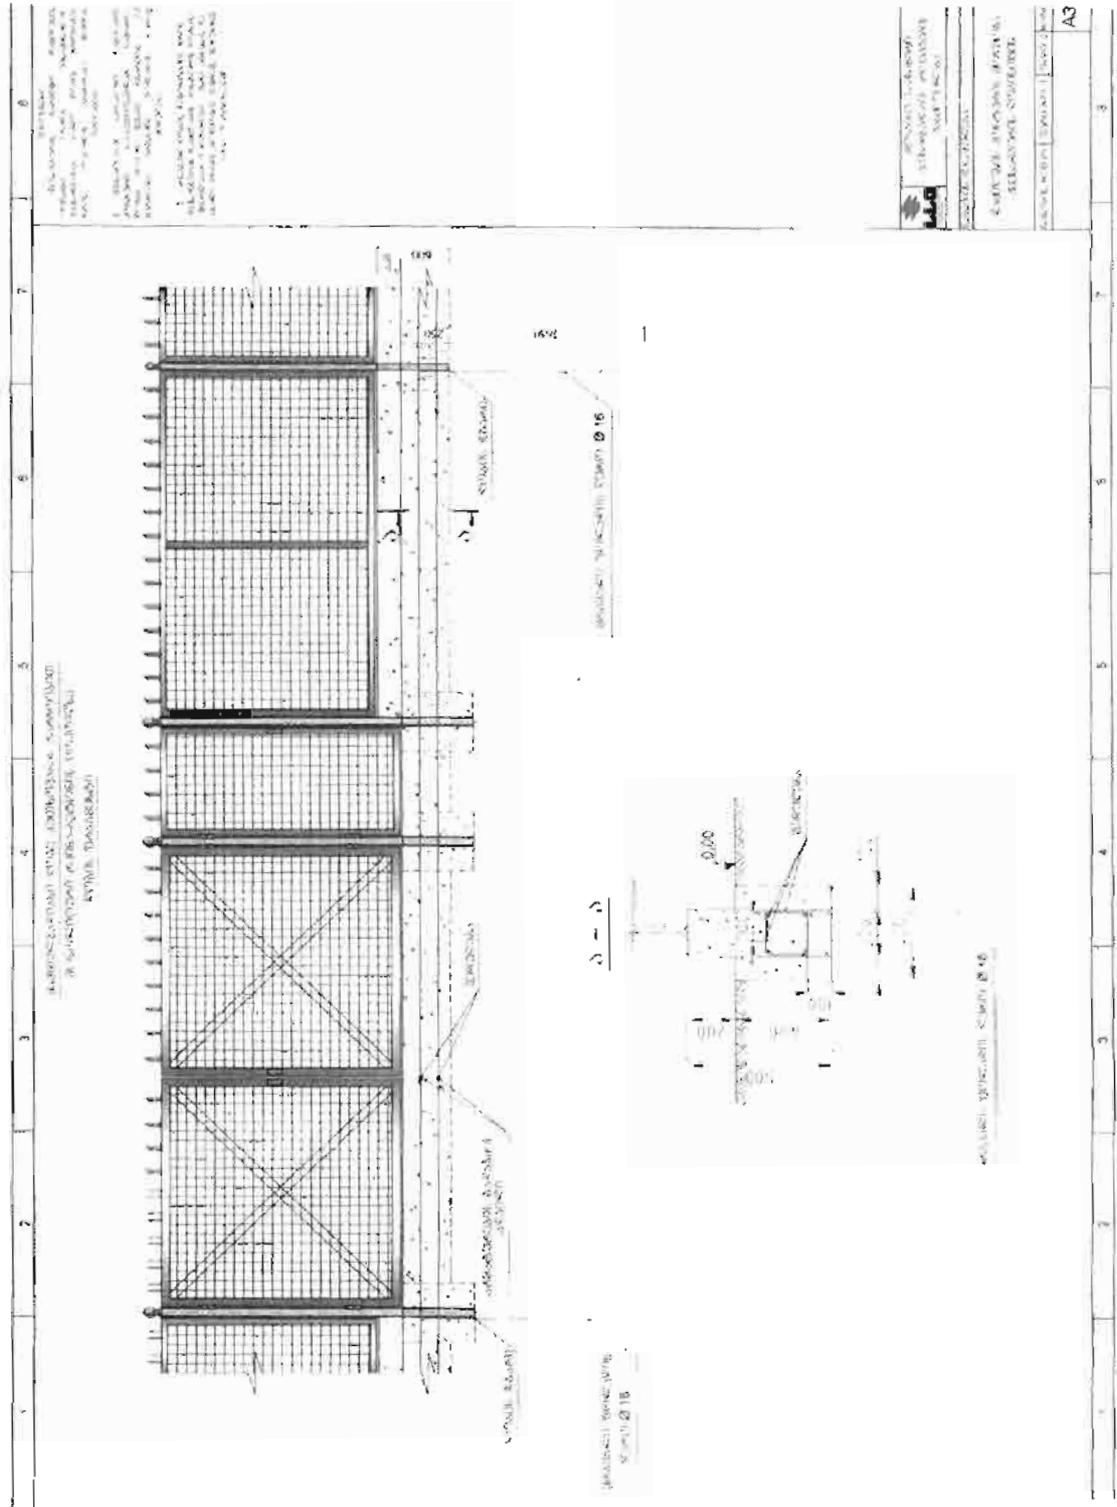


ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ქ/ს "ქუთაისი-220"-ის შემაღლება

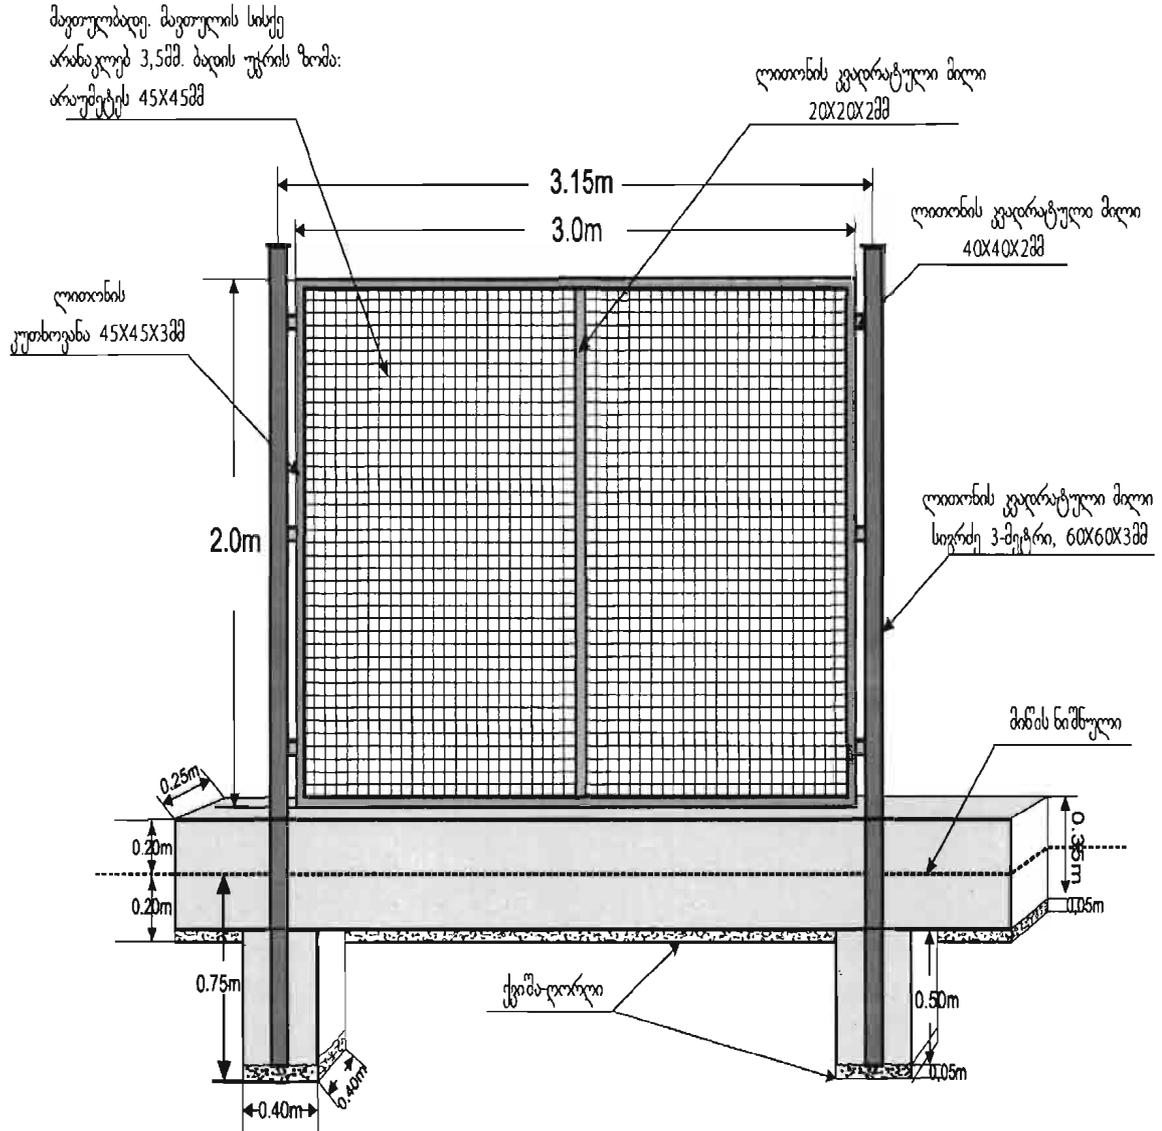

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ლოთონის კარი

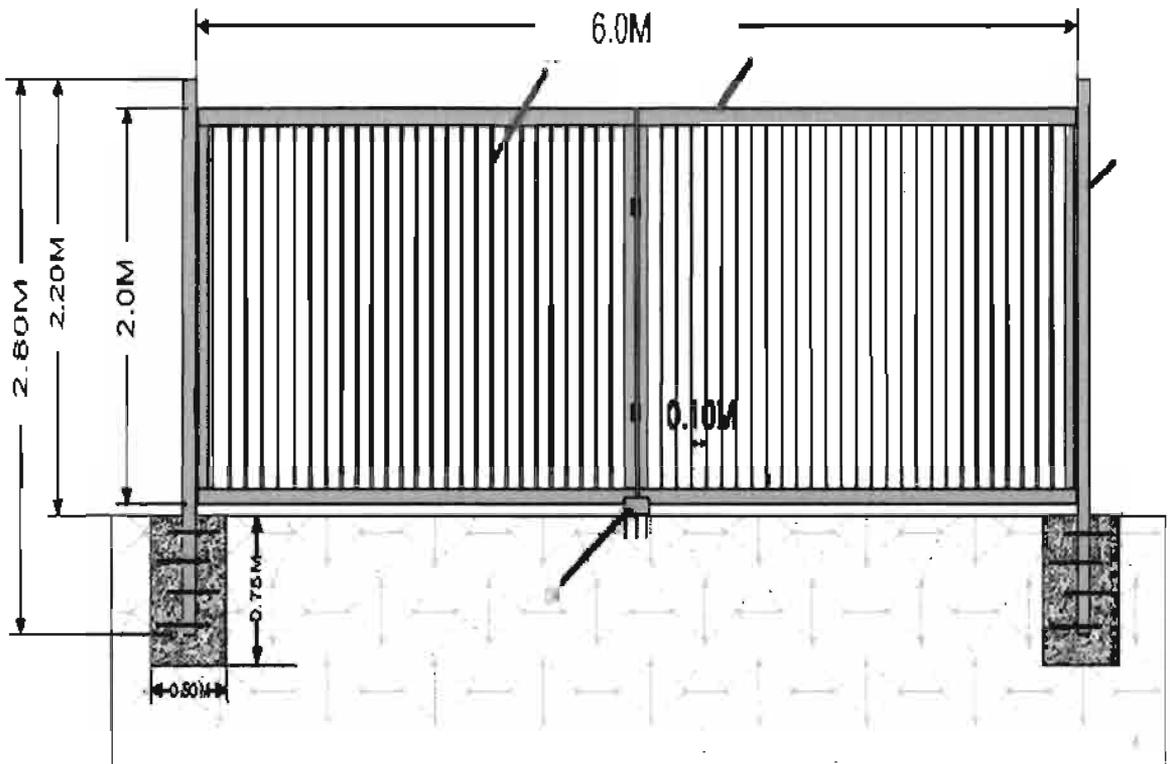


სპეციფიკაცია

1. ბილკვადრატი 150x150x6
2. ბილკვადრატი 40x20x3
3. ბილკვადრატი 20x40x1,5
4. კუთხოვანა 80x80x6
5. ბეტონი 75x50x50
6. არმატურა დ-12 ანაი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ლითონის კარი ბუნებრივით

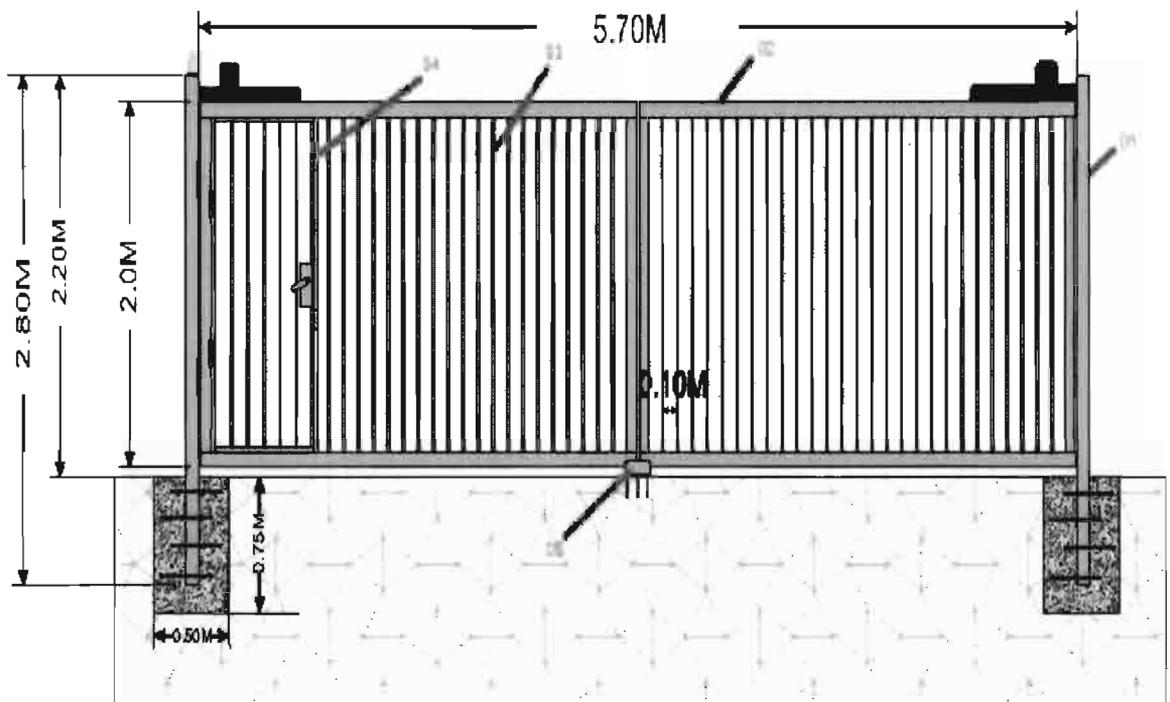


ხაზგაშუქვა

1. მილკვადრატი 150x150x6
2. მილკვადრატი 40x80x3
3. მილკვადრატი 20x40x1,5
4. მილკვადრატი 30x40x2
5. კუთხოვანა 80x80x6
6. ბეტონი 75x50x50
7. არმატურა დ-12 იანი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ლითონის კარი
კუტივარით

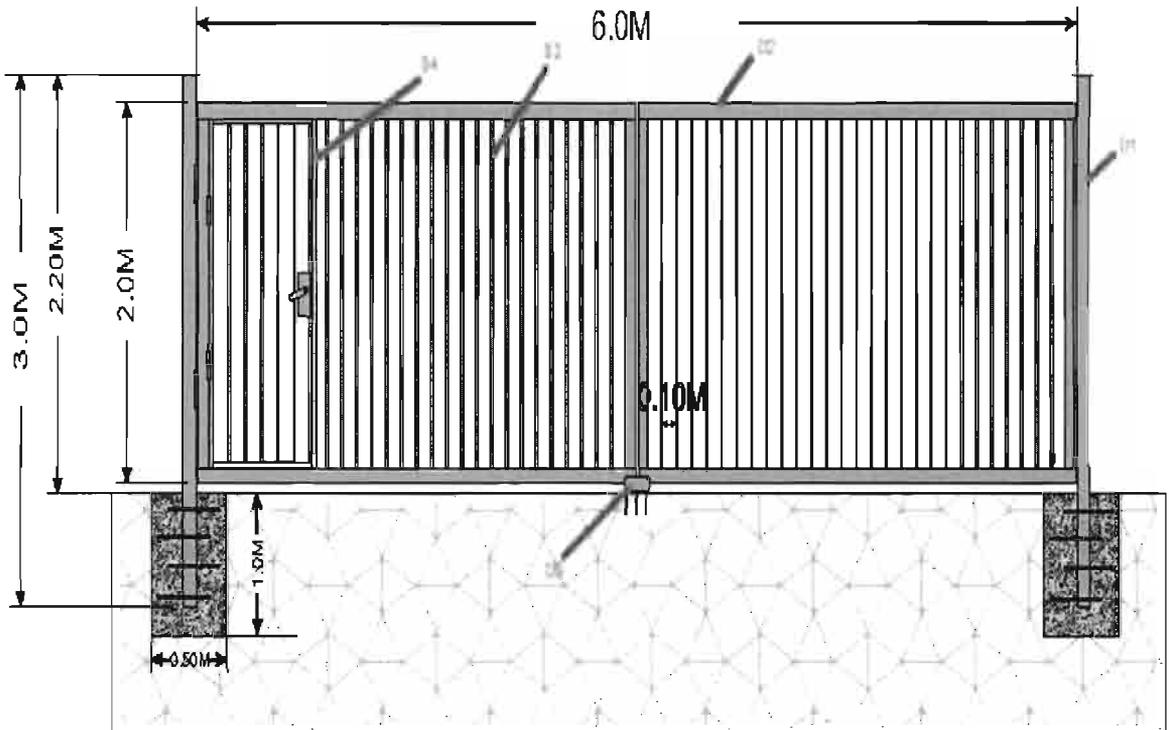


სპეციფიკაცია

1. მილკვადრატი 150x150x6
2. მილკვადრატი 40x80x3
3. მილკვადრატი 20x40x1,5
4. მილკვადრატი 30x40x2
5. კუთხოვანა 80x80x6
6. ბეტონი 95x50x50
7. არმატურა დ-12 იანი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“


თაროების მოსაწყობი სქემა

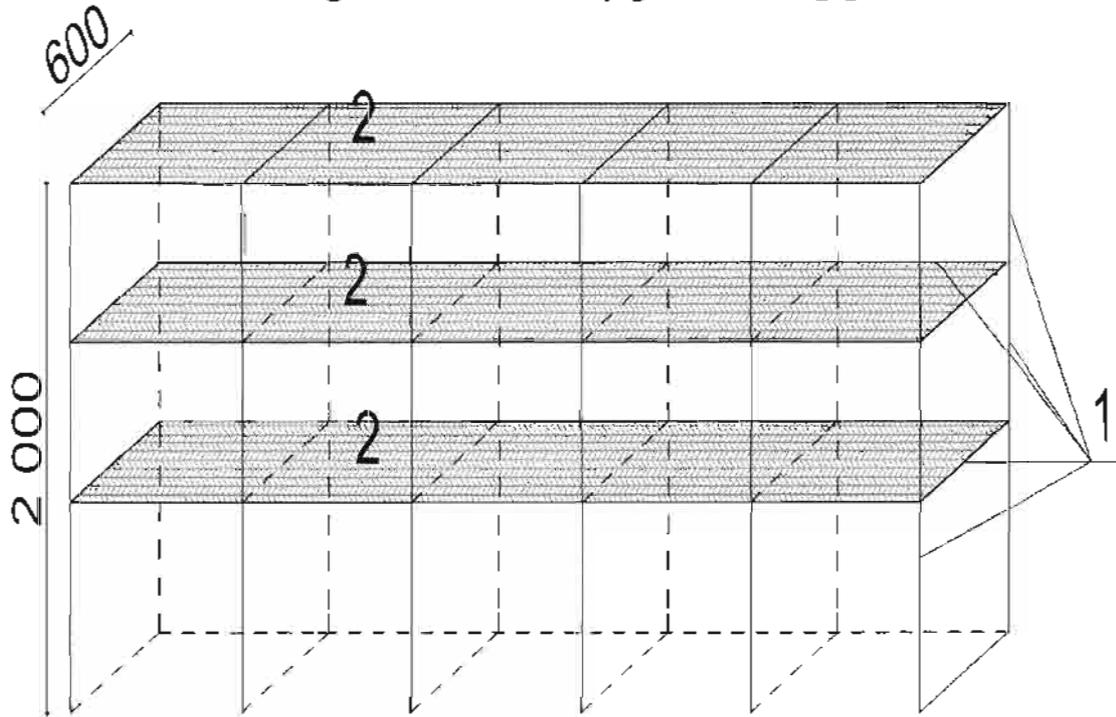

1 ლითონის კუთხოვანა არანაკლებ 45*45*4 მმ

2  ხის ფიგარი არანაკლებ 40 მმ

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ჭუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

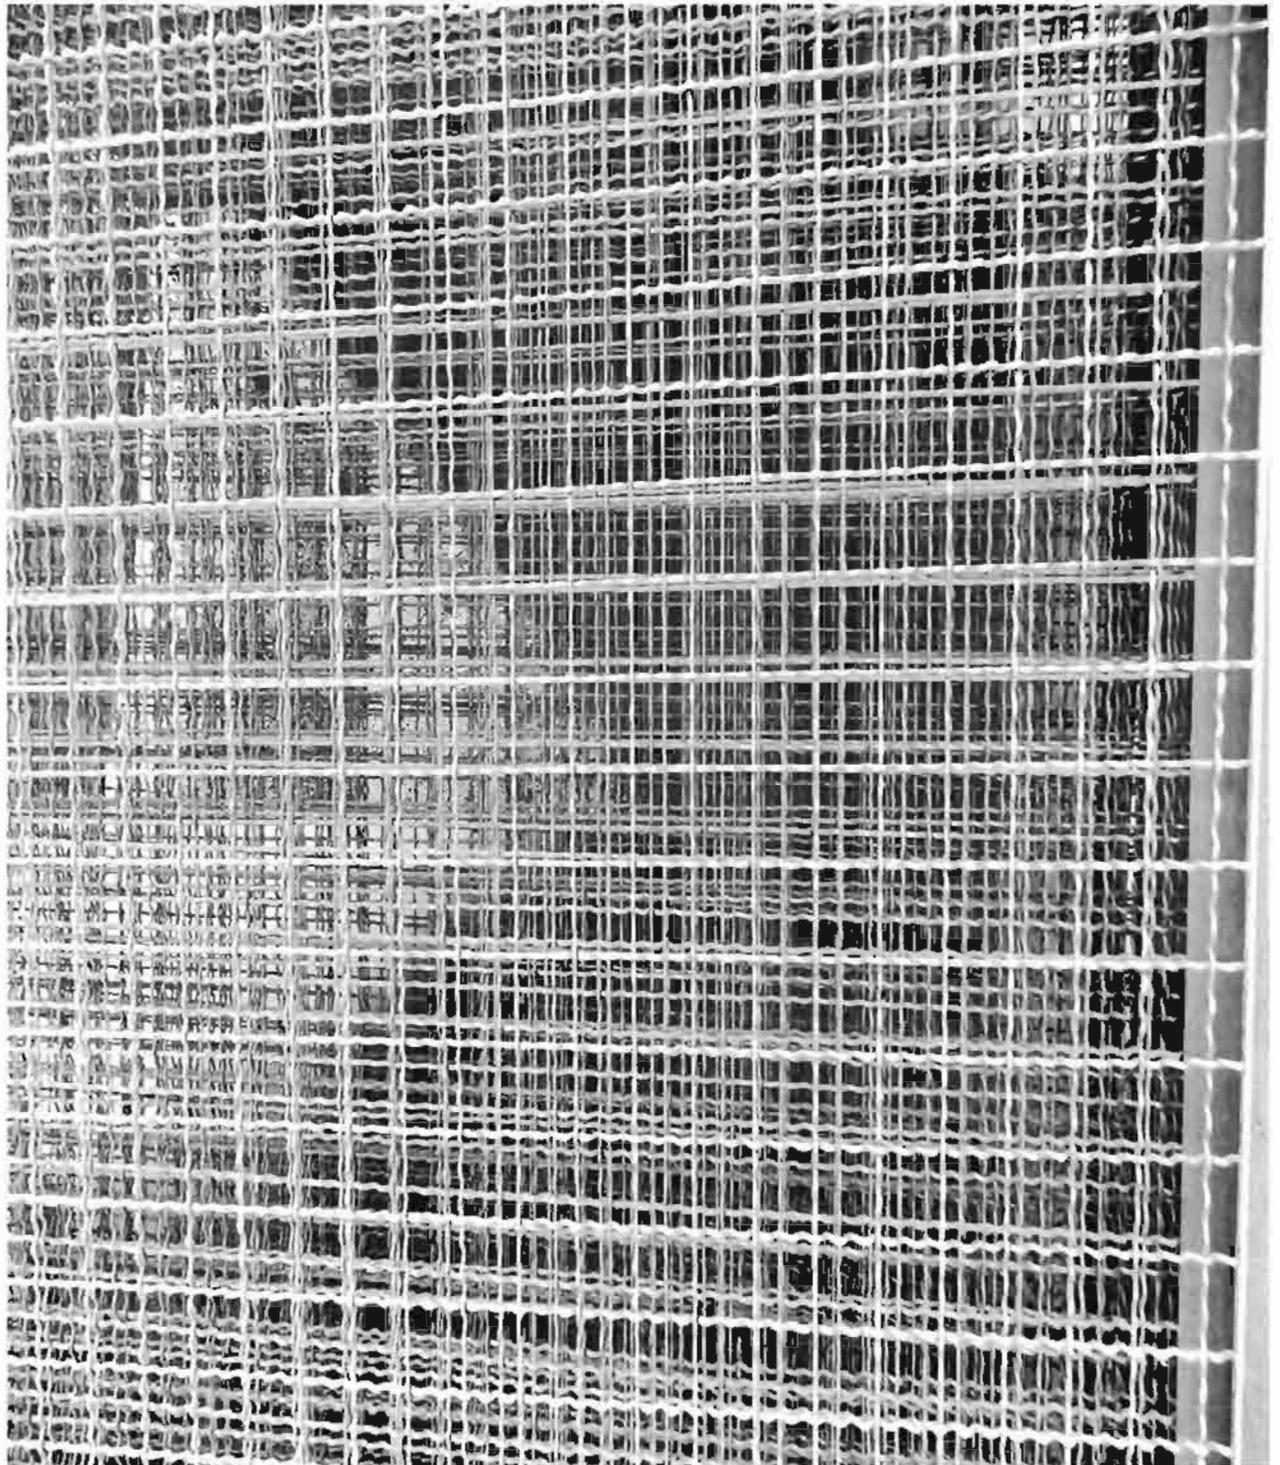


ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ კ/ს "კუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

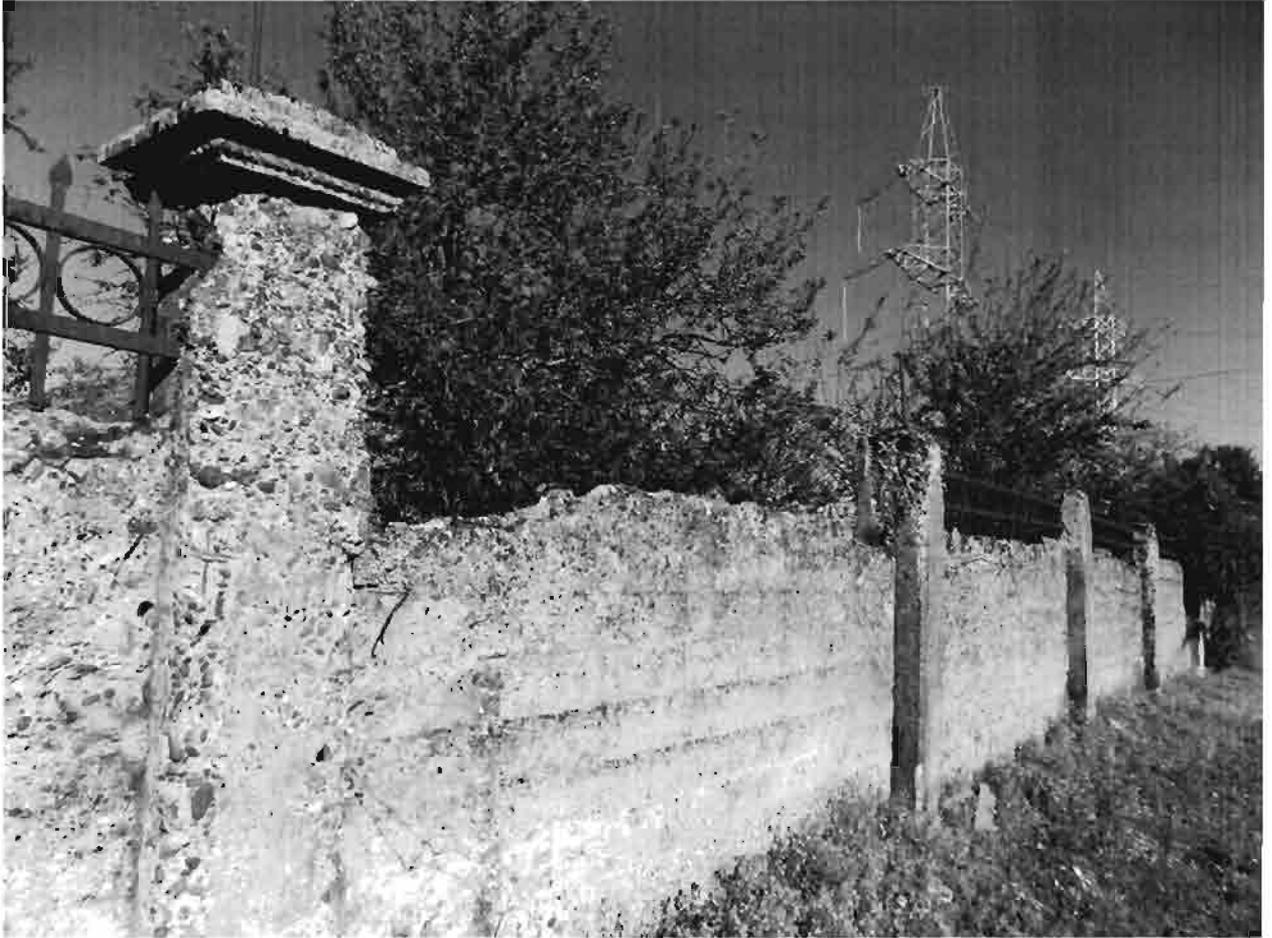

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ჭუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობების, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქს „ჭუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის საშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“



ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

დანართი#3,

სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესები და პირობები

1. სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და ასევე, შემდეგი ნორმატიული აქტების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით: 1) საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 2) საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“; 3) საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“; 4) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“;

2. ობიექტზე დაშვებისათვის და სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო ვალდებულია, განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, მუშაკებისა და ტექნიკის ცვლილების გათვალისწინებით) და სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე სსე-ს მიაწოდოს წერილობითი მონაცემები თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ზრიგადის წევრი) მითითებით;

3. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე მკაცრად ეკრძალებათ ნებისმიერი ზომისა და სახეობის ცივი, ცეცხლსასროლი (მათ შორის, გლუვლულიანი/საფანტის), გაზის, პნევმატური, სათამაშო/სასწავლო და სხვა სახის იარაღის, საბრძოლო მასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიმუშების), ნებისმიერი სახეობისა და რაოდენობის ასაფეთქებელი, მომწამვლელი ან/და ადამიანებისა და გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებების, აგრეთვე, ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა. ობიექტზე დაშვებისას ყველა მივლინებულმა პირმა/მუშაკმა სავალდებულოდ თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი და ობიექტზე შესვლამდე ჩააბაროს ობიექტის დაცვის მუშაკს, ხოლო ობიექტიდან გამოსვლისას გამოართვას უკან. აკრძალულია აგრეთვე, ობიექტზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების) მდგომარეობაში, ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ. ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნებიდან ერთ-ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი შესაბამისი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომენი“

მივლინებული მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი ფინანსური, დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან/და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მივლინებული საწარმოს მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტზე გადაცემულ სიაში;

4. პირი, რომელმაც მიიღო დადგენილი წესით თანხმობა ობიექტზე/ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობის დაცვის ზონაში სამუშაოების შესრულებაზე, ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ელექტრული ქსელის მფლობელთან შეთანხმებული ტექნიკური პირობების და წესების დაცვით და უზრუნველყოს ელექტრული ქსელის უსაფრთხოება. თუ სამუშაოები ხორციელდება საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში, უსაფრთხოების მიზნით სამუშაოთა წარმოებისას სავალდებულოა ელექტრული ქსელის მფლობელი პირის წარმომადგენლის დასწრება;

5. ობიექტზე დაშვებული ყველა მივლინებული პირი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

6. მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტრულ, ქვესადგურის ღგმ-ზე, ეგბ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში მონაწილე პირებს გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ უსაფრთხოების II (მეორე) საკვალიფიკაციო ჯგუფი (ბრიგადის წევრებს), არანაკლებ უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი მეთვალყურეს. განკარგულებით ჩასატარებელი სამუშაოების შემთხვევაში სამუშაოთა მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ III (მესამე) ჯგუფი, ხოლო განწესის შემთხვევაში – არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფი. სამუშაოთა ხელმძღვანელის დანიშვნის შემთხვევაში, მას უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფი;

7. მაღლივი სამუშაოები (სამუშაოები, რომლებიც სრულდება 5 მეტრზე მეტ სიმაღლეზე მიწის, გადახურვის ან სამუშაო ნაფენის ზედაპირიდან) უნდა ჩატარონ მოსიმაღლეებმა. აღნიშნულ სამუშაოებში მონაწილე პირებს (ბრიგადის წევრებს) გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, უნდა ფლობდნენ მაღლივი სამუშაოების წარმოების თეორიულ და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. ამასთან, ვინაიდან, მაღლივი სამუშაოები წარმოადგენს სპეციალურ სამუშაოებს, სპეციალური სამუშაოების ჩატარების უფლების მქონე მომუშავეებს მოწმობაში უნდა ჰქონდეთ გაკეთებული შესაბამისი ჩანაწერი (საქართველოს საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნა);

8. იმ სამუშაოებში მონაწილე ბრიგადის წევრებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტრულ, ქვესადგურის ღგმ-ზე, ეგბ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მუშაობასთან და ყველა სახის სპეციალურ სამუშაოებთან, დასაშვებია ჰქონდეთ უსაფრთხოების I (პირველი) ჯგუფი. ამ შემთხვევაში, ბრიგადას სავალდებულოდ უნდა დაენიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი (მეთვალყურე) – უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი;

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

9. მე-6 და მე-7 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მომუშავეებს უნდა გააჩნდეთ საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების N1 დანართით დადგენილი, მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები. მომუშავეები ვალდებული არიან აღნიშნული მოწმობები სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიონ თან;

10. სამუშაოებზე დაშვებამდე მივლინებულმა პირებმა უნდა გაიარონ შესავალი ინსტრუქტაჟი სსე-ს იმერეთის რეგიონალურ ქსელში ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახურის უსაფრთხოების რეგიონალურ ინჟინერთან, ხოლო პირველადი ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვაში – შესაბამისი ქვესადგურის ხელმძღვანელობასთან, ინსტრუქტაჟის ჟურნალში შეტანით. პირველადი ინსტრუქტაჟი უნდა ჩატარდეს ადგილობრივ თავისებურებათა და გამოყოფილ უბანზე საშიში გარემოებების/ფაქტორების გათვალისწინებით;

11. ქვესადგურის ღგმ-ზე, სეგბ-ების დაცვის ზონაში, მალღივი/სიმაღლეზე, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით სამუშაოები სავალდებულოდ უნდა შესრულდეს განწესი-დაშვებით და უსაფრთხოების ყველა საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიების წინასწარი გატარებით. სავალდებულო წესით უნდა დაინიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი და მეთვალყურე, სამუშაოები უნდა შესრულდეს შესაბამისი ქვესადგურის და რეგიონალური ქსელის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. დაუშვებელია განწესით დადგენილი ღონისძიებების თვითნებური შეცვლა, აგრეთვე განწესით განსაზღვრული სამუშაო ადგილის და დავალების მოცულობის გაფართოება. აუცილებლობის შემთხვევაში, მოქმედი წესების დაცვით წინასწარ/თავიდან უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ყველა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიება.

12. სამუშაოებზე პირველად დაშვებას დამკვეთი ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ასრულებს ენერგობიექტის პერსონალის წარმომადგენელი (დამშვები). დამშვები მიმავლინებელი საწარმოს სამუშაოს ხელმძღვანელის ან პასუხისმგებელი შემსრულებლის დაშვებას ახორციელებს უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მომდევნო დღეებში მომზადებულ სამუშაო ადგილზე განმეორებით დაშვებას დამშვების ნებართვით ახორციელებს მივლინებული პირების მხრიდან გამოყოფილი სამუშაოს ხელმძღვანელი. მივლინებული პირების სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა დამშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის "ცალკეული მითითებების" სტრიქონში ჩანაწერით. ყოველდღიურად ბრიგადის სამუშაოებზე დაშვება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე (მიზნობრივი) ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ, რომელიც ბრიგადის წევრებს უნდა ჩაუტარონ მივლინებული პირების მხრიდან გამოყოფილმა სამუშაოს ხელმძღვანელმა, სამუშაოს მწარმოებელმა და მეთვალყურემ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბრიგადის წევრებთან ინსტრუქტაჟის მკაფიოდ და სრულად ჩატარებაზე, აგრეთვე, მომზადებული სამუშაო ადგილის შესაბამისობაზე განწესით/განკარგულებით განსაზღვრულთან და სამუშაოს შესრულების პირობებიდან გამომდინარე მათ მიერ განხორციელებულ უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებებზე; ასევე, აუცილებელი დამცავი საშუალებების (მათ შორის, სიმაღლიდან

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ვარდნის დამცავი საშუალებების), ინვენტარის, ინსტრუმენტების და სამარჯვების არსებობაზე, გამართულობაზე და სწორად გამოყენებაზე; სამუშაო ადგილზე შემოღობვების, უსაფრთხოების პლაკატებისა და ნიშნების, ჩამკეტი მოწყობილობების დაცულობაზე; სამუშაო ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო და ფეთქებადსაწინააღმდეგო წინასწარი ღონისძიებების გატარებაზე და მკაცრად დაცვაზე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და ზრიგადის წვერებისა და მათ მიერ მოქმედი წესების დაცვაზე; ზრიგადის წვერებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელებაზე;

13. სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს. ამასთან, მივლინებული პირები ვალდებული არიან მკაცრად დაიცვან სამუშაო ადგილზე არსებული მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობა-დანადგარების მუშაობის დადგენილი რეჟიმები და თავიანთი ქმედებებით არ გამოიწვიონ რაიმე შეფერხებები. მივლინებული პირებისათვის გამოყოფილი უბანი/სამუშაო ადგილი უნდა იყოს სავალდებულოდ შემოღობილი უსაფრთხოების ლენტით;

14. მაღლივი/სიმაღლეზე, ეგზების დაცვის ზონაში, ელექტრული, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით, აგრეთვე, ქვესადგურის ღემ-ში მიმდინარე და სხვა სამუშაოები მივლინებულმა პირებმა უნდა ჩაატარონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი სათვალის, დამცავი ჩაფხუტის, დამცავი ქამრის, დამზღვევი ბაგირის, დამცავი ხელთათმანების, შემოღობვის ლენტის და სხვა აუცილებელი საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ/მოიტანონ მივლინებული საწარმოს მუშაკებმა. მათ თან უნდა ჰქონდეთ აგრეთვე, სხვა საჭირო საშუალებებიც (უსაფრთხოების ღობურები, პლაკატები, ნიშნები და სხვა). 1,3 მეტრ და მეტ სიმაღლეზე სამუშაოების წარმოების დროს სამუშაო ადგილები უნდა შემოიღობოს არანაკლებ 1,1 მეტრი სიმაღლის მოაჯირით. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო ადგილზე დამატებით უნდა დაყენდეს დამცავი მოწყობილობები (ბადეები, ფარები, ფენილები და ა.შ.);

15. მივლინებულმა პირებმა სამუშაო ადგილზე უნდა უზრუნველყონ საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. სამუშაოების წარმოების დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად ალუბადი ნივთიერებების გამოყენება. სამუშაოების მიმდინარეობისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქება და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე ეკრძალებათ თამბაქოს მოწევა, გარდა სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;

16. მასალები უნდა დასაწყობდეს რეგიონალური ქსელის და ობიექტის ხელმძღვანელობის მიერ წინასწარ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნულ სამუშაოზე გამოყენებული უნდა იქნას ყველა აუცილებელი დამცავი საშუალება;

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდგობის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

17. სამუშაო ადგილზე ხარაჩოები უნდა მოეწიოს 1985 წლის 30 აპრილს სსრკ-ს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული "უსაფრთხოების წესები ინსტრუმენტითა და სამარჯვებით მუშაობისას" შესაბამისად (საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა); 4 მეტრი სიმაღლის ხარაჩოების ექსპლუატაცია დასაშვებია სამუშაოთა მწარმოებლის ან სამუშაოთა ხელმძღვანელის მიერ მათი მიღების და სამუშაოების წარმოების რეგისტრაციის ჟურნალში მათი რეგისტრაციის შემდეგ, ხოლო 4 მეტრზე მეტი – მიმავლინებელი საწარმოს ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნული კომისიის მიერ მიღების და სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ. ხარაჩოები ექსპლუატაციის პროცესში უნდა მოწმდებოდეს მიმავლინებელი საწარმოს სამუშაოთა მწარმოებლის ან სამუშაოთა ხელმძღვანელის მიერ სამუშაოების დაწყების წინ, აგრეთვე ყოველ 10 დღეში ერთხელ სათანადო ჟურნალში გატარებით; საკიდი ხარაჩოების ექსპლუატაცია დაიშვება მხოლოდ მათი 1 საათის განმავლობაში სტატიკური დატვირთვით გამოცდის შემდეგ, რომელიც ნორმატიულს უნდა აღემატებოდეს 20%-ით. გამოცდის შედეგები უნდა აისახოს მათი მიღების აქტში ან სამუშაოთა საერთო ჟურნალში. ასაწევი ხარაჩოები გარდა აღნიშნულისა, უნდა იყოს გამოცდილი დინამიურ დატვირთვაზე, რომელიც აღემატება ნორმატიულზე 10%-ით მეტით. დაუშვებელია ხარაჩოების გადაადგილება ქარის 10 მ/წ-ზე მეტი სიჩქარის დროს; აკრძალულია მოხარაჩოების რაიმე საშუალებების დაყენება (მიმაგრება) დამონტაჟებულ, მონტაჟის სტადიაში მყოფ ან დასამონტაჟებლად გამზადებულ კონსტრუქციებთან, თუ ამას არ ითვალისწინებს სამუშაოთა წარმოების პროექტი ან არ არის დადასტურებული საპროექტო საწარმოსთან შეთანხმებული ანგარიშით; დატვირთვა ხარაჩოების ფენილებზე არ უნდა აღემატებოდეს სამუშაოთა წარმოების პროექტით ან ტექნიკური პასპორტით დადგენილ სიდიდეებს;

18. მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით მუშაობის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა გაიცეს განწესი, დაინიშნოს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფის მქონე სამუშაოთა ხელმძღვანელი (რომელსაც ინსტრუქტაჟის უტარებს განწესის გამცემი და დამშვები), განისაზღვროს უსაფრთხოების ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებები და სათანადოდ მომზადდეს სამუშაო ადგილი. სამუშაოებში მონაწილე ყველა აშწე-სატრანსპორტო საშუალება, მანქანა-მექანიზმი, ტვირთამწე მანქანები, ბაგირები, ჯალამბარები უნდა იყოს მუშაობისათვის ვარგისი, გამართული და შემოწმებაგავლილი/გამოცდილი. ელექტროსადენების ქვეშ გავლის შემთხვევაში ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების აშწევი და გამოსაწევი ნაწილები უნდა იმყოფებოდეს სატრანსპორტო მდგომარეობაში. აკრძალულია ტვირთამწეების და მანქანა-მექანიზმების დაყენება და მუშაობა 0,4 კვ-დან 35 კვ ჩათვლით ძაბვის ქვეშ მყოფი სეგზ-ის ან/და სალტეების (შლექტების) სადენების ქვეშ. ღამ-ში/სეგზ-ის დაცვის ზონაში ძაბვის მოუხსნელად ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებებისას ავტომობილები, ტვირთამწე მანქანები და მექანიზმები უნდა დამიწდეს. დამიწების დაყენებამდე აკრძალულია ავტომობილების (ტვირთამწე მანქანების, მექანიზმების) კორპუსზე შეხება და მათი სამუშაო ორგანოს,

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდგობის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

ტვირთსაჭერი სამარჯვების და საყრდენი დეტალების გადაადგილება. აკრძალულია ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების მუშაობისას ასაწევი ტვირთის, ტელესკოპური კალათის ქვეშ, აგრეთვე დასაჭიმი სადენების (გვარლების), საბრჯენების, სამაგრების და მომუშავე მექანიზმების უშუალო სიახლოვეს (5 მ-ზე ახლოს) ადამიანების ყოფნა. სამუშაოს ხელმძღვანელმა ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტაროს სამუშაოს მწარმოებელს, მეთვალყურეს და ბრიგადის წევრებს. მანქანა-მექანიზმები უნდა განლაგდეს ისე, რომ არ შეეხოს და არ დააზიანოს ობიექტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა მიწისქვეშა/მიწისზედა კომუნიკაციები. მივლინებული პირების მიერ ობიექტის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება სხვადასხვა სახის ამწე მანქანებით და გამოსაწევ ნაწილებთან მექანიზმებით დასაშვებია იმ პირობით, რომ მანქანის ან მისი გამოსაწევი ან ამწევი ნაწილიდან, ასევე მისი მუშა ორგანოდან ან ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფი ასაწევი ტვირთიდან (მათ შორის, მაქსიმალურად აწეული ტვირთით ან ისრით) ძაბვის ქვეშ მყოფ უახლოეს სადენამდე, არ იქნება ცხრილი #1-ში მითითებულ მანძილებზე ნაკლები. ამასთან, ასეთ სამუშაოებზე განწესის გამცემა უნდა განსაზღვროს ელექტროდანადგარების/ეგბ-ების გამორთვის და დამიწების საჭიროება.

ცხრილი 1. დასაშვები მანძილები ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროგადამცემი ხაზის/ელექტროდანადგარის დენგამტარ ნაწილებამდე მანქანა-მექანიზმების შემთხვევაში:

მაღალი ძაბვის ეგბ-ს ძაბვა, კვ	მანძილი, მ	
	ნომინალური	მინიმალური, ტექნიკური საშუალებებით გაზომვადი
1-მდე	1,5	1,5
1-დან 20-მდე	2,0	2,0
20-დან 35-მდე	2,0	2,0
35-დან 110-მდე	3,0	4,0
110-დან 220-მდე	4,0	5,0
220-დან – 400-მდე	5,0	7,0

19. ობიექტზე სამუშაოების წარმოებისას, ასევე მასალების დასაწყობებისას და ნაგავის გატანისას აკრძალულია ადამიანების მიახლოება ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროდანადგარების/ელექტროგადამცემის ხაზების შემოუღობავ დენგამტარ ნაწილებთან ცხრილი #2-ში მითითებულ მანძილებზე ახლოს:

ცხრილი 2. დენგამტარ ნაწილებამდე მიახლოების დასაშვები მანძილები ადამიანების შემთხვევაში

ძაბვა, კვ	მანძილი ადამიანებიდან და მათ მიერ
-----------	-----------------------------------

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ქ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

		გამოყენებული იარაღებიდან, სამარჯვეებიდან, დროებითი შემოღობვებიდან (მ)
1- მდე	სეგბ-ზე	0,6
	დანარჩენ ელექტრო დანადგარებში	არ ნორმირდება (შეხების გარეშე)
1-35		0,6
110		1,0
150		1,5
220		2,0

20. ობიექტის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზების დაცვის ზონაში/ ელექტროდანადგარებში დაზიანების შემჩნევის შემთხვევაში, მომუშავე დაზიანების ადგილს არ უნდა მიუახლოვდეს 8-10 მეტრის მანძილზე, რათა არ მოხვდეს ბიჯური ძაბვის ზონაში. ბიჯური ძაბვის ზონაში მოხვედრის შემთხვევაში მომუშავემ ბიჯური ძაბვის ზონიდან გამოსვლა უნდა განახორციელოს მოკლე ნაბიჯებით ფეხის ტერფების ერთმანეთისგან მოუცილებლად 8-10 მეტრის მანძილზე;

21. სამუშაო ადგილის მიმდებარედ მოქმედ ელექტროდანადგარებში/ეგბ-ების დაცვის ზონაში ელექტროუსაფრთხოების უზრუნველყოფის ტექნიკური ღონისძიებები (საჭიროების შემთხვევაში, დისპეტჩერული განაცხადების გადაცემა და ელექტროდანადგარების გამორთვების ჩატარება დადგენილი წესით, ძაბვის არარსებობის შემოწმება, გადასატანი დამიწების დადება, შემოღობვა, პლაკატების ჩამოკიდება და სხვა) უნდა შესრულდეს: არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფის მქონე მორიგე-ოპერატიული პერსონალის მიერ, სამუშაო ადგილის მომზადებასა და დაშვებაზე ზემდგომი ოპერატიული პერსონალის სავალდებულო განკარგულებით/ნებართვით. ამასთანავე, სამუშაო ადგილზე მანქანა-მექანიზმების დამიწებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აგრეთვე, მივლინებულ პირებს. 1000 ვოლტზე დაბალი ძაბვის ელექტრული ქსელის მოწყობის და მოქმედ ელექტრულ ქსელთან მიერთების სამუშაოები უნდა შესრულდეს განწყისის გაცემით, პასუხისმგებელი პირების დანიშვნით, უსაფრთხოების ყველა საჭირო ღონისძიების წინასწარი გატარებით;

22. სამუშაოთა წარმოებისას მომუშავეებმა უნდა დაიცვან სახიფათო ზონების საზღვრები, რომელთა ფარგლებში შესაძლებელია საფრთხის წარმოქმნა საგნების ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით, ცხრილი #3-ის შესაბამისად:

ცხრილი 3. სახიფათო ზონების საზღვრები

საგნის შესაძლო ჩამოვარდნის სიმაღლე, მეტრი	ტვირთის გადაზიდვის ადგილებთან ახლოს მანქანებით გადაადგილებული ტვირთის მაქსიმალური გაზარტის ტრაექტორიის	მოქმედი/ მშენებარე შენობა-ნაგებობების ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან),	დასანგრევი (სადემონტაჟო) შენობა-ნაგებობის ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან),
---	--	---	---

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს "ქუთაისი 220"-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს "ფერო 220"-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

	ჰორიზონტალური პროექციიდან), მეტრი	მეტრი	მეტრი
10 მ-მდე	4	3,5	7
20 მ-მდე	7	5	10
20-დან 70 მ-მდე	10	7	14

23. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს (შესვენება სადილოზე, მუშაობის პირობებით გამოწვეული შესვენება და სხვა) ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად. სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობისას, შესვენებისას და დამთავრებისას ბრიგადის წევრებს, სამუშაოს ხელმძღვანელს, სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) ეკრძალებათ შემოღობილი სამუშაო ადგილის გარეთ არსებული ელექტროდანადგარების/ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენებზე და სხვა კონსტრუქციებზე ასვლა; ასევე, ღია, დახურულ, კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობებში და სხვა ტექნოლოგიურ სათავსოებში შესვლა. ქვესადგურის მართვის ფარის/სამორიგეო ოთახში სამუშაოების წარმოებისას სავალდებულოა დაინიშნოს მეთვალყურე, რომელიც მუდმივად უნდა იმყოფებოდეს სამუშაო ადგილზე;

24. სამუშაო დღის დამთავრებით გამოწვეული სამუშაოს შეწყვეტის დროს ბრიგადა უნდა გავიდეს სამუშაო ადგილიდან. უსაფრთხოების პლაკატები, დროებითი შემოღობვები, ალმები არ იხსნება. სამუშაოს დროებით შეწყვეტას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) აფორმებს განწესის თავის ეგზემპლარში ხელის მოწერით. მომდევნო დღეებში სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა დამშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის "ცალკეული მითითებების" სტრიქონში ჩანაწერით. მეორე დღეს მუშაობის განახლებისას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) უნდა დარწმუნდეს დატოვებული უსაფრთხოების პლაკატების, დროებითი შემოღობვების, ალმების სიმართელესა და ხელუხლებლობაში, ასევე მომუშავეთათვის აუცილებელი ყველა სახის დამცავი აღჭურვილობის არსებობაში/გამართულობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვას ბრიგადა სამუშაოდ. დაშვება, რომელსაც ახორციელებს ელექტროტექნიკური/ ოპერატიული პერსონალი, ფორმდება განწესის ორივე ეგზემპლარში, ხოლო დაშვება, განხორციელებული სამუშაოს ხელმძღვანელის ან სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) მიერ ფორმდება განწესის იმ ეგზემპლარში, რომელიც ინახება სამუშაოს მწარმოებელთან (მეთვალყურესთან);

25. სამუშაოს სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოს მწარმოებელმა (მეთვალყურემ) უნდა გაიყვანოს ბრიგადა სამუშაო ადგილიდან, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები, უსაფრთხოების გადასატანი პლაკატები, ალმები და განწესში გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება ხელის მოწერით. სამუშაოს ხელმძღვანელმა სამუშაო ადგილის შემოწმების შემდეგ განწესში უნდა გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება. სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) გაფორმებულ

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (#NAT180012166) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ კ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოდობვის, სააკუმულატორო ოთახის და კ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. მიმწოდებელი შპს „თბომშენი“

განწესს აბარებს დამშვებს, მისი არ ყოფნის შემთხვევაში კი განწესის გამცემს. ამასთან, სამუშაოების დამთავრების შესახებ სავალდებულოდ უნდა ეცნობოთ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სხვა შესაბამის წარმომადგენლებსაც. გაფორმებული და დახურული განწესის დედნები საბოლოოდ ინახება ქვესადგურის განწესების საქაღალდეში.

“შემსყიდველი”:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

სულხან ზუმბურიძე
რეაბილიტაციის მმართველი



“მიმწოდებელი”:

შპს "თბომშენი"

ლუტუშა კვანტალიანი
დირექტორი





ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE43183-18

14 სექტემბერი 2018 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს თბომშენი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 212681249

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. ქუთაისი, ლომოურის II ჩიხი, №4

ბენეფიციარი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204995176

საგარანტო თანხა: 7,111.10 (შვიდი ათას ასთერთმეტი და 10/100) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT180012166

შედეგობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქ/ს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შემობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვეს, გარანტი, თანხმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სათელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 7,111.10 (შვიდი ათას ასთერთმეტი და 10/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს, 31 მაისი 2019 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩაუვლით.

წინამდებარე გარანტიის დასრულებიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ საბანკო ოჯისში, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (LTC, GMT +04:00 საათი) 17.00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ.#29ა, თბილისი 0160, საქართველო.


საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე.

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დაბრუნება სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
ფიქრია კვეციანი
საერთაშორისო საბანკო საქმეების სამსახურის უფროსი





ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE43183-18

14 სექტემბერი 2018 წელი

თბილისი

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტიის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტიის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს თბომენი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი 212681249

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. ქუთაისი, ლომოურის II ჩიხი, №4

ბენეფიციარი, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204995176

საგარანტიო თანხა: 7,111.10 (შვიდი ათას ასთერთმეტი და 10/100) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT180012166

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა ქ/ს „ქუთაისი 220“-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის, ამორტიზირებული შენობების დემონტაჟის, გარე და შიდა შემოღობვის, სააკუმულატორო ოთახის და ქს „ფერო 220“-ის მართვის ფარის შენობაში სააკუმულატორო ოთახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩეეს, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, ანუ უმეტეს ჯამში 7,111.10 (შვიდი ათას ასთერთმეტი და 10/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის, გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრბრუნად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან დამატებითი პტკიცებულებების წარმოდგენის საქიროების გარეშე, მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს, 31 მაისი 2019 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩაველათ.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობით მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტიის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავე ოჯისში, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (UTC + GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ.#29ა, თბილისი 0160, საქართველო.


საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტიის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტიის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დახიობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტიის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
ფერია კველია
საერთაშორისო ბანკური მომსახურების სამსახურის უფროსი



162 Parnavaz Mepe City Batumi.
UEN 445406819

შ.პ.ს. „იმედაჯ“
(+995) 568-18-83-83
l.imedadze@mail.ru

შ.პ.ს. „იმედაჯ“
UEN 445406819

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფელ სარბევში, ძველადგურის
“მუთასი-220”-ის ტერიტორიაზე სადრენაჟე ქსელის მოწყობა

დამკვეთი: საგარეოეკონომიკის სამსახურის დირექტორის სისტემა



დირექტორი:

ლ. იმედაჯი



შ. ბატუშვილი 2017 წელი

არსებული სიტუაციის
ამსახვეული ფოტოგასახლა

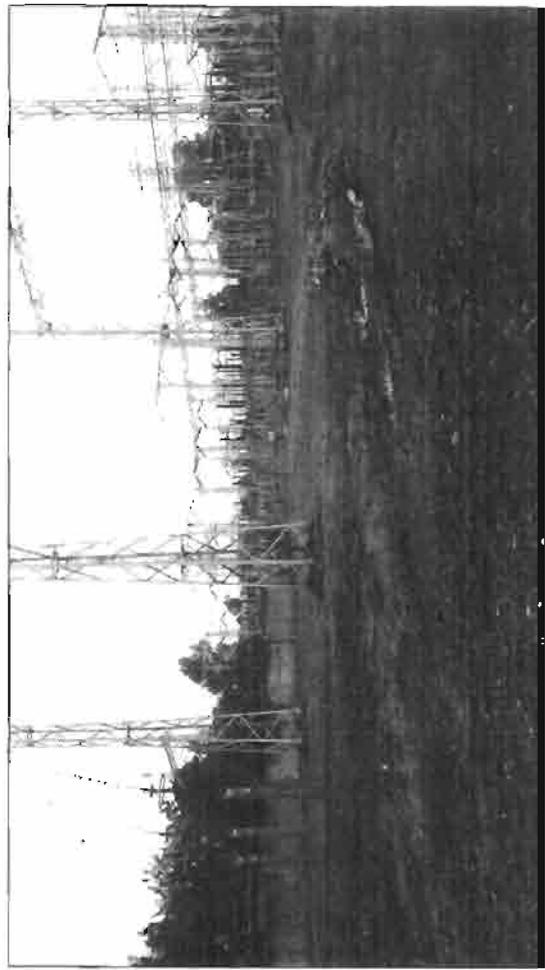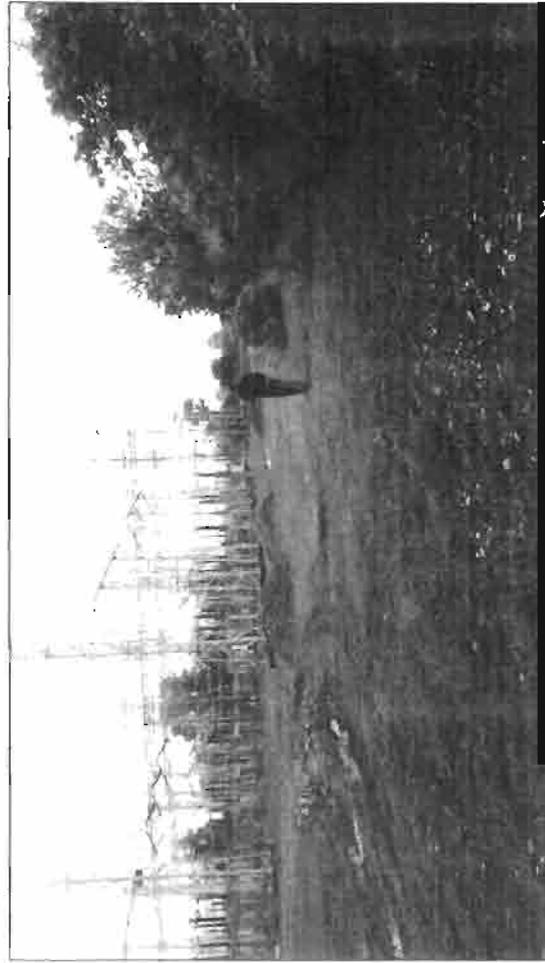

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

