

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სსე-ს სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის (ტენდერის #SPA160015102) საშუალებით შესყიდვის მიზნით მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის სხდომის

ოქმი №2

თარიღი 2.06.2015

სხდომას ესწრებოდნენ:

1. კომისიის თავმჯდომარე – სულხან ზუმბურიძე
2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე — მამუკა სხილაძე
3. კომისიის წევრი—მამუკა პაპუაშვილი
4. კომისიის წევრი— დავით გოლოშვილი

აპარატის წევრები:

1. მანანა ამაღლობელი
2. გიორგი გოგინაშვილი
3. სოფიო ბასილაძე

კონსულტანტები:

1. გელა ტატიშვილი
2. თემურ ქობალია

დღის წესრიგი:

1. ელექტრონული ტენდერი № SPA160015102-ში (სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე) სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

განხილვა:

1. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ (ტენდერის № SPA160015102) სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე სატენდერო დოკუმენტაცია საჭიროებს ცვლილებას, კერძოდ: სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4 მუხლს („ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ“) და მე-6 მუხლს („სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია“) დაემატოს პუნქტები „ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის, საბანკო გარანტიის“ თაობაზე.
2. სატენდერო კომისიამ განიხილა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე მიმდინარე ტენდერში (ტენდერის № SPA160015102) სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანის საკითხი.
3. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ასევე ამავე დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ეტაპზე, სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია სისტემაში ატვირთული დოკუმენტაციის გაუქმებით და შეცვლილი დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთვის გზით – მხოლოდ „ტენდერი გამოცხადებულია“ –

სტატუსის მინიჭებისას, რომელიც მოიცავს სატენდერო განცხადების სისტემაში განთავსებიდან სატენდერო წინადადებების მიღების დაწყებამდე ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ტენდერი გამოცხადდა 24.05.2016. და სატენდერო წინადადებების მიღება იწყება 09.06.2016, სატენდერო კომისიამ იმსჯელა და დასაშვებად მიიჩნია მიმდინარე ტენდერში სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა“, კერძოდ: სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4 მუხლში („ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ“) და მე-6 მუხლში („სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია“) დაემატოს პუნქტები „ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფის, საბანკო გარანტიის“ თაობაზე.

სატენდერო კომისიამ დაადგინა:

1. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს მიმდინარე ტენდერში (ელ. ტენდერი # № SPA160015102) მოახდინოს სატენდერო დოკუმენტაციის კორექტირება, სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს უზრუნველყოს კორექტირებული სატენდერო დოკუმენტაციის დაუყოვნებლივ ატვირთვა კერძოდ: გაუქმდეს უკვე არსებული სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში განთავსებული სსე-ს სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია და განახორციელოს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სსე-ს სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე კორექტირებული სატენდერო დოკუმენტაციის ატვირთვა შემდეგი რედაქციით:

სარჩევი

1. სატენდერო დოკუმენტაცია.....	4
2.სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი.....	5
3. სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობა და მოთხოვნები:	5
4.ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #.....	19
5. დანართი N 1, ხარჯთაღრიცხვის ფორმა	29
6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:	60
7.საკონტაქტო ინფორმაცია	60

სატენდერო დოკუმენტაცია

სსე-ს სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1 კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდ. მეწარმეებისთვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

ბ) ცნობა საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.1.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის - ცნობა საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.1.3 ფიზიკური პირებისთვის - ცნობა საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.2. პრეტენდენტის მიერ (გარდა არარეზიდენტი პრეტენდენტისა) სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში წინადადებების მიღების ეტაპის დაწყების შემდეგ.

არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში, მან უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული, 1.1 პუნქტის შესატყვისი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ქართულ ენაზე ნოტარიულად დამოწმებულ თარგმანთან ერთად. ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, საკვალიფიკაციო დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში წინადადებების მიღების ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა.

1.3. ამ პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეს.

1.4. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ასლების) წარმოდგენა „შემსყიდველ“ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის მეშვეობით. „შემსყიდველ“ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს „პრეტენდენტს“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისთვის.

შენიშვნა: პრეტენდენტს არ უნდა გააჩნდეს ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა

2.სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი.

2.1 სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესრულების ვადაა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.

შენიშვნა: ობიექტზე დაშვების პროცედურები გაწერილია სატენდერო დოკუმენტაციის მე-4-ის მუხლის (ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #) დანართი#3-ში (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები).

2.2 სამუშაოების უნდა ჩატარდეს შემდეგ მისამართებზე (სამუშაოების შესრულების ადგილი) : ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქუჩა #2, „სსე“-ს სათაო ოფისი.

2.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების ვადა.

3. სს „სსე“-ის სარემონტო სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობა და მოთხოვნები:

3.1 სს „სსე“-ის სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური პირობა:

1. „მიმწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა აწარმოოს „სსე“-ს ფუნქციონირებისთვის ნორმალური რიტმის შენარჩუნების პირობებში.
2. რემონტთან დაკავშირებული ყველა მასალა (ექსპლუატაციაში არმყოფი, ახალი) შეძენილი უნდა იყოს „მიმწოდებლის“ მიერ.
3. შენობის შიდა და გარე კედლების, კარების, გრანიტის, კაფელის, მეტლახის, ფარდა- ჟალუზის, შეკიდული ჭერის, ხალიჩის, ალუმინის პროფილების, ალუმინის ზოლოვანას, მეტალო პლასტმასის ტიხრის და ლამინირებული იატაკის ფერი შეთანხმებულ იქნას “შემსყიდველთან”.
4. როზეტები უნდა იყოს ყველა დამიწებით.
5. ყველანაირი სანათის ტიპი და ფორმა შეთანხმებული იქნას „შემსყიდველთან“.
6. ფასადის კედლების ლესვის დროს უნდა მოხდეს კედლებიდან არსებული დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა, გასუფთავება.
7. ქვიშა-ცემენტით შეღესილი კედლები უნდა იყოს გასწორებული თარაზოში (მაიაკში).
8. კედლების დამუშავება და შეღებვა ნიშნავს: კედლის დამუშავებას წებო ემულსიის ხსნარით, ფითხით (დაიშპავლოს და გაიშკურკოს) რამოდენიმე ფენად, შეიღებოს სულ მცირე ორი ფენა საღებავით სრულ დაფარვამდე.
9. ახალი ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით ნიშნავს: ახალი ქვიშა-ცემენტის მოწყობას არანაკლებ 30მმ სისქის ისეთი დახრით, რომ წყლის შეკრებვა მოხდეს ერთ წერტილში
10. შეკიდული ჭერის გამაგრება ნიშნავს: არსებული კარკასის გასწორებას და მასში ახალი პროფილების დამატებას
11. ლითონის ჩარჩო დამზადებული უნდა იყოს ლითონის 40X40მმ-იანი მილკვადრატით მასში ჩამონტაჟებული კარით დამაგრებული უნდა იყოს არსებულ კედელზე და გადახურვის ფილაზე შესაბამისი სამონტაჟო ნორმების შესაბამისად.
12. ალუმინის პროფილის მოწყობა ბეტონის საფეხურებზე ნიშნავს: დაიხვრიტოს საფეხური სამ გვერდზე და დუბელ-შურუპების გამოყენებით მოეწყოს ალუმინის პროფილი

13. ხალიჩის მოწყობა ბეტონის საფეხურებზე ნიშნავს : ბეტონის საფეხურზე და დამაგრებულ ალუმინის პროფილში ხალიჩის ჩამაგრებას წებოს გამოყენებით
14. ავეჯის ფერი შეთანხმებულ იქნას „შემსყიდველთან“.
15. ავეჯში გამოყენებული დ.ვ.პ. უნდა იყოს ლამინირებული, ავეჯის შესაბამისი ფერის.
16. ავეჯში გამოყენებული სახელოური უნდა იყოს მეტალის.
17. ლამინატისაგან დამზადებულ ავეჯს უნდა ქონდეს ძირზე მიმაგრებული პლასტმასის 5 მმ-იანი სისქის ქოში და გადაბმის (შურუფები) ადგილას სპეციალური მრგვალი მისაწეპებელი (ლიპურჭკა) ავეჯის შესაბამისი ფერის.
18. სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ტერიტორია უნდა გასუფთავდეს, ფანჯრები, კედლები, იატაკი, კარებები უნდა გაიწმინდოს, სამშენებლო ნაგავი გატანილ იქნას ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ (ნაგავსაყრელზე).

შენიშვნა:

1. ტექნიკურ პირობას თან ერთვის:
 - პროექტი – 10 გვ.
 - ლამინატის სამზარეულოს კარადის ნიმუში – 1 გვ.
 - ქაღალდის ჩასადების ნიმუში – 1 გვ.
2. პრეტენდენტს შეუძლია სარემონტო ობიექტი ადგილზე წინასწარ დაათვალიეროს.




შპს მრავალკუთხედი
artidea2015@gmail.com

სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სათავე
ოფისის სათათბირო ოთახის, სამზარეულოს და სარდაფის
სავენტილაციო სისტემის მოწყობა

თბილისი 2016 წ.

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

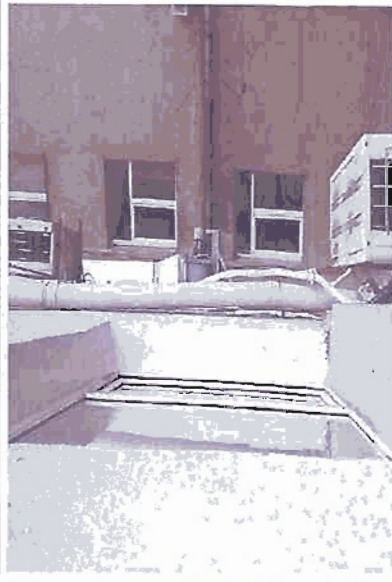

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სამუშაოების შესყიდვაზე.

პროექტის სახელწოდება:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ოფისის საკონსტრუქციო დარბაზში, საგარეულოში და სარდაფში საინჟინერო-სახატების მოწყობა

დაამუშავა:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვრელება N 60-7-116-34

ექსპლუატაცია:

პირობითი აღნიშვნა:

შენიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ოფისის საკონსტრუქციო დარბაზში, საგარეულოში და სარდაფში საინჟინერო-სახატების მოწყობა

დაამუშავა:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვრელება N 60-7-116-34

ექსპლუატაცია:

პირობითი აღნიშვნა:

შენიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის საჯარო ოფისის საკონსტრუქციო დარბაზში, საგარეულოში და სარდაფში საინჟინერო-სახატების მოწყობა

დაამუშავა:

სსს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვრელება N 60-7-116-34

ექსპლუატაცია:

პირობითი აღნიშვნა:

შენიშვნა:


ელექტრონული ტენდერები სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

 შპს მრავალკუთხედი	
პროექტის სახელწოდება:	სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონიკის საზოგადოების საკონფერენციო დარბაზში, საზოგადოებრივი და სარეკლამო სავაჭრო-საინფორმაციო სისტემების მოწყობა
დამკვეთი:	სს. საგარეო ურთიერთობების სახელმწიფო ელექტრონიკის სისტემების ხელმძღვანელობა N 60-7-116-34
უქმსპოლიტიკა:	
პროექტის აღნიშვნა:	
შენიშვნა:	
თანამდებობა:	გენერალ-მაიორი
დირექტორი:	ო. თაყაიშვილი
ინჟინერი:	შ. მამუკაშვილი
თარიღი:	გერმანული: გერმანული N
თარიღი:	28/03/2016

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

COUNTRY	CITY	DATE	TIME	DURATION	TYPE	STATUS	REMARKS	ATTENDANCE		COST		REVENUE		PROFIT		BUDGET		ACTUAL		VARIANCE		TOTAL	
								ADULTS	CHILDREN	TOTAL	ADULTS	CHILDREN	TOTAL	ADULTS	CHILDREN	TOTAL	ADULTS	CHILDREN	TOTAL	ADULTS	CHILDREN	TOTAL	ADULTS
USA	NEW YORK	1984	10/15	18:00	CONCERT	Completed	Successful	120	80	200	100	150	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	
USA	NEW YORK	1984	10/16	18:00	CONCERT	Completed	Successful	130	90	220	110	160	60	110	60	110	110	110	110	110	110	110	
USA	NEW YORK	1984	10/17	18:00	CONCERT	Completed	Successful	140	100	240	120	170	70	120	70	120	120	120	120	120	120	120	
USA	NEW YORK	1984	10/18	18:00	CONCERT	Completed	Successful	150	110	260	130	180	80	130	80	130	130	130	130	130	130	130	
USA	NEW YORK	1984	10/19	18:00	CONCERT	Completed	Successful	160	120	280	140	190	90	140	90	140	140	140	140	140	140	140	
USA	NEW YORK	1984	10/20	18:00	CONCERT	Completed	Successful	170	130	300	150	200	100	150	100	150	150	150	150	150	150	150	
USA	NEW YORK	1984	10/21	18:00	CONCERT	Completed	Successful	180	140	320	160	210	110	160	110	160	160	160	160	160	160	160	
USA	NEW YORK	1984	10/22	18:00	CONCERT	Completed	Successful	190	150	340	170	220	120	170	120	170	170	170	170	170	170	170	
USA	NEW YORK	1984	10/23	18:00	CONCERT	Completed	Successful	200	160	360	180	230	130	180	130	180	180	180	180	180	180	180	
USA	NEW YORK	1984	10/24	18:00	CONCERT	Completed	Successful	210	170	380	190	240	140	190	140	190	190	190	190	190	190	190	
USA	NEW YORK	1984	10/25	18:00	CONCERT	Completed	Successful	220	180	400	200	250	150	200	150	200	200	200	200	200	200	200	
USA	NEW YORK	1984	10/26	18:00	CONCERT	Completed	Successful	230	190	420	210	260	160	210	160	210	210	210	210	210	210	210	
USA	NEW YORK	1984	10/27	18:00	CONCERT	Completed	Successful	240	200	440	220	270	170	220	170	220	220	220	220	220	220	220	
USA	NEW YORK	1984	10/28	18:00	CONCERT	Completed	Successful	250	210	460	230	280	180	230	180	230	230	230	230	230	230	230	
USA	NEW YORK	1984	10/29	18:00	CONCERT	Completed	Successful	260	220	480	240	290	190	240	190	240	240	240	240	240	240	240	
USA	NEW YORK	1984	10/30	18:00	CONCERT	Completed	Successful	270	230	500	250	300	200	250	200	250	250	250	250	250	250	250	
USA	NEW YORK	1984	10/31	18:00	CONCERT	Completed	Successful	280	240	520	260	310	210	260	210	260	260	260	260	260	260	260	
USA	NEW YORK	1984	11/01	18:00	CONCERT	Completed	Successful	290	250	540	270	320	220	270	220	270	270	270	270	270	270	270	


ეკლესიური ტენდენციის „საქართველოს სახელმწიფო ეკლესიის სტრუქტურის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

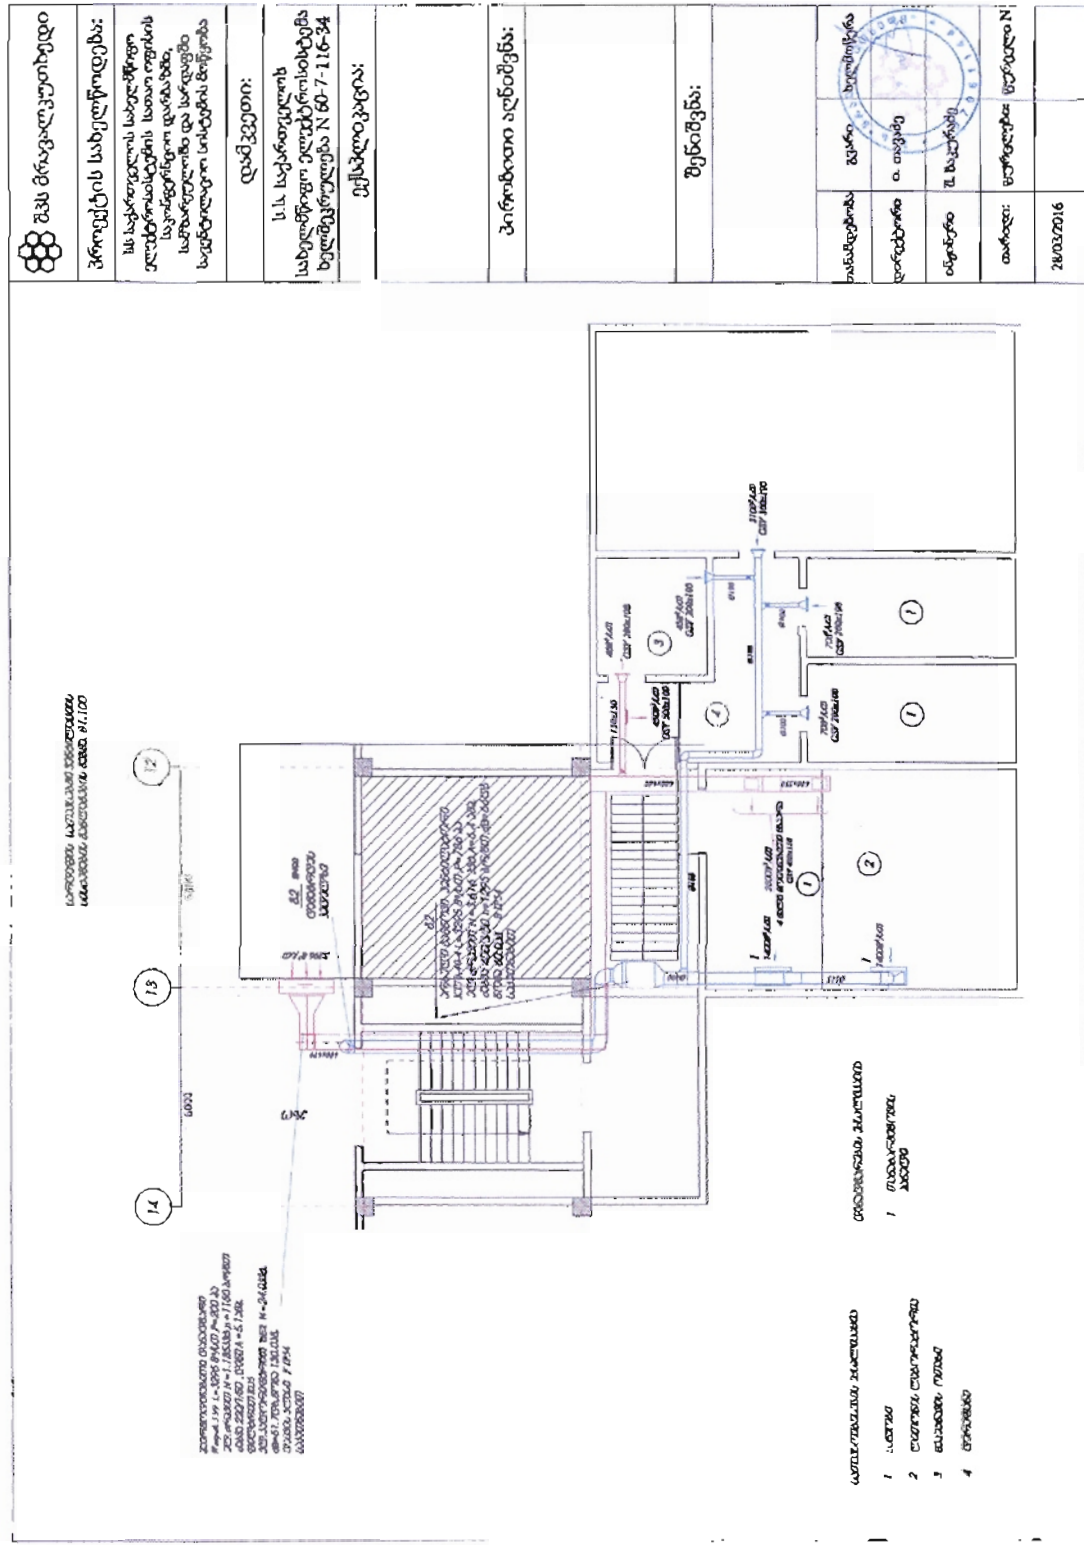


ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შეყიდვაზე.


[illegible]

ელოქტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელოქტრონის ტენდერების“ სათაო ოფისის სამუშაოების შესყიდვაზე.

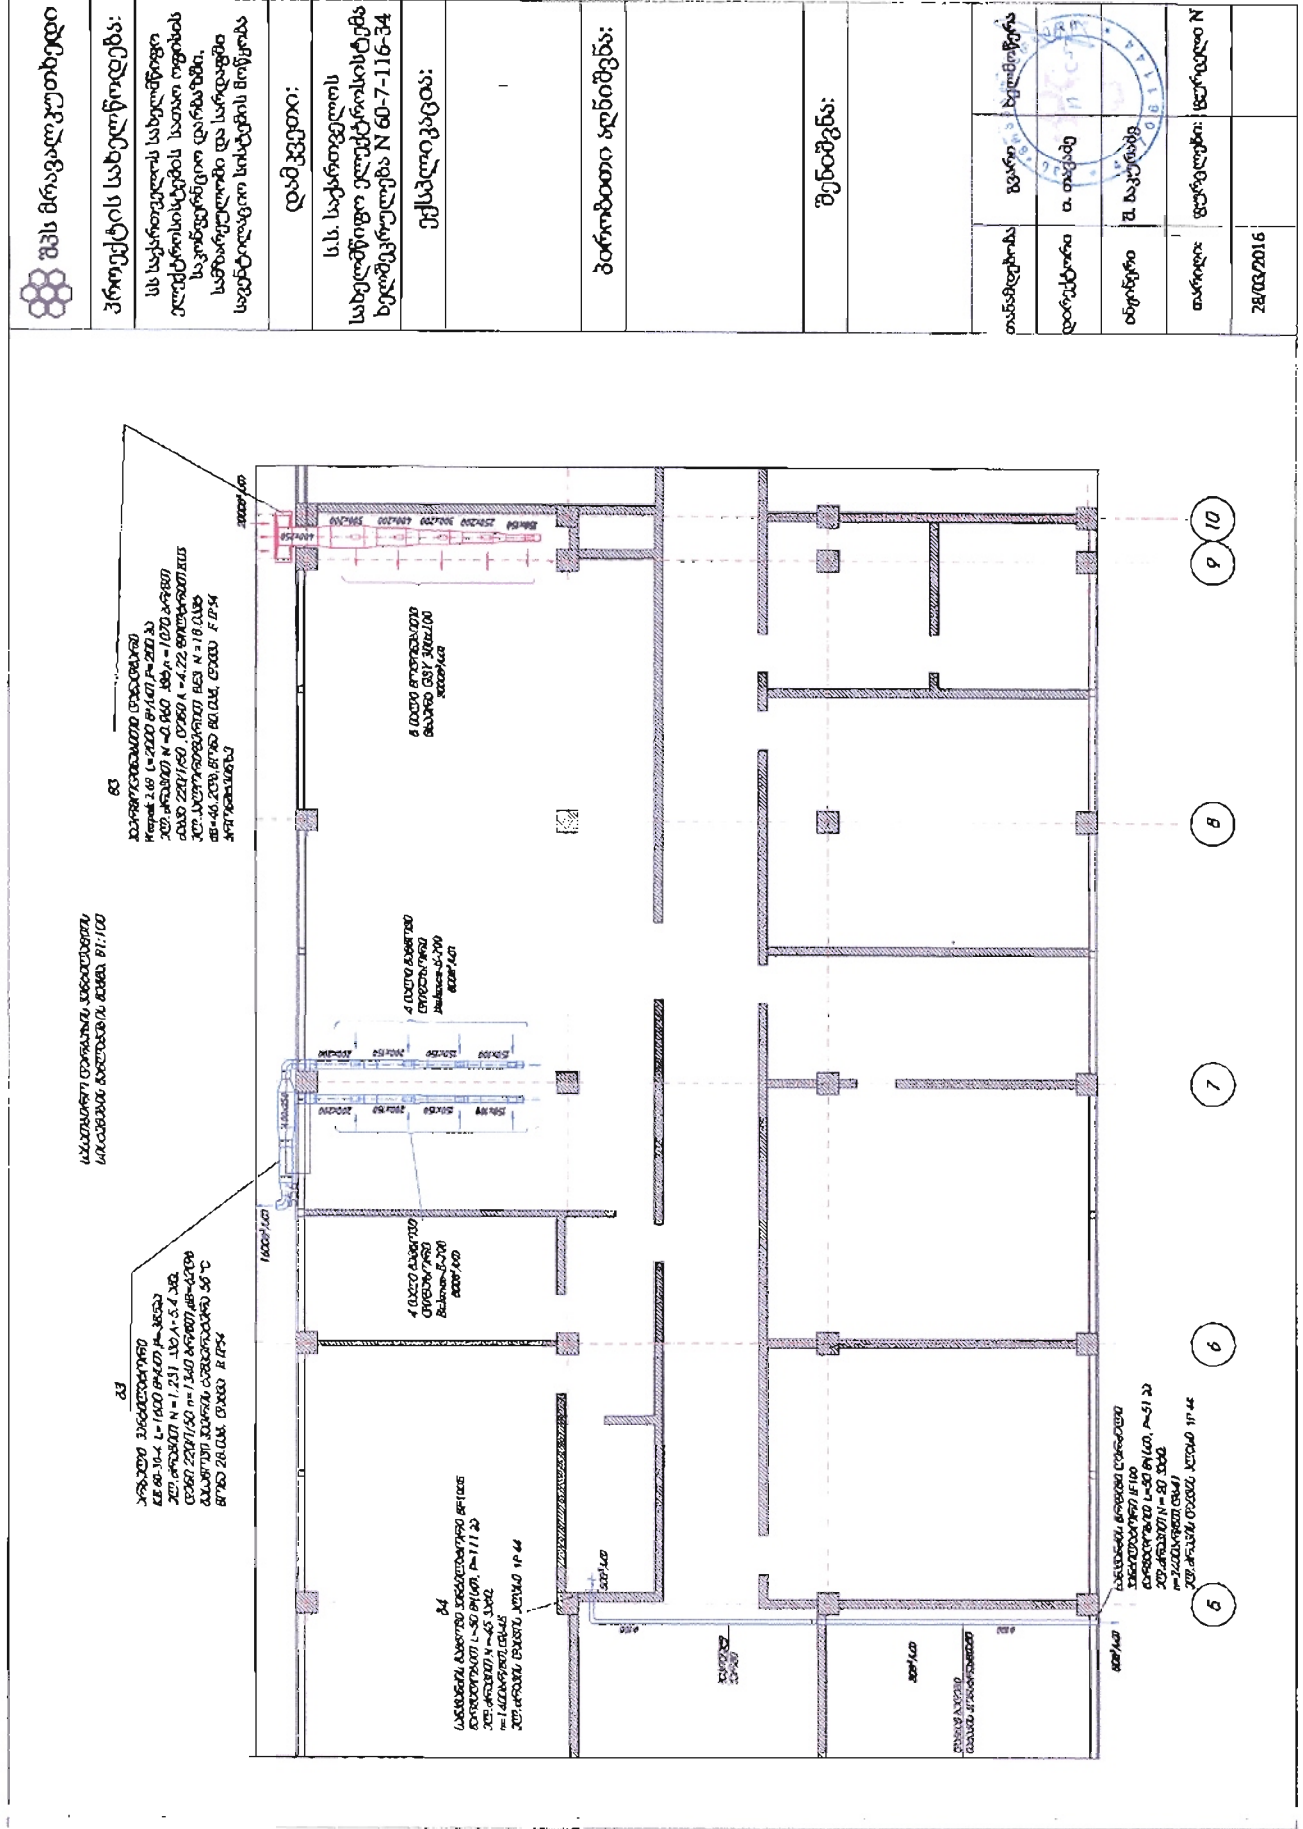

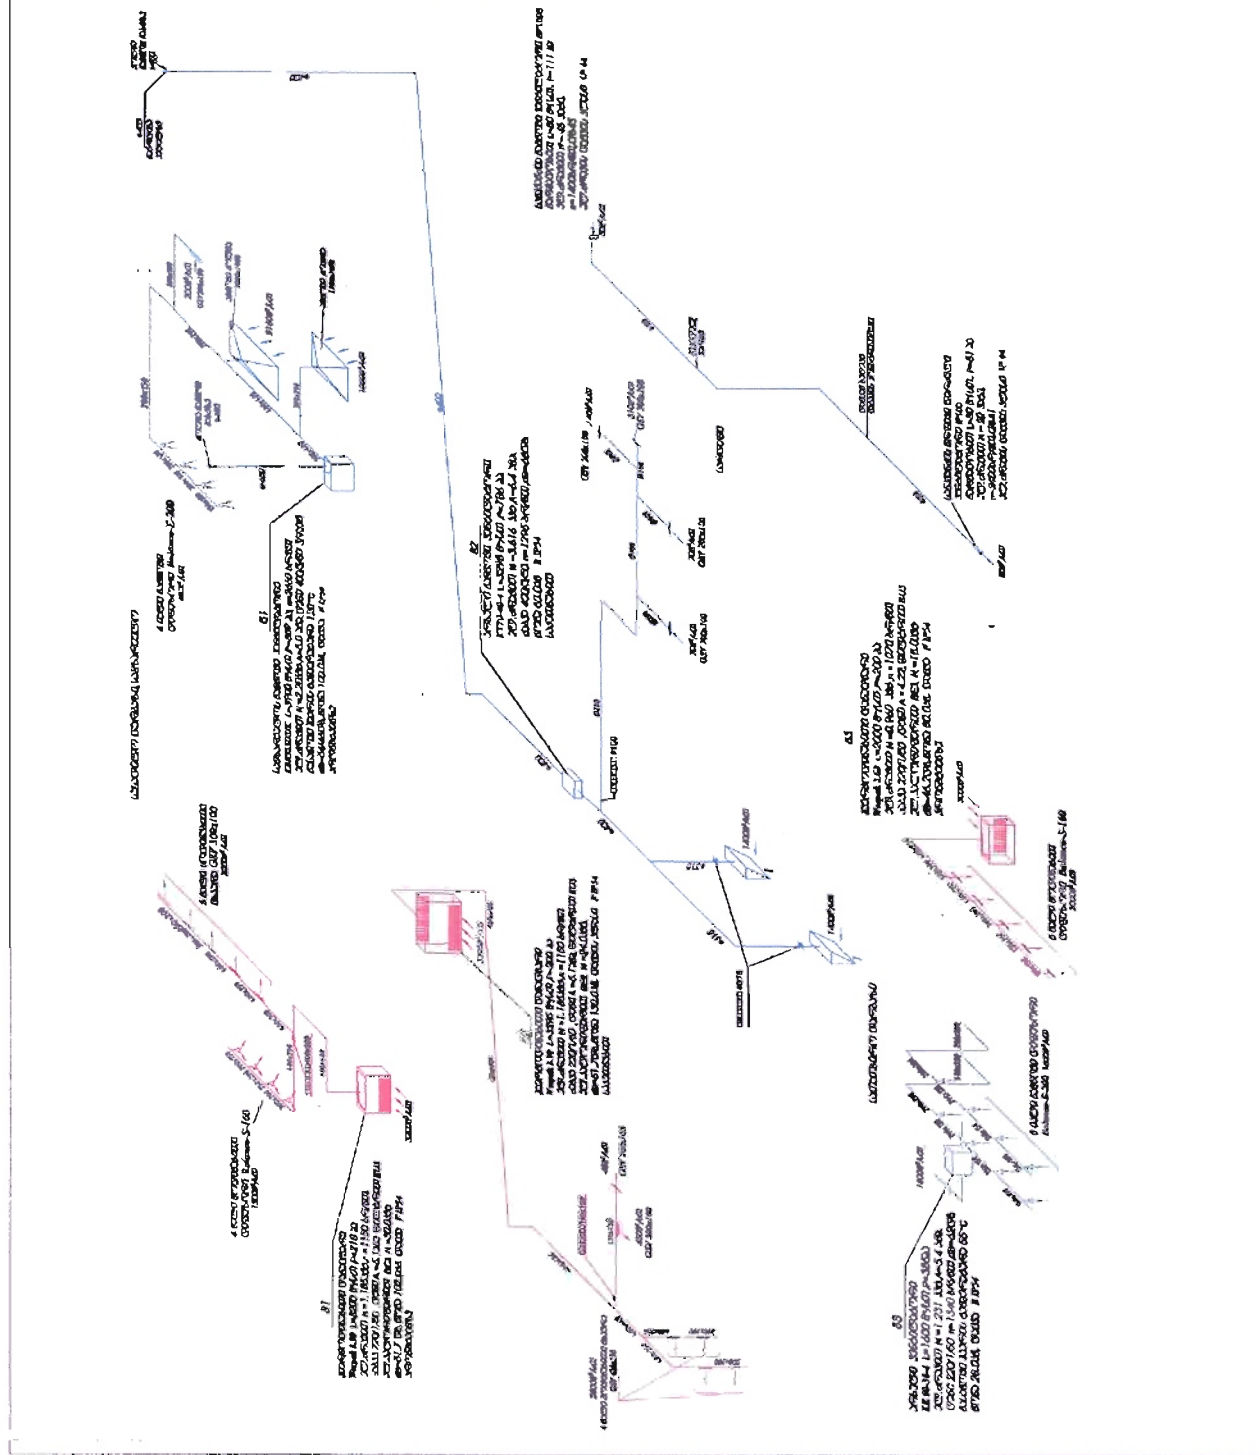


კიბის უჯრედში მოსაწყობი ლითონის გისოსები კარით

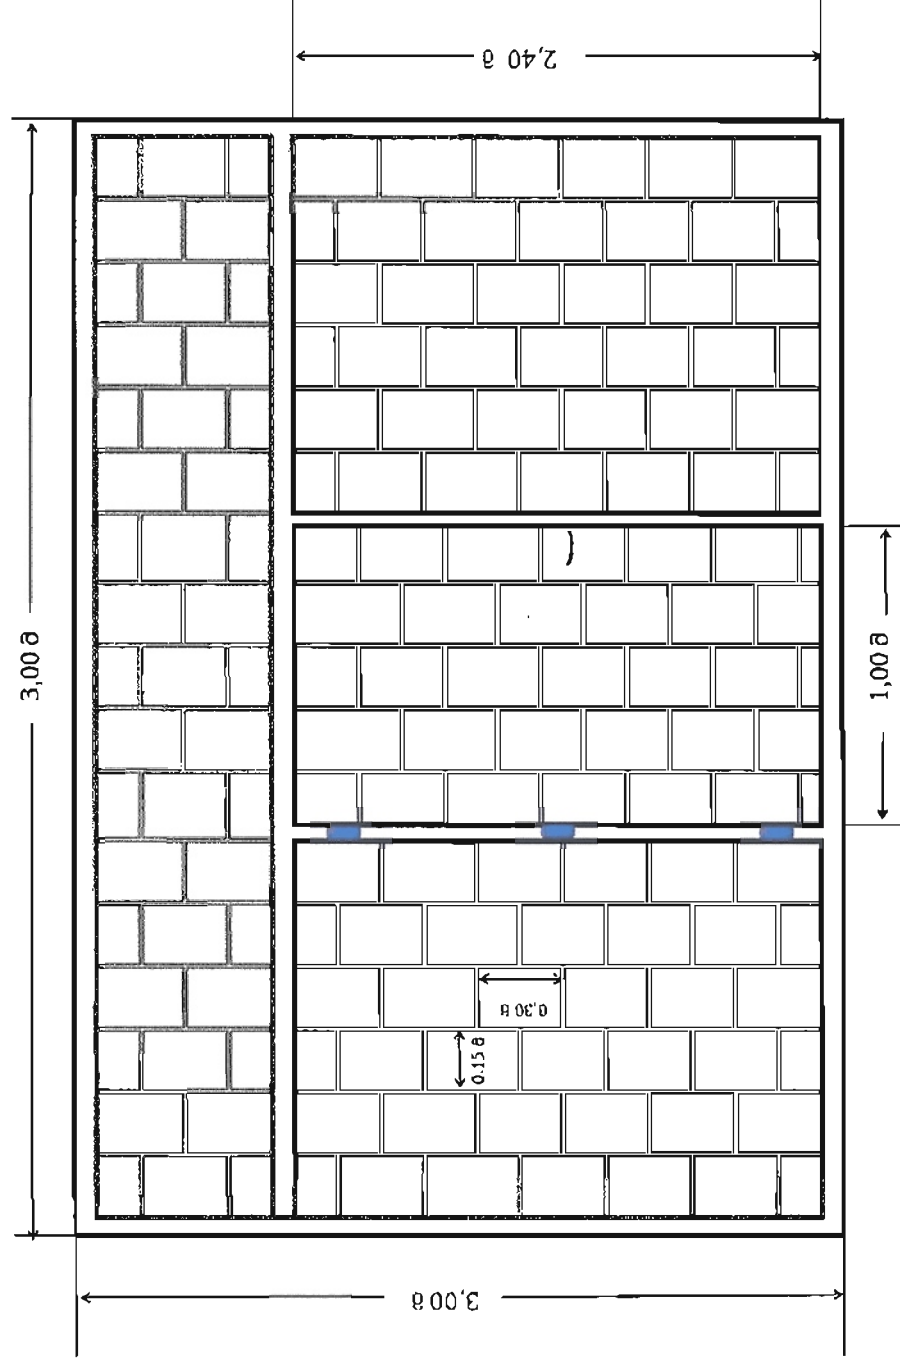

მილკვადრატი 40*40*0.02 მმ

მილკვადრატი 20*20*0.02 მმ

ლაშინატის სამზარეულოს კარადა

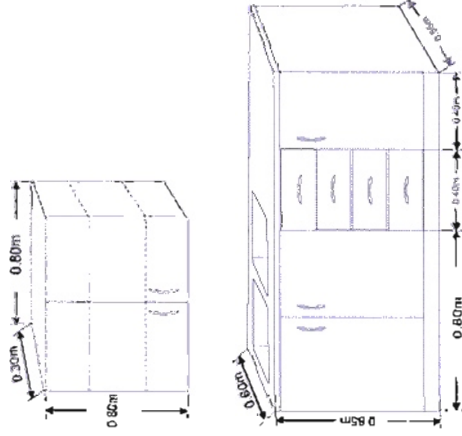

ლაშინატის კარადა შეტალოს სახელურებით

უფასევი ორგანეპილებანი ლითონის ნიჟარა სიფონით.

კანალიზაციის გოფირიებული მილი (არანაკლებ 1.0მ სიგრძის)

ჭურჭლის საწრეტი. შემრევი ონკანით.

ზედაპირი სპეკიალური პლასტიკტადაჭრული ჰმ-იანი სისქის დსპ.

ზედაპირის გვერდებში მოწყობილი სპეციალური ალუმინის ზოლოვანა

გერმეტიკის (სილიკონის) გამოყენებით.

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.



3.2 მოთხოვნები:

3.2.1 საგარანტიო ვადები: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან ბეტონის სამუშაოებზე არანაკლებ 5 (ხუთი) წელი, ხოლო სხვა დანარჩენზე - არანაკლებ 2 (ორი) წელი.

3.2.2 ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულების შესახებ:

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში (სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული „ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად), პრეტენდენტი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა „სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა სათანადო აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნით („სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ გარდა სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში, დასკვნას თან უნდა დაერთოს აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) ან აუდიტორული დასკვნით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებულ საბოლოო ფასად ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად შესრულების შესაძლებლობა

4. ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

2016 წ. _____

I. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2016 წლის _____, ერთის მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“, (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი — _____ სახით და მეორეს მხრივ შპს „_____“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის, წარმოდგენილი დირექტორის _____ სახით, რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები (CPV კოდი: 45400000; 45431000; 45432110; 45421143) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის (ხარჯთაღრიცხვა), დანართი №2-ის (ტექნიკური პირობა) და დანართი №3-ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები) შესაბამისად.

2.2. დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

III. სამუშაოს ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1. ხელშეკრულების საერთო თანხა განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის მიხედვით და შეადგენს _____ (—) ლარს დღგ-ს _____ (შემდგომში— „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება 3 (სამ) ეტაპად (ავანსად გაცემული თანხის გარდა), ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე „მიმწოდებლის“ მიერ სათანადო დოკუმენტაციის (თუ „მიმწოდებელი“ არის დღგ-ს გადამხდელი სათანადო ანფარიშფაქტურის) წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.3. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებლის“ მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა, „შემსყიდველი“ „მიმწოდებელს“ უხდის საავანსო თანხას („ხელშეკრულების ღირებულების“ არაუმეტეს 40%-ისა). „მიმწოდებლის“ მხრიდან შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის (საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკიდან) წარმოდგენის შემთხვევაში, საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით მეტი ვადით.

3.4. ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე პროპორციულად.

3.5. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

4.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ.

4.3. „მიმწოდებელი“ სამუშაოს ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. სამუშაოები უნდა შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ტექნიკური პირობების, ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები შესაბამისად.

4.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან დადებული ხელშეკრულების ასლები.

4.5. „მიმწოდებელი“ სამუშაოებს ასრულებს საკუთარ მასალით (მასალები უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ახალი) და იგი პასუხს აგებს მის ხარისხზე, გარდა „შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული მასალისა. (იხილეთ სამუშაოების ტექნიკური პირობა)

4.6 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან. „მიმწოდებელი“ სუბკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ისევე აგებს პასუხს როგორც საკუთარი ძალებით შესრულებულზე. სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას შესრულებული სამუშაოების ვადებზე ასევე ხარისხსა, წინამდებრე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან და დადგენილ ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობაზე „შემსყიდველის“ წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ „მიმწოდებელი“, მიუხედავად იმ გარემოებისა სამუშაოები აწარმოა თავისი საკუთარი ძალებით, თუ მესამე პირების - სუბკონტრაქტორების მეშვეობით.

4.7 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოების მიმდინარეობის და დასრულების შესახებ აცნობოს „შემსყიდველს“. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება საკუთარი ძალებით უზრუნველყოს ფარული სამუშაოების ჩვენება, მიუხედავად ფარული სამუშაოების შემდეგ განხორციელებული სამუშაოებისა, ამ ხელშეკრულების 11.4. პუნქტში მითითებული პირისათვის.

4.8. ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად და შემდგომ სამუშაოების შესრულების დროს „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაიცვას: საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“-ს მოთხოვნები, 2) საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“, 3) საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“, 4) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 4 ივლისის N 134 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 5) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მოთხოვნები, მათ შორის (და არა მხოლოდ):

ა) ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, პერსონალისა და ტექნიკის ცვლილების გათვალისწინებით) და დაშვების თარიღამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე, წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“ და მიაწოდოს ინფორმაცია თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) და მათი ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების მითითებით. (საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების 79-ე და 80-ე მუხლები და საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნა);

ბ) მაღლივ/სიმაღლეზე სამუშაოებზე, საცეცხლე, სამშენებლო, სადემონტაჟო, ელექტრულ, ეგზ-ების დაცვის ზონაში სამუშაოებზე, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე, ყველა სხვა სახის სამუშაოებში მონაწილე პირები და მთლიანობაში, ობიექტზე დაშვებული მივლინებული სამშენებლო-სამონტაჟო საწარმოს ყველა მუშაკი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

გ) „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია მის მიერ მივლინებული პერსონალისათვის მინიჭებული ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების და უფლებების შესაბამისობაზე კვალიფიკაციასთან, აგრეთვე პერსონალის მიერ მოქმედი წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე.

დ) „მიმწოდებლის“ მიერ მივლინებულ იმ პირებს, რომლებსაც შეიძლება მუშაობა მოუწიოთ მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, ელექტრულ/ელექტროდანადგარებთან, ეგზ-ების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში, თან უნდა ჰქონდეთ ზემოაღნიშნული წესების მიხედვით გათვალისწინებული, დადგენილი ფორმის მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები, რომელშიც იქნება ჩანაწერი ელექტროდანადგარებში, მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, სპეციალურ სამუშაოზე მუშაობის წესების და ნორმების ცოდნის შემოწმების გავლის, მათთვის მინიჭებული

შესაბამისი უფლების და.. ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფის შესახებ. არასათანადოდ გაფორმებული საკვალიფიკაციო მოწმობების, ცოდნის შემოწმების ვადაგადაცილების ან/და საკვალიფიკაციო მოწმობების არარსებობის შემთხვევაში „მიმწოდებლის“ მივლინებული შესაბამისი პერსონალი ობიექტზე არ დაიშვება, ხოლო ამ მიზეზით სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების ან საერთოდ შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

ე) ობიექტზე დაშვებისას „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა ვალდებულია თან იქონიოს აუცილებელი დამცავი საშუალებები (მათ შორის, დამცავი ჩაჩქანები, დამცავი ქამარი და დამზღვევი ბაგირი), რომელთა გარეშეც აღნიშნული პერსონალი არ დაიშვება ობიექტზე.

ვ) „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს განწესით ან/და განკარგულებით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №3-ში განსაზღვრული სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.

V. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

5.1 სახელშეკრულებო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა;

5.2 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

5.3 „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

VI. სამუშაოს შესრულების წესი

6.1 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც სამშენებლო ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

VII. ნორმატიული დოკუმენტები

7.1. მუშაობის პროცესში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ყველა მოქმედი ნორმებისა და წესების მიხედვით. აღნიშნული ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ან/ და მათი შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ შედეგზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება „მიმწოდებელს“.

VIII. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება 3 (სამი) ეტაპად (პირველი და მეორე ეტაპი განისაზღვრება არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით) ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

8.2 სამუშაოს დასრულებისთანავე „მიმწოდებელი“ ატყობინებს „შემსყიდველს“ სამუშაოს დასრულების შესახებ. შეტყობინების მიღების შემდეგ „შემსყიდველის“ სამუშაოთა მიმღები ჯგუფი ამოწმებს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან. ხარვეზების არ არსებობის შემთხვევაში „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე.

8.3 ხარვეზების აღმოჩენის (წუნდების) შემთხვევაში „შემსყიდველი“ ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს „მიმწოდებელს“ სათანადო ხარვეზების შესახებ (წუნდების არსი). „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან — (—) კალენდარული დღის განმავლობაში თავისი ხარჯებით აღმოფხვრას ხარვეზი.

IX. სამუშაოს შესრულების, გარანტიის ვადები და ადგილი

9.1 „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან — (—) კალენდარული დღეში, ვადად შესრულების უფლებით.

9.2 სამუშაოების უნდა ჩატარდეს შემდეგ მისამართებზე (სამუშაოების შესრულების ადგილი): ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქუჩა #2, „სსე“-ს სათაო ოფისი.

9.3 შესაბამისი ექსპლუატაციის პირობებში „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო მომსახურების ვადა არის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან — (—) წელს.

9.4 საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში თუ გამოვლინდება რაიმე ხარვეზი ან შეუსაბამობა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზი „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან — (—) კალენდარული დღის ვადაში.

X. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

10.1 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების გარანტია ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების ---%, რომელიც წარმოდგენილია „მიმწოდებლის“ მიერ გამოყენებული იქნება შემდეგ შემთხვევებში თუ:

ა) „მიმწოდებლის“ მხრიდან სამუშაოს შესრულების ვადა ირღვევა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღეზე მეტი ხნის ვადით.

ბ) „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ საბანკო გარანტიის საფუძველზე უპირობოდ და შეუქცევადად იღებს მთელ გარანტირებულ თანხას (ხელშეკრულების ღირებულების ---%).

10.3 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენება არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-XI მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებებისაგან.

XI. მხარეთა პასუხისმგებლობა

11.1 „მიმწოდებლის“ მიზენით სამუშაოს დაგვიანებით შესრულების, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, სამუშაოს სრულად და ჯეროვნად შესრულების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.2 ამ ხელშეკრულების 11.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო „მიმწოდებელს“ გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ არ გამოასწორებს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზს ამ ხელშეკრულებით საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორებისთვის დადგენილ ვადებში - შესატყვისი ვადის გასვლიდან ხარვეზის გამოსწორების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.3 „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

11.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

11.5 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა „მიმწოდებლისათვის“ გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ შეიძლება გახდეს „მიმწოდებლის“ მხრიდან „შემსყიდველისათვის“ 11.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

11.6 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობის სრულად არ შესყიდვის შემთხვევაში „შემსყიდველს“ პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.

XII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

12.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის მიზნით, გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

12.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

12.3 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან.

12.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან უზრუნველყოფს სსე-ის _____, 4.8 პუნქტის კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის -----

12.5 „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით ჩაატაროს თავის ან „შემსყიდველის“ მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

12.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის მიხედვით. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ასევე განხორციელდება სამუშაოს შესრულების ვადის დაცვის მონიტორინგით.

XIII. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა, ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ სათანადო ცნობას.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

IV. ურთიერთობა მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით.

14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

XV. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

15.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

15.2. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

15.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;

15.2.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

15.3 “შემსყიდველს” შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

15.3.1. თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

15.3.2. “მიმწოდებლის” გაკოტრების შემთხვევაში;

15.3.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.

15.3.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

15.4 ამ მუხლის 15.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” ვალდებულია აუწყოს “მიმწოდებელს” ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

15.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

XVI. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

16.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

16.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

XVII. დავათა განხილვა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხები

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

XVIII. ხელშეკრულების სხვა პირობები

18.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

18.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

18.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ უნდა მოხდეს მათი გამჟღავნება სხვა მხარისათვის, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

18.5 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

XIX. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეებს შორის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2016 წლის _____ ჩათვლით, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის ბოლომდე.

XX. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:

“მიმწოდებელი

ხელშეკრულების დანართი#1,
ხარჯთაღრიცხვა

ხელშეკრულების დანართი#2,
ტექნიკური პირობა

ხელშეკრულების დანართი#3

სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები

ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე) სათაო ოფისში
ჩასატარებელ სარემონტო სამუშაოებზე

1. სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და ასევე, შემდეგი ნორმატიული აქტების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით: 1) საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროლი

... ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 2) საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“; 3) საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“; 4) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“; 5) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 4 ივლისის N 134 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“;

2. ობიექტზე დაშვებისათვის და სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო ვალდებულია, განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, მუშაკების ცვლილების გათვალისწინებით) და სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე სსე–ს მიაწოდოს წერილობითი მონაცემები თითოეულ ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და დასრულების თარიღის მითითებით), აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) მითითებით;

3. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე მკაცრად ეკრძალებათ ნებისმიერი ზომისა და სახეობის ცივი, ცივბლასროლი (მათ შორის, გლუვკლუდიანი/საფანტის), გაზის, პნევმატური, სათამაშო/სასწავლო და სხვა სახის იარაღის, საბრძოლო მასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიშნების), ნებისმიერი სახეობისა და რაოდენობის ასაფეთქებელი, მომწამვლელი ან/და ადამიანებისა და გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებების, აგრეთვე, ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა;

4. ობიექტზე დაშვებისას ყველა მივლინებულმა პირმა/მუშაკმა სავალდებულოდ თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი და ობიექტზე შესვლამდე ჩააბაროს ობიექტის დაცვის მუშაკს, ხოლო ობიექტიდან გამოსვლისას გამოართვას უკან. აკრძალულია აგრეთვე, ობიექტზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების) მდგომარეობაში, ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ. ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნიდან ერთ-ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი შესაბამისი მივლინებული მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი ფინანსური, დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან/და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მივლინებული საწარმოს მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტის დაცვისათვის გადაცემულ სიაში;

5. ობიექტზე დაშვებული ყველა მივლინებული პირი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

6. პირი, რომელმაც მიიღო დადგენილი წესით თანხმობა ობიექტზე სამუშაოების შესრულებაზე, ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს კანონით დადგენილი და სსე–ს მიერ გაცემული ტექნიკური პირობების, წესების დაცვით, უზრუნველყოს ობიექტის შეუფერხებელი მუშაობა და უსაფრთხოება;

7. ელექტრულ და ყველა სხვა სპეციალური სახის სამუშაოებში მონაწილე პირებს გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ უსაფრთხოების II (მეორე) საკვალიფიკაციო ჯგუფი (ბრიგადის წევრებს), არანაკლებ უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი მეთვალყურეს. განკარგულებით ჩასატარებელი სამუშაოების შემთხვევაში სამუშაოთა მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ III (მესამე) ჯგუფი, ხოლო განწყისის შემთხვევაში – არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფი. სამუშაოთა ხელმძღვანელის დანიშვნის შემთხვევაში, მას უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფი;

8. იმ სამუშაოებში მონაწილე ბრიგადის წევრებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული ელექტრულ და ყველა სხვა სპეციალური სახის სამუშაოებთან, დასაშვებია ჰქონდეთ უსაფრთხოების I (პირველი) ჯგუფი;

9. მე-7 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მომუშავეებს უნდა გააჩნდეთ საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების N1 დანართით დადგენილი, მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები. მომუშავეები ვალდებული არიან აღნიშნული მოწმობები სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიონ თან;

10. სამუშაოებზე დაშვებამდე მივლინებულმა პირებმა უნდა გაიარონ შესავალი ინსტრუქტაჟი სს-ს სათაო ოფისში ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახურში, ხოლო პირველადი ინსტრუქტაჟი შრომის დაცვაში – სს-ს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამეურნეო სამსახურში, ინსტრუქტაჟის ჟურნალში შეტანით. პირველადი ინსტრუქტაჟი უნდა ჩატარდეს ადგილობრივ თავისებურებათა და გამოყოფილ უბანზე საშიში გარემოებების/ფაქტორების გათვალისწინებით;

11. ელექტრული და ყველა სხვა სპეციალური სახის სამუშაო უნდა შესრულდეს წერილობით განწყისის გაცემით, პასუხისმგებელი პირების დანიშვნით, უსაფრთხოების ყველა საჭირო ღონისძიების წინასწარი გატარებით; განწყისის გაცემის შემთხვევაში, სავალდებულო წესით უნდა დაინიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი და მეთვალყურე, სამუშაოები უნდა შესრულდეს სს-ს ყველა შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელობასთან წინასწარი შეთანხმებით. დაუშვებელია განწყისით დადგენილი ღონისძიებების თვითნებური შეცვლა, აგრეთვე განწყისით განსაზღვრული სამუშაო ადგილის და დავალების მოცულობის გაფართოება. აუცილებლობის შემთხვევაში, მოქმედი წესების დაცვით წინასწარ/თავიდან უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ყველა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიება;

12. სამუშაოებზე პირველად დაშვებას „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ასრულებს ენერგობიუტეტის პერსონალის წარმომადგენელი (დამშვები). დამშვები მიმავლინებელი საწარმოს სამუშაოს ხელმძღვანელის, სამუშაოს მწარმოებლის ან პასუხისმგებელი შემსრულებლის დაშვებას ახორციელებს უსაფრთხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად. მომდევნო დღეებში მომზადებულ სამუშაო ადგილზე განმეორებით დაშვებას დამშვების ნებართვით ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე), თუ მას ეს ევალება განწყისის “ცალკეული მითითებების” სტრიქონში ჩანაწერით. ყოველდღიურად ბრიგადის სამუშაოებზე დაშვება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე (მიზნობრივი) ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ, რომელიც ბრიგადის წევრებს უნდა ჩაუტარონ მივლინებული პირების მხრიდან გამოყოფილმა სამუშაოს ხელმძღვანელმა, სამუშაოს მწარმოებელმა და მეთვალყურემ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბრიგადის წევრებთან ინსტრუქტაჟის მკაფიოდ და სრულად ჩატარებაზე, აგრეთვე, მომზადებული სამუშაო ადგილის შესაბამისობაზე განწყისით/განკარგულებით განსაზღვრულთან და სამუშაოს შესრულების პირობებიდან გამომდინარე მათ მიერ განხორციელებულ უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებებზე; ასევე, აუცილებელი დამცავი საშუალებების ინვენტარის, ინსტრუმენტების და სამარჯვების არსებობაზე, გამართულობაზე და სწორად გამოყენებაზე; სამუშაო ადგილზე შემოღობვების, უსაფრთხოების პლაკატებისა და ნიშნების დაცულობაზე; სამუშაო ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო და ფეთქებადსაწინააღმდეგო წინასწარი ღონისძიებების გატარებაზე და მკაცრად დაცვაზე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და ბრიგადის წევრებისა და მათ მიერ მოქმედი წესების დაცვაზე; ბრიგადის წევრებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელებაზე;

13. სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს. ამასთან, მივლინებული პირები ვალდებული არიან მკაცრად დაიცვან სამუშაო ადგილებზე არსებული მოწყობილობა-დანადგარების, აპარატურის, კომპიუტერული და სხვა აღჭურვილობის მუშაობის დადგენილი რეჟიმები და თავიანთი ქმედებებით არ გამოიწვიონ რაიმე შეფერხებები;

14. მივლინებულმა პირებმა სამუშაოები უნდა ჩაატარონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი სათვალის, დამცავი ხელთათმანების და სხვა აუცილებელი დამცავი საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ/მოიტანონ მივლინებული საწარმოს მუშაკებმა, მათ თან უნდა ჰქონდეთ აგრეთვე, სხვა საჭირო საშუალებებიც (უსაფრთხოების ღობურები, პლაკატები, ნიშნები და სხვა);

15. მივლინებულმა პირებმა სამუშაო ადგილზე უნდა უზრუნველყონ საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. სამუშაოების წარმოების დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად ალეხადი ნივთიერებების გამოყენება. სამუშაოების

მიმდინარეობისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქება და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები. მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე ეკრძალებათ თამბაქოს მოწევა, გარდა სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;

16. მასალები უნდა დასაწყობდეს სსე-ს სათაო ოფისის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ წინასწარ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნულ სამუშაოზე გამოყენებული უნდა იქნას ყველა აუცილებელი დამცავი საშუალება;

17. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს (შესვენება სადილზე, მუშაობის პირობებით გამოწვეული შესვენება და სხვა) ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად. სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობისას, შესვენებისას და დამთავრებისას ბრიგადის წევრებს, სამუშაოს ხელმძღვანელს, სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) ეკრძალებათ მათთვის გამოყოფილი სამუშაო ადგილის/სივრცის გარეთ თვითნებურად გასვლა;

18. სამუშაო დღის დამთავრებით გამოწვეული სამუშაოს შეწყვეტის დროს ბრიგადა უნდა გავიდეს სამუშაო ადგილიდან. უსაფრთხოების პლაკატები, დროებითი შემოღობვები არ იხსნება. სამუშაოს დროებით შეწყვეტას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) აფორმებს განწესის თავის ეგზემპლარში ხელის მოწერით. მომდევნო დღეებში სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა მხოლოდ დამშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის “ცალკეული მითითებების” სტრიქონში ჩანაწერით. მეორე დღეს მუშაობის განახლებისას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) უნდა დარწმუნდეს დატოვებული უსაფრთხოების პლაკატების, დროებითი შემოღობვების, დამცავი ბადეების სიმართლესა და ხელუხლებლობაში, ასევე მომუშავეთათვის აუცილებელი ყველა სახის დამცავი აღჭურვილობის არსებობაში/გამართულობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვას ბრიგადა სამუშაოდ;

19. ელექტრო და სხვა სპეციალური სამუშაოს სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოს მწარმოებელმა (მეთვალყურემ) უნდა გაიყვანოს ბრიგადა სამუშაო ადგილიდან, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები, უსაფრთხოების გადასატანი პლაკატები და განწესში გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება ხელის მოწერით. სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) გაფორმებულ განწესს აბარებს სსე-ს მხრიდან გამოყოფილ შესაბამის მუშაკს.

5. დანართი N 1, ხარჯთაღრიცხვის ფორმა

„სსე“-ს სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების განსახოცილებლად.

სატენდერო წინადადების ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს გარეშე.
სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა ითვალისწინებდეს ყველა ხარჯს.

პრეტენდენტის დასახელება _____

#	ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება (შემენა-მონტაჟი)	განზ. ერთეული	მოცულობა ან რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ჯამური ღირებულება (ლარი)
I სართული					
დაცვის ოთახი					
1	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ ²	23		
2	ბლოკის კედლების დემონტაჟი	მ ²	8		
3	გადახურვის ფილის დემონტაჟი	მ ²	2		
4	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ ²	6		
5	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ ²	2		
6	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ ²	2		
7	კედლებიდან არსებული ნაღესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ ²	6		
8	ხელსაზანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	1		
9	არსებული გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
10	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის დემონტაჟი	ც	2		
11	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	6		
12	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ ²	2		
13	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა მსმ-იანი პლინტუსებით მოჭიმულ ქვიშა- ცემენტის იატაკზე	მ ²	9		
14	კაფელის ფილების მოწყობა	მ ²	2.5		
15	ტიხრის მოწყობა მუყაო-თაბაშირის ფილებით, ფოლგირებული თბოიზოლაციით	მ ²	12.5		
16	ტიხრის კარკასის გასამაგრებლად ლითონის მილ-კვადრატის გამოყენება (80X80მმ)	გრძ.მ	4.5		
17	თაბაშირ-მუყაოს ტიხარში მ.დ.ფ-ის კარების ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით (2,10X0,90)- იც	მ ²	1.89		
18	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ ²	17		
19	ალუმინის ზოლოვანა	გრძ.მ	1.8		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

20	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	70		
21	ამსტრონგის ფილების შეცვლა კორიდორში დემონტირებული ფილებით	მ²	25		
22	ამსტრონგის შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი სანათები 4X18-ზე ნათურით 18W/840	ც	1		
23	ჰერგამწოვი ვენტილატორის (არანაკლებ დ-30სმ) მოწყობა ლითონის ფრთებით და 24 სათიანი მუშაობის რეჟიმით კედელში ღიობის გამონგრევით და შელესვით	ც	2		
24	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	1		
25	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	50		
26	როზეტი დამიწებით	ც	6		
27	ჩამრთველები ერთ კლავიშიანი	ც	1		
28	ლამინატის კარადა მეტალის სახელოურებით, უჟანგავი ლითონის ორგანოფილებიანი ნიჟარა სიფონით, კანალიზაციის გოფრირებული მილით (არანაკლებ 1.0 მ სიგრძის), ჭურჭლის საწრეტით, შემრევი ონკანით, ზედაპირი სპეციალური პლასტიკატგადაკრული 3 სმ-იანი სისქის დ.ს.პ. (სტალიჩნიცა). ზედაპირის გვერდებში მოეწყოს სპეციალური ალუმინის ზოლოვანა გერმეტიკის (სილიკონის) გამოყენებით. (ნახაზის მიხედვით)	კომპ	1		
ცენტრალური შემოსასვლელი					
1	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	160		
2	არსებული კერამო-გრანიტის ფილის დემონტაჟი (იატაკის სხვადასხვა უბანზე)	მ²	50		
3	ახალი კერამო-გრანიტის ფილის მონტაჟი (იატაკის სხვადასხვა უბანზე)	მ²	50		
4	ამსტრონგის ფილების დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	მ²	92		
მძღოლების ოთახი					
1	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ²	27		
2	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	5		
3	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	1		
4	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ²	27		
5	ალუმინის ზოლოვანა	გრძ.მ	0.9		
6	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	5		
7	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	70		
8	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9-ვატიანი	ც	2		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

9	ხელსაზანი ნიჟარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებელი მასალით)	ც	1		
10	ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	6.6		
11	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	1		
12	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 21ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 1ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 1ც (მაკომპლექტებელი მასალით)	კომპ.	1		
13	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	1		
II სართული					
კორიდორი					
1	ლამინირებული იატაკის არსებული გადასაბმელი ზოლის დემონტაჟი	გრძ/მ	58		
2	პლინტუსების დემონტაჟი	გრძ/მ	192		
3	დაზიანებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ²	150		
4	VI სართულზე დემონტაჟის შედეგად მიღებული ვარგისი ლამინირებული იატაკის მონტაჟი	მ²	150		
5	ლამინირებული იატაკის ახალი გადასაბმელი ზოლის მონტაჟი (კორიდორში და მ.დ.ფ-ის კარებების ძირზე)	გრძ/მ	58		
6	პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსის მოწყობა შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	გრძ-მ	192		
8	სამზარეულოს შესასვლელში არსებული დაზიანებული ორ ფრთიანი მ.დ.ფ-ის კარის დემონტაჟი და ახალი ორ ფრთიანი მ.დ.ფ-ის კარის მოწყობა 2.10X1.80-1ც	მ²	3.78		
9	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	620		
ოთახები					
1	არსებული ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის დემონტაჟი (2.00X2.60)-12ც	ც	12		
2	ახალი ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	64.8		
3	კარების ჩარჩოს გამაგრება დუბელ-შურუფებით და სამშენებლო ქაფით	ც	4		
4	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	20		
5	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	200		
6	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილზე ლითონის ფურცლების დემონტაჟი	მ²	4.2		

7	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილის გადაღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	4.2		
8	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების მოწყობა ახალი ლითონის მოთუთიებული ფურცლით	მ²	4.5		
სანიტარული კვანძი (ქალები)					
1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	21.5		
2	მეტალბის ფილების დემონტაჟი	მ²	21.5		
3	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	21.5		
4	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	60		
5	კედლებიდან არსებული ნაღესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ²	60		
6	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	2		
7	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
8	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი (0.90X2.00მ) - 2ც	ც	2		
9	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	30		
10	არსებული წყლის გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
11	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	7		
12	არსებულ მეტალო-პლასტმასის ფანჯარაში პლასტმასის პროფილის მოწყობა (0.57X1.15მ) - 1ც (0.30X0.45მ) - 1ც	მ²	0.8		
13	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ-მ	20		
14	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	10		
15	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრძ.მ	6		
16	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1		
17	მეტალო პლასტმასის კარების მოწყობა ფურნიტურით (0.90X2.00მ) - 2ც კარები უნდა იყოს ორ განყოფილებიანი პირველ ნაწილში განთავსდება მეტალო პლასტმასის პროფილი ხოლო მეორე მცირე ნაწილში ალუმინის მათეულ ბადე.	მ²	3.6		
18	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	60		
19	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	60		
20	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	21.5		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

21	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	21.5		
22	ჰაერგამწოვისათვის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	12		
23	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	2		
24	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი L=50 მ3/სთ; P=51პა ელ. ძრავით N=20 ვტ; n=2400ბრ/წთ; dB=415 დბ; დაცვის კლასი 1P44	ც	1		
25	ასალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა შესაბამისი კონსტრუქციით	მ²	21.5		
26	ხელსაბანი ნიჟარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
27	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
28	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2		
29	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
30	ონკანი	ც	1		
31	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
32	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
33	ვენტილი	ც	8		
34	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	3		
35	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	50		
36	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზეარ ანაკლებ 9-ვატიანი შეძენა-მონტაჟი (არსებულის ანალოგიური)	ც	2		
37	როზეტი დამიწებით	ც	2		
38	ჩამრთველები ერთ კლავიშიანი	ც	3		
საინტარული კვანძი (კაცები)					
1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	21		
2	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	21		
3	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	21		
4	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	55		
5	კედლებიდან არსებული ნალესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ²	55		
6	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	3		
7	პისუარის დემონტაჟი	ც	1		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

8	ხელსაზანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
9	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი	ც	1		
10	ამორტიზირებული მეტალო პლასტმასის ტიხრის დემონტაჟი კარებებით 3-ც	მ²	16		
11	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	30		
12	არსებული წყლის გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
13	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	12		
14	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	20		
15	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	10		
16	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	4		
17	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
18	მეტალო პლასტმასის კარების მოწყობა ფურნიტურით (0.75X2.20მ) - 1ც	მ²	1.65		
19	მეტალო პლასტმასის კაბინების მოწყობა ყრუ მეტალო-პლასტმასის კარებით 3 ც ფურნიტურით	მ²	16		
20	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	55		
21	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	55		
22	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	21		
23	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	21		
24	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი	ც	3		
25	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა შესაბამისი კონსტრუქციით	მ²	21		
26	ხელსაზანი ნიჟარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
27	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	3		
28	დემონტირებული პისუარის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1		
29	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	3		
30	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
31	ონკანი	ც	1		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

32	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნეთხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 3ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
33	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
34	ვენტილი	ც	10		
35	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	3		
36	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ2	გრძ.მ	50		
37	როზეტი დამიწებით	ც	2		
38	ჩამრთველები ერთ კლავიშოანი	ც	2		
39	არსებული ლითონის გისოსების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	9		
III სართული					
კორიდორი					
1	ლამინირებული იატაკის არსებული გადასაბმელი ზოლის დემონტაჟი	გრძ/მ	60		
2	პლინტუსების დემონტაჟი	გრძ/მ	191		
3	დაზიანებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	მ²	100		
4	VI სართულებზე დემონტაჟის შედეგად მიღებული ვარგისი ლამინირებული იატაკის მონტაჟი	მ²	100		
5	ლამინირებული იატაკის ახალი გადასაბმელი ზოლის მონტაჟი (კორიდორში და მ.დ.ფ-ის კარებების ძირზე)	გრძ/მ	60		
6	პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსის მოწყობა შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	გრძ-მ	191		
ოთახები					
1	არსებული ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის დემონტაჟი (2.00X2.60)-20ც	ც	20		
2	ახალი ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	108		
3	ალუმინის ვიტრაჟის შერემონტება (საჭიროების შემთხვევაში მექანიზმის გამოცვლა)	ც	3		
4	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილზე ლითონის ფურცლების დემონტაჟი	მ²	0.9		
5	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილის გადალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	0.9		
6	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების მოწყობა ახალი ლითონის ფურცლით	მ²	1.1		

სანიტარული კვანძი (ქალები)				
1	არსებული კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	4	
2	კაფელის ფილის მოწყობა არსებული კაფელის შესაბამისი ფერის და ფაქტურის	მ²	4	
3	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი და მონტაჟი კარკასის გამაგრებით. პროფილების დამატებით	მ²	20	
4	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	7	
5	არსებულ მეტალო პლასტმასის კარებში პლასტმასის პროფილის და ალუმინის მათულ ზადის მოწყობა ალუმინის გამყოფი ზოლით (0.90X2.0მ) - 2ც	მ²	3.6	
6	ჰაერგამწოვისათვის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	10	
7	ჰაერგამწოვი L=50 მ3/სთ; P=513ა ელ. ძრავით N=20 ვტ; n=2400ბრ/წთ; dB=415 დბ; დაცვის კლასი IP44	ც	1	
8	არსებულ მეტალო-პლასტმასის ფანჯარაში პლასტმასის პროფილის მოწყობა (0.63X1,65მ) - 1ც	მ²	1	
9	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2	
10	ონკანი	ც	1	
11	ვენტილი	ც	5	
12	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2	
13	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1	
14	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	2	
15	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნ-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2	
16	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზეარ ანაკლებ 9-ვატიანი (არსებულის ანალოგიური)	ც	2	
17	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	1	
18	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	20	
19	კაბელკანალი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	2	
20	როზეტი დამიწებით	ც	2	
21	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	3	

22	მ.დ.ფ-ის კარის ჰიდრავლიკური საკეტი	ც	1		
23	არსებულ მ.დ.ფ-ის კარებში საკეტის და სახელურის შეცვლა ახლით	ც	1		
სანიტარული კვანძი (კაფები)					
1	არსებული კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	4		
2	კაფელის ფილის მოწყობა არსებული კაფელის შესაბამისი ფერის და ფაქტურის	მ²	4		
3	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი და მონტაჟი კარკასის გამაგრებით. პროფილების დამატებით	მ²	22		
4	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	8		
5	საკანალიზაციო მილის შეფუთვა პლასტმასის პროფილებით	მ²	2.4		
6	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალებით)	გრძ.მ	1		
7	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
8	ონკანი	ც	1		
9	ვენტილი	ც	6		
10	არსებული პისუარის დემონტაჟი და ახლის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალებით)	ც	1		
11	უნიტაზის ჩამრეცი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2		
12	ჰერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	1		
13	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნეთხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის საბურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალებით)	კომპ.	2		
14	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
15	მ.დ.ფ-ის კარის ჰიდრავლიკური საკეტი	ც	1		
16	არსებულ მ.დ.ფ-ის კარებში საკეტის და სახელურის შეცვლა ახლით	ც	1		
17	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	10		
18	კაბელკანალი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	2		
19	როზეტი დამიწებით	ც	2		
20	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1		
IV სართული					
კორიდორი					
1	არსებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი პლინტუსით და ალუმინის გადასაბმელი ზოლებით	მ²	355		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

2	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ²	355		
3	ოთახებში შესასვლელ კარებებში ალუმინის ზოლოვანას ან კუთხოვანების მოწყობა	გრძ.მ	40		
4	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	572		
ოთახები					
1	არსებული ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის დემონტაჟი (2.00X2.60)-12ც	ც	12		
2	ახალი ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	64.8		
3	ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზების მოწყობა (სათათბირო ოთახში)	მ²	23		
4	მუყაო-თაბაშირის ფილებით კედლების შემოსვა	მ²	12		
5	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილზე ლითონის ფურცლების დემონტაჟი (ქალების სველი წერტილი)	მ²	0.9		
6	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების გადაღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ქალების სველი წერტილი)	მ²	0.9		
7	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების მოწყობა ახალი ლითონის ფურცლით (ქალების სველი წერტილი)	მ²	1.1		
8	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	50		
სანიტარული კვანძი (კაცები)					
1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	20		
2	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	7		
3	არსებული გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
4	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	2		
5	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
6	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი	ც	2		
7	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	20		
8	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	20		
9	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	4		
10	ტრაპის მოწყობა (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1		
11	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	20		
12	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	28		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

13	ჰაერგამწოვისათვის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	12		
14	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა შესაბამისი კონსტრუქციით	მ²	20		
15	მეტალო პლასტმასის კარების მოწყობა ფურნიტურით (0.75X1,95მ) - 2ც კარები უნდა იყოს ორ განყოფილებიანი პირველ ნაწილში განთავსდება მეტალო პლასტმასის პროფილი ხოლო მეორე მცირე ნაწილში ალუმინის მავთულ ბადე.	მ²	2.92		
16	არსებულ მეტალო-პლასტმასის ფანჯარაში პლასტმასის პროფილის მოწყობა (0.63X1,65მ) - 1ც	მ²	1		
17	ხელსაბანი ნიჟარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
18	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
19	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
20	ონკანი	ც	1		
21	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2		
22	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
23	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
24	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	2		
25	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი L=50 მ3/სთ; P=513ა ელ. ძრავით N=20 ვტ; n=2400ბრ/წთ; dB=415 დბ; დაცვის კლასი IP44	ც	1		
26	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზეარ ანაკლებ 9-ვატიანი (არსებულის ანალოგიური)	ც	2		
27	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	2		
28	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ2	გრძ.მ	20		
29	კაბელკანალი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	3		
30	როზეტი დამიწებით	ც	2		
31	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	3		
32	ვენტილი	ც	4		
სანიტარული კვანძი (ქალები)					

1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი და მონტაჟი კარკასის გამაგრებით. პროფილების დამატებით	მ²	7.7		
2	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	4		
3	არსებული გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
4	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	3		
5	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
6	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი (0.93X1,95მ) - 1ც	ც	1		
7	ამორტიზირებული მეტალო პლასტმასის ტიხრის დემონტაჟი კარებებით (1.30X1,80მ) - 3ც	მ²	7		
8	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	23.1		
9	კედლებიდან არსებული ნაღესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ²	23.1		
10	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	21.4		
11	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	21.4		
12	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	7		
13	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ-მ	10		
14	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	5		
15	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	10		
16	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
17	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	23.1		
18	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	31		
19	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	21.4		
20	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	21.4		
21	მიდა მეტალო პლასტმასის მინიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით (0.93X1,95მ) - 1ც.	ც	1.81		
22	დემონტირებული ხელსაბანი ნიჟარის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
23	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	3		
24	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
25	ონკანი	ც	1		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

26	უნიტაჟის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	3		
27	ელექტრო ხელის სამუშაო სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
28	ვენტილი	ც	7		
29	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაჟის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
30	მეტალო პლასტმასის კაბინების მოწყობა ყრუ მეტალო-პლასტმასის კარებით (1.30X2.00მ) - 3ც ფურნიტურით	მ²	7.8		
31	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	1		
32	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	20		
33	ჰერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	1		
34	როზეტი დამიწებით	ც	2		
35	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1		
VI სართული					
კორიდორი					
1	არსებული ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი პლინტუსით და ალუმინის გადასაბმელი ზოლოვანებით	მ²	244		
2	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ²	244		
3	ოთახებში შესასვლელ კარებებში ალუმინის ზოლოვანას ან კუთხოვანების მოწყობა	გრძ/მ	35		
4	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	390		
612 და 604 ოთახების სარემონტო და სამღებრო სამუშაოები					
1	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	127		
2	ამსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60	მ²	80		
3	არსებულ ხის იატაკზე (პარკეტი) ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსებით შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	მ²	80		
4	არსებული ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	7		

5	ლუმინისცენტური დღის განათების სანათები 4X18 (ამსტრონგის ჭერში ჩასასმელი) ნათურით 18W/840	ც	14		
6	არსებული ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის დემონტაჟი (2.00X2.60)-2ც	ც	2		
7	ახალი ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი	მ²	13		
ოთახები					
1	ფანჯრებზე ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის დემონტაჟი (2.00X2.60)-17ც	ც	17		
2	ფანჯრებზე ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზის მოწყობა	მ²	90		
3	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების ადგილზე ლითონის ფურცლების დემონტაჟი.	მ²	7.2		
4	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების გადაღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	7.2		
5	შენობის ფასადზე ფანჯრის გასწვრივ საცრემლეების მოწყობა ახალი ლითონის ფურცლით	მ²	7.5		
6	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	50		
7	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი (დამლაგებლის ოთახი)	მ²	39		
8	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა (დამლაგებლის ოთახი)	მ²	39		
9	არსებული სანათების დემონტაჟი (დამლაგების ოთახში)	ც	18		
10	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9-ვატიანი (სადისპერსიის სველი წერტილი 4ც; სადისპერსიის სამზარეულო 5ც დამლაგებლის ოთახში-9ც)	ც	18		
სანიტარული კვანძი (კაფეზი)					
1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	22.1		
2	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	12		
3	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
4	არსებული გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
5	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	2		
6	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი	ც	1		
7	ამორტიზირებული მეტალო პლასტმასის ტიხრის დემონტაჟი კარებებით 2-ც	მ²	12		
8	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	57		
9	კედლებიდან არსებული ნალესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ²	57		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

10	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	22.2		
11	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	22.2		
12	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	12		
13	ლიობის გამონგრევა კედელში ვენტილატორისათვის	წერტ.	3		
14	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	20		
15	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	7		
16	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	12		
17	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
18	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	57		
19	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	22.2		
20	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	57		
21	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	22.2		
22	შიდა მეტალო პლასტმასის მინიანი კარის ბლოკის მოწყობა ფურნიტურით (0.90X2.20მ) - 1ც.	ც	1.98		
23	ახალი პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა შესაბამისი კონსტრუქციით	მ²	21.1		
24	ხელსაბანი ნიჟარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
25	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
26	უნიტაზის შეძენა-მონტაჟი ჩამრეცხი მექანიზმით და პლასტმასის სახურავით (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1		
27	პისუარის შეძენა-მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	1		
28	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2		
29	ტუალეტის ქადალდის ჩასადები იხ. სურათი	ც	1		
30	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
31	ონკანი	ც	1		

32	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
33	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
34	მეტალო პლასტმასის კაბინების მოწყობა ყრუ მეტალო-პლასტმასის კარებით 3ც ფურნიტურით	მ²	14.6		
35	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	3		
36	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	3		
37	ელ სადენი სპილენძის მარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	30		
38	როზეტი დამიწებით	ც	3		
39	ჩამრთველები ერთ კლავიშიანი	ც	1		
40	ვენტილი	ც	9		
სანიტარული კვანძი (ქალები)					
1	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ²	19.3		
2	არსებული ლედ სანათის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	10		
3	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის დემონტაჟი	ც	1		
4	არსებული გამაცხელებელი ბაკის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	1		
5	უნიტაზის დემონტაჟი	ც	2		
6	ხელსაბანი ნიჟარის დემონტაჟი	ც	2		
7	მეტალო პლასტმასის კარების დემონტაჟი	ც	1		
8	ამორტიზირებული მეტალო პლასტმასის ტიხრის დემონტაჟი კარებებით 2-ც	მ²	10		
9	კაფელის ფილების დემონტაჟი	მ²	52.4		
10	კედლებიდან არსებული ნაღესის ჩამოყრა, გასუფთავება.	მ²	52.4		
11	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	19.3		
12	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	19.3		
13	საკანალიზაციო და წყალსადენი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	9		
14	წყლის მილსადენის მონტაჟი დ-20 მმ (მაკომპლექტებული მასალებით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	7		
15	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით) დაერთებით არსებულ ქსელზე	გრძ.მ	7		
16	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-50მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	6		
17	ტრაპის მოწყობა და დაერთება კანალიზაციის მილზე (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		

18	3 კამერიანი, თეთრი ფერის მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი ორმაგი მინით, ფურნიტურით, (1,80X2.60)-1ც თავისი ფერდობის შეღესვით გარედან	მ²	4.7		
19	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	52.4		
20	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	მ²	19.3		
21	კაფელის ფილების მოწყობა	მ²	52.4		
22	მეტლახის ფილების მოწყობა მოჭიმულ ქვიშა-ცემენტის იატაკზე	მ²	19.3		
23	ახალი პლასტმასის შევიდული ჭერის მოწყობა შესაბამისი კონსტრუქციით	მ²	19.3		
24	ჰაერგამწოვისათვის პლასტმასის მილის მონტაჟი დ-100მმ (მაკომპლექტებული მასალით)	გრძ.მ	12		
25	დემონტირებული ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
26	დემონტირებული უნიტაზის მონტაჟი (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
27	უნიტაზის შეძენა-მონტაჟი ჩამრეცხი მექანიზმით და პლასტმასის სახურავით (მაკომპლექტებული მასალით)	ც	2		
28	უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	2		
29	ტუალეტის ქაღალდის ჩასადები) იხ. სურათი	ც	2		
30	ფურნიტურა სველი წერტილისათვის (სარკე (0.40X0.50მ) - 2ც, პლასტმასის სასაპნე-თხევადი საპნისათვის 350-500გრ- 2ც უნიტაზის პლასტმასის სახურავი უნივერსალური - 2ც (მაკომპლექტებული მასალით)	კომპ.	2		
31	ონკანი	ც	1		
32	წყლის შემრევი ონკანი	ც	2		
33	ელექტრო ხელის საშრობი სენსორებზე არანაკლებ 1300-1500 ვტ შეძენა-მონტაჟი	ც	1		
34	მეტალო პლასტმასის კაბინების მოწყობა ყრუ მეტალო-პლასტმასის კარებით 4ც ფურნიტურით	მ²	18		
35	ჰაერგამწოვი ვენტილატორის შეძენა-მონტაჟი (შესაბამისი სიმძლავრის და დიამეტრის).	ც	4		
36	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	3		
37	ელ სადენი სპილენძის ძარღვით 3X2.5მმ²	გრძ.მ	20		
38	როზეტი დამიწებით	ც	2		
39	ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი	ც	1		
40	ვენტილი	ც	9		

კიბის უჯრედი					
1	სანიტარული კვანძების არსებული მ.დ.ფ.-ის კარებების დემონტაჟი	ც	6		
2	სანიტარული კვანძებში ნესტგამძლე მდფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტიტ,ფურნიტურით 6-ცალი	მ²	15		
3	კიბის უჯრედში ნესტგამძლე მდფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა საკეტიტ,ფურნიტურით (2.20X0.70მ) - 3-ც	მ²	4.62		
4	მ.დ.ფ-ის და ალუმინის კარის ჰიდრაულიკური საკეტი	ც	14		
5	კორიდორში კიბის უჯრედებთან არსებული ალუმინის კარებების დემონტაჟი	ც	7		
6	კორიდორში კიბის უჯრედებთან ორ ფრთიანი ალუმინის კარების ბლოკის მოწყობა მინა-პაკეტიტ 2.20X2.0მ-7ც თავის ფერდობის შელესვით ორივე მხრიდან) (კარები უნდა იღებოდეს კიბის უჯრედის მხარეს)	მ²	30.7		
7	ალუმინის კარის ფიქსატორი	ც	8		
8	შტრაბების გაჭრა ელ. სადენისთვის	გრძ.მ	50		
9	კიბის უჯრედის ბაქნებზე ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი (თავისი პლინტუსებით)	მ²	70		
10	კიბის უჯრედში არსებული გათბობის მილების შეფუთვა ნესტგამძლე მუყაო-თაბაშირის ფილებით	მ²	25		
11	არსებული სახანძრო დ-51მმ-იანი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	56		
12	არსებული სანათების დემონტაჟი	ც	26		
13	ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 24-ვატიანი ჭერზე მისამაგრებელი კიბის უჯრედში 30X30 სმ	ც	56		
14	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ² (განათებისთვის)	გრძ.მ	80		
15	კაბელ კანალი შესაბამისი ზომის	გრძ.მ	80		
16	IV სართულზე დემონტაჟის შედეგად მიღებული ვარგისი ლამინირებული იატაკის მონტაჟი კიბის უჯრედის ბაქნებზე	მ²	133		
17	პლასტმასის არანაკლებ 6მმ-იანი პლინტუსის მოწყობა შესაბამისი ფერის (ფიტინგებით)	გრძ.მ	134		
18	კიბის საფეხურებზე ხალიჩის მოწყობა არანაკლებ 8მმ-იანი 1.50X0.32მ-129ც	მ²	62		
19	კიბის საფეხურებზე სპეციალური ალუმინის პროფილებით მოწყობა (საფეხურების სამ გვერდზე)	გრძ.მ	436		
20	გადახურვის ფილაზე ღიობის გაჭრა სახანძრო მილისათვის	წერტი.	10		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

21	ლითონის დ-51მმ-იანი მილის მონტაჟი დაერთებით არსებულ წყალსადენის მილზე მაკომპლექტებელი მასალებით	გრძ-მ	120		
22	ლითონის დ-51-მმ-იან მილზე სახანძრო გიდრანტის მოწყობა მაკომპლექტებელი მასალებით (ლულა)	კომპ.	6		
23	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	1480		
24	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების დარეგულირება	ც	70		
25	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებზე მექანიზმის გამოცვლა	ც	10		
26	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრებზე სახელურების გამოცვლა	ც	70		
27	არსებულ ლითონის კარებზე ძველი საკეტის სახელურით დემონტაჟი და ახლის მოწყობა	კომპ.	9		
28	შახტის ბაქანზე ლითონის 12სმ-იანი შველერის მოწყობა (შველერი უნდა შევიდეს კედელში ორივე მხარეს არანაკლებ 10სმ-ის)	გრძ.მ	18		
29	შახტის ბაქანზე ლითონის 12მმ-იანი არმატურის ბადის მოწყობა ბიჯით 20*20სმ ორივე მიმართულებით	მ²	3.6		
30	შახტის ბაქანზე ლითონის კონსტრუქციაზე და ღიობებში ბეტონის მოწყობა (ქარგილის გამოყენებით)	მ³	1		
31	შახტის ბაქანზე ტიხრების მოწყობა მუყაო-თაბაშირის ფილებით (მხოლოდ ტიხრის ერთ გვერდზე გამოყენებული უნდა იყოს მუყაო-თაბაშირის ფილა) შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	20		
შენობის ფასადი					
1	შენობის ფასადის კედლის შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	9		
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	20		
3	შენობის ფასადზე 211 ოთახთან და მძღოლების ოთახთან ლითონის წყალგამტარი მილის დაგრძელება დ150მმ	გრძ/მ	6		
4	წყალსადენის ჰაში დ-50 ურდულის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	ც	1		
5	წყალსადენის ჰაში დ-50 უკუსარქველის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი	ც	1		
სარდაფის კიბის უჯრედი					
1	სარდაფის ჩასასვლელში, კუთხოვანებში ჩასმული ბეტონის საფეხურის დემონტაჟი (0.30X1.50X0.05მ)-17ც	ც	17		
2	ლითონის მოაჯირის დემონტაჟი (1.00X2.00მ)	მ²	2		
3	მეტალბის და მოზაიკის ფილების დემონტაჟი	მ²	13		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

4	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	მ²	13		
5	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ²	7		
6	დემონტირებული ხის იატაკის ადგილზე გადახურვის ფილის მოწყობა 12სმ-იანი შველერით (შველერი უნდა შევიდეს კედელში ორივე მხარეს არანაკლებ 10სმ-ის)	გრძ.მ	9.6		
7	10მმ-იანი არმატურის ორმაგი ბადის მოქსოვა ბიჯით 20X20-ზე ორივე მიმართულებით	მ²	7		
8	ბაქანზე ბეტონის დასხმა (3.0X2.3X0.12მ) (ქარგილის გამოყენებით)	მ³	0.83		
9	სარდაფის ჩასასვლელში, ბეტონის საფეხურების მოწყობა(1,50X0,30მ)-20ც	ც	20		
10	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა მორკინებით	მ²	20		
11	საკაბელო არხზე ლითონის კუთხოვანების (50X50მმ) მოწყობა, შეღებვა	გრძ.მ	16		
12	საკაბელო არხებზე ლითონის მილკვადრატის (10X10მმ) მოწყობა, შეღებვა	გრძ.მ	16		
13	საკაბელო არხზე ლითონის არანაკლებ 3მმ-იანი დადარული ფურცლების მოწყობა, შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	4		
14	ლიობის გაჭრა კედლებში კარებისთვის (0.70X2.20მ)-2ც	მ²	3.08		
15	ლითონის ყრუ ერთ ფურცლიანი კარების მოწყობა საკეტით და შეღებვით 0.70X2.20მ - 2ც	მ²	3.08		
16	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე მუყაო-თაბაშირის ფილებით. შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	13		
17	შეკიდული ჭერის მუყაო-თაბაშირის ფილების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	13		
18	ლითონის გისოსის მოწყობა ერთ ფრთიანი კარით (1.00X2.40მ)-1ც გასაღებიანი საკეტით და შეღებვით („შემსყიდველის“ მიერ მითითებულ ადგილას)იხ.ნახაზი	მ²	19		
შიდა კიბის უჯრედი					
1	ხის კარების დემონტაჟი (1.40X2.00მ)-1ც (1.40X2.30მ)-1ც	ც	2		
2	გისოსებიანი ლითონის კარის დემონტაჟი 1.00X2.40მ -2ც	ც	2		
3	არსებული ბლოკის ტიხრის დემონტაჟი	მ²	51		
4	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა	მ²	77		
5	არსებული ლიობების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით	მ²	15		
6	ლიობის გამონგრევა კარებისათვის 1.00X2.40მ -2ც	მ²	4.8		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

7	ტიხრების ამოშენება სატიხრე ბლოკით 0.40X0.20X0.10	მ²	60		
8	არსებული ბეტონის კიბის საფეხურების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	11		
9	ქვიშა -ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა მორკინებით	მ²	145		
10	ლამინირებული იატაკის მოწყობა პლინტუსით	მ²	9.6		
11	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	230		
12	ლითონის ყრუ ორ ფრთიანი ერთ ფურცლიანი კარების მოწყობა საკეტი და შეღებვით 1.40X2.30მ -2ც 2.00X2.40მ -1ც	მ²	11.24		
13	ლითონის ყრუ ერთ ფურცლიანი კარების მოწყობა საკეტი და შეღებვით 1.00X2.40მ -3ც	მ²	7.2		
14	არსებული შეღებური 14-იანი-5.6გრძ.მ და კუთხოვანა 100X100მმ-6.8 გრძ.მ 50X50მმ-18.7 გრძ.მ შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გრძ.მ	31.1		
15	არსებული ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	4.2		
16	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე მუყაო-თაბაშირის ფილებით. შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	145		
17	შეკიდული ჭერის მუყაო-თაბაშირის ფილების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	145		
18	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	380		
19	კედელზე მოსაწყობი ლითონის კონსტრუქციის თაროები "სტელაჟი" ხის ფიგრებით (ნახაზის და ტექ. პირობის მიხედვით) (ლითონის კუთხოვანა არანაკლებ 45X45X4 მმ, ხის თარო 40მმ სისქის) (კუთხოვანის შეღებვით ზეთოვანი საღებავით, ხის ფიგრების შეღებვა ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით თვალსაჩინოების მიზნით შეიღების ფერადი ხსნარით (დამაგრდეს კედელზე)	მ²	107		
20	სარდაფში და შახტაში არსებული საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა და გადაყრა ნაგავსაყრელზე	მ³	60		
21	სახურავზე არსებული ჰაერგამწოვი მილის შეფუთვა ფორგირებული მინა-ბამბით და ლითონის ფურცლით	გრძ.მ	4.5		
ელ.სისტემის მოწყობის სამუშაოები					
1	სპილენძის სადენი 3X6მმ²	გრძ.მ	20		
2	სპილენძის სადენი 3X4მმ²	გრძ.მ	10		
3	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ² (როზეტებისთვის და განათებისთვის)	გრძ.მ	400		

4	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9-ვატიანი	ც	54		
5	ლუმინისცენტური დღის განათების სანათი (ელ. დროსელით) 2X36 სიგრძით 120 სმ (დახურული) კედელზე მისამაგრებელი (ელ. დროსელით)	ც	14		
6	გამანაწ. ფარი შესაბამისი ზომის	ც	1		
7	გამანაწილებელი კოლოფები	ც	6		
8	ავტომატი 63ა	ც	1		
9	ავტომატი 32ა	ც	1		
10	ავტომატი 25ა	ც	6		
11	როზეტი	ც	9		
12	ჩამრთველი	ც	7		
საკუმულატორო ოთახი					
1	საკუმულატორო ოთახის ჩასასვლელში, მილკვადრატებით (40X 40მმ) ტიხრისთვის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა, შეღებვით	გრძ.მ	10		
2	საკუმულატორო ოთახის ჩასასვლელში, ლითონის კონსტრუქციაზე მოთუთიებული ლითონის ფურცლის მოწყობა არანაკლებ 0.5 მმ სისქის	მ²	4		
3	საკუმულატორო ოთახის ჩასასვლელში, მილკვადრატებით (80X 80მმ) კარებისთვის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა, შეღებვით	გრძ.მ	8		
4	ორფრთიანი კარების ბლოკის მოწყობა კუთხოვანას (45X45მმ) გამოყენებით	გრძ.მ	12.8		
5	კარების ბლოკის და კარების თავზე ღიობის შესავსებად მავთულბადის (არანაკლებ 3მმ-იანი მოთუთიებული მავთულის გამოყენებით) მოწყობა ბიჯით 5X5სმ	მ²	5		
საწყოები					
1	პლასტმასის შეკიული ჭერის დემონტაჟი	მ²	74		
2	ამსტრონგის ტიპის შეკიდული ჭერის მოწყობა 60X60 შესაბამის კონსტრუქციაზე	მ²	74		
3	გისოსებიანი ლითონის კარის დემონტაჟი 1.20X3.20მ -1ც	ც	1		
4	სარდაფში ჩასასვლელი ბეტონის საფეხურებზე არსებული კუთხოვანების დემონტაჟი და ახალი კუთხოვანების მოწყობა	გრძ.მ	15		
5	ლითონის ფურცლის მოწყობა კიბის საფეხურებზე 1.50X0.10X0.03მ -27ც 2.20X0.25X0.03მ -1ც	მ²	4.5		
6	ლითონის ფურცლის და კუთხოვანების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	15		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

7	ლითონის ერთ ფურცლიანი კარების მოწყობა ერთი წყვილი საბოქლომე საყურეებით საკეტი და შეღებვით 1.40X2.40მ -1ც	მ²	3.36		
8	ლითონის გისოსების მოწყობა მილკვადრატებით 20X20მმ, შეღებვით	მ²	5.6		
9	ლითონის გისოსებზე არანაკლებ 0.5მმ სისქის ლითონის მოთუთიებული ფურცლის მოწყობა	მ²	5.6		
10	არსებული ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორივე მხრიდან 1.40X2.20მ -2ც 1.20X2.60მ -1ც	მ²	15.5		
11	არსებულ ლივტის ღიობში 8მმ-იანი ლამინირებული ფანერის მოწყობა	მ²	3		
12	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	70		
ელ.სისტემის მოწყობის სამუშაოები					
1	სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ² (როზეტებისთვის და განათებისთვის)	გრძ.მ	80		
2	შეკიდულ ჭერში ჩასასმელი ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 9-ვატიანი	ც	50		
3	ლედ სანათი დიოდებზე არანაკლებ 24-ვატიანი ჭერზე მისამაგრებელი კიბის უჯრედში 30X30 სმ	ც	6		
4	როზეტი	ც	3		
სარდაფის სავენტილაციო სისტემა					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	თუნუქის ჰაერსატარის დემონტაჟი 30-50სმ	მ	16		
მოდინებითი სისტემის მონტაჟი					
1	ჰაერმოდინებითი დანაგარი I. 3295 მ3/სთ; P=200პა ელ. ძრავით N=1.185 კვტ. n=1150 ბრ/წთ ძაბვა 220/1/50, დენი A=5.1 ამპ, ფილტრით EU5 ელ. კალორიფერით BE2 N=24 კვტ. Db=51.7; წონა 102 კგ; დაცვის კლასი FIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
2	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
3	მოდინებითი ცხურა 200X100	ცალი	1		
4	მოდინებითი ცხურა 500X100	ცალი	1		
5	მოდინებითი ცხურა 400X150	ცალი	4		
6	ჰაერსატარი 150X150	ცალი	1		
7	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150x150x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		

8	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 300x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		
9	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x250x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		
10	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x400x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	25		
11	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა ძარღვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*16	გრძ.მ.	20		
12	ავტომატი	ცალი	1		
14	გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1		
გამწოვი სისტემის მონტაჟი					
1	არხული გამწოვი ვენტილიატორი L=3295 მ3/სთ; P=786პა ელ. ძრავით N=3.616 კვტ; A=6.4 ამპ; ძაბვა 400/3/50; n=1295 ბრ/წთ; dB=66 დბ; წონა 60 კგ; დაცვის კლასი BIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
2	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
3	ჰაერსაფარი Ø180 400X200	ცალი	1		
4	ჰაერსაფარი Ø315 400X201	ცალი	2		
5	თანაბარშეწოვის პანელი 900X650	ცალი	2		
6	გამწოვი დიფუზორი 300X100	ცალი	1		
7	გამწოვი დიფუზორი 200X100	ცალი	3		
8	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან Ø100X1 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	4		
9	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან Ø180X1 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	15		
10	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან Ø315X1 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	12		
11	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან Ø400X1 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	16		

ელექტრონული ტენდერი სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისის სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე.

12	ქოლგა გამწოვ მახტაზე Ø400	ცალი	1		
13	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა მარდვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*2.5	გრძ.მ.	10		
14	ავტომატი	ცალი	1		
სამზარეულოს სავენტილაციო სისტემა					
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	თუნუქის ჰაერსატარის დემონტაჟი 25-40სმ	მ	28		
2	ამწოვი ქოლგის დემონტაჟი	ცალი	2		
მოდინებითი სისტემის მონტაჟი					
1	ჰაერმოდინებითი დანაგარი L=3200 მ3/სთ; P=210პა ელ. ძრავით N=1.185 კვტ. n=1150 ბრ/წთ ძაბვა 400/3/50, დენი A=5.1 ამპ, ფილტრით EU5 ელ. კალორიფერით BE3 N=30 კვტ. Db=51.7; წონა 102კგ; დაცვის კლასი FIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
2	ჰაერმიმღები ჟალუზი 1320X320	ცალი	1		
3	კროშტეინები დანადგარის კედელზე დასაყენებლად	კომპ.	1		
4	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
5	მოდინებითი დიფუზორი balance-S-160-ის მსგავსი	ცალი	4		
6	მოდინებითი ცხურა 300X100	ცალი	5		
7	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1		
8	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x250x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1		
9	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x150x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	0.7		
10	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 250x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	0.7		

11	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 300x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	2		
12	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	4		
13	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x300x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.5		
14	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x400x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	6		
15	საკაბელო არხი 250x200	გრძ.მ.	3		
16	ჰაერსატარი 400x200	ცალი	1		
17	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა ძარღვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*16	გრძ.მ.	15		
18	ავტომატი	ცალი	1		
20	გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1		
გამწოვი სისტემის მონტაჟი					
1	სამზარეულოს გამწოვი ვენტილიატორი L=3900 მმ/სთ; P=8593ა ელ. ძრავით N=2.2 კვტ; A=5.0 აბჰ; ძაბვა 400/3/50; გასაწოვი ჰაერის ტემპერატურა 1200 C; $\pi=2660$ ბრ/წთ; $dB=54/46$ დბ; წონა 100 კგ; დაცვის კლასი FIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
2	კრომტენინები დანადგარის კედელზე დასაყენებლად	კომპლ.	1		
3	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
4	გამწოვი დიფუზორი balance-E- 200-ის მსგავსი	ცალი	5		
5	ამწოვი ქოლგა თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან სისქით 2000X1000X1მმ	ცალი	1		
6	ამწოვი ქოლგა თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან სისქით 1500X1000X1მმ	ცალი	1		

7	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150x100x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	0.8		
8	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x100x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	4.2		
9	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x120x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.3		
10	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x150x0.7(შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	5		
11	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	2		
12	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 300x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	2		
13	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x400x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		
14	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 500x400x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.8		
15	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან Ø450 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	27		
16	ქოლგა გამწოვ შახტაზე Ø450	ცალი	1		
17	საკაბელო არხი 450X250	გრძ.მ.	3		
18	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა ძარღვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*2.5	გრძ.მ.	10		

19	ავტომატი	ცალი	1		
სათათბირო ოთახის სავენტილაციო სისტემა					
მოდინებითი სისტემის მონტაჟი					
1	ჰაერმოდინებითი დანაგარი L=2000 მ3/სთ; P=200პა ელ. ძრავით N=0.960 კვტ. n=1070 ბრ/წთ ძაბვა 220/1/50, დენი A=4.22 ამპ, ფილტრით EU5 ელ. კალორიფერით BE3 N=18 კვტ. dB=46.2; წონა 80კგ; დაცვის კლასი FIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
3	კროშტენები დანადგარის კედელზე დასაყენებლად	კომპ.	1		
4	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
6	მოდინებითი ცხურა 300X100	ცალი	5		
7	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150x150x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	0.8		
10	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 250x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1		
11	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 300x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.2		
12	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.3		
13	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 500x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	1.5		
14	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x250x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		
15	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა ძარღვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*16	გრძ.მ.	75		
16	ავტომატი	ცალი	1		
17	გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1		

გამწოვი სისტემის მონტაჟი					
1	არხული ვენტილიატორი L=1600 მ3/სთ; P=385პა ელ. ძრავით N=1.231 კვტ; A=5.4 ამპ; ძაბვა 220/1/50; გასაწოვი ჰაერის ტემპერატურა 550 C; n=1340 ბრ/წთ; dB=62 დბ; წონა 28კგ; დაცვის კლასი FIP54 საკუთნებით	კომპ.	1		
2	კრომტენიები დანადგარის კედელზე დასაყენებლად	ცალი	1		
3	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
4	გამწოვი დიფუზორი balance-E-200-ის მსგავსი	ცალი	8		
5	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150x100x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	2		
6	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 150x150x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	2.8		
7	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x150x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	3		
8	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 200x200x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	4.5		
9	ჰაერსატარი თხელფურცელ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან 400x250x0.7 (შესაბამისი გადამყვანებით, მუხლებით, სამკაპებით, სამაგრი კომპლექტებით)	გრძ.მ.	6		
10	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა ძარღვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*2.5	გრძ.მ.	75		
11	საკაბელო არხი 250X250	გრძ.მ.	5		
12	ავტომატი	ცალი	1		
სანკვანძის გამწოვი სისტემა					
1	სანკვანძის გამწოვი ვენტილიატორი L=50 მ3/სთ; P=60პა ელ. ძრავით N=45 ვტ; n=1400ბრ/წთ; dB=45 დბ; დაცვის კლასი IP44	კომპ.	1		

2	სანკვანძის წრფივი ღერძული ვენტილიატორი L=50 მ3/სთ; P=513ა ელ. ძრავით N=20 ვტ; n=2400ბრ/წთ; d8=415 დბ; დაცვის კლასი 1P44	კომპ.	1		
3	ხმაურმაყუჩი დანადგარის შესაბამისი	ცალი	1		
4	გამწოვი დიფუზორი balance-E- 100-ის მსგავსი	ცალი	1		
5	ჰაერსატარი პლასტმასის Ø100	გრძ.მ.	15		
6	მოქნილი ჰაერსატარი Ø100	გრძ.მ.	1.5		
7	ელ. სადენი სპილენძის მრავალწვერა მარდვით და ორმაგი ოზოლაციით 3*2.5	გრძ.მ.	15		
8	ამომრთველი	ცალი	1		
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან (ნაგავსაყრელზე)				
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)				
	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

ბ.ა

6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია:

6.1 აღნიშნულ ტენდერში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა.

6.2 ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

6.2.1 შევსებული ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (დანართი №1).

6.2.2 არის თუ არა პრეტენდენტი კომპანია რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად.

6.2.3 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტით განსაზღვრულ ტექნიკურ პირობაზე.

6.2.4 სამუშაოს შესრულების ვადა.

6.2.5 შესრულებულ სამუშაოებზე კონკრეტული საგარანტიო ვადა.

6.2.6 ინფორმაცია (მოთხოვნა) ავანსის საჭიროების შესახებ (არაუმეტეს 40%-ისა). იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნება ატვირთული ინფორმაცია ავანსის მოთხოვნის შესახებ ჩაითვლება, რომ პრეტენდენტი არ ითხოვს ავანსს და საავანსო თანხა არ იქნება გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში.

6.2.7 პრეტენდენტის რეკვიზიტები: მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო რეკვიზიტები, ტელეფონის ან/და ფაქსის ნომრები.

6.3 ხელშეკრულებაში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ის ოდენობის, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მისი მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე ხელშეკრულებაში გამოყენებული (მოთხოვნილი) იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

6.4 სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოთხოვნის საშუალებები და პროცედურები განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-6 მუხლის შესაბამისად.

6.5 ყველა სავალდებულო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე წარმოდგენილ ყველა დოკუმენტს და ინფორმაციას თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

6.6 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

6.7 ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ დაიშვება.

7. საკონტაქტო ინფორმაცია

ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ინფორმაციისათვის და განმარტებებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრებს:

მანანა ამაღლობელი ტელ: 577755430, ელ. ფოსტა: manana.amaglobeli@gse.com.ge

სოფიო ბასილაძე ტელ: 598904466. ელ.ფოსტა: sopho.basiladze@gse.com.ge

გიორგი გოგინაშვილი ტელ: 577240424, ელ. ფოსტა: giorgi.goginashvili@gse.com.ge

სულხან ზუმბურიძე-----
კომისიის თავმჯდომარე

მამუკა სხილაძე-----
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

მამუკა პაპუაშვილი-----
კომისიის წევრი

დავით გოლოშვილი-----
კომისიის წევრი

გელა ტატიშვილი-----
კონსულტანტი

თემურ ქობალია-----
კონსულტანტი

ზურა ქინქლაძე-----
კონსულტანტი

გიორგი გოგინაშვილი-----
აპარატის წევრი

მანანა ამაღლობელი-----
აპარატის წევრი

სოფიო ბასილაძე-----
აპარატის წევრი
