



26826-11-3-202211041041

N 26826

04/11/2022

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №9(გ)UNDP/Japan
დაფინანსების წყარო: 2022 წლის გრანტი (UNDP) (ხელშეკრულება უნომრო); (№2600;
12.08.2022)

ერთის მხრივ, **სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო** (შემდგომში შემსყიდველი) სააგენტოს უფროსის მოადგილის **გიორგი ჭაჭიაშვილის** სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. № 6, ს/კ 204578581. ტელ: 2753910. საბანკო რეკვიზიტები: საბანკო რეკვიზიტები: ცენტრალური ხაზინა, კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB0330100200165022. ხოლო მეორეს მხრივ **შპს „NEW GEORGIA“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის **ლერი მახარაძის** სახით, მისამართი: ქ.თბილისი, დიდის მასივი, ბელიაშვილის ქ. N 142, ს/კ 431168265 ტელ: 599 303 400. საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22 ა/ნ GE87BG0000000358787500GEL „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე (**SPA220002297**) ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგების გათვალისწინებით ვაფორმებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.3. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 1.6. „ეტაპი“ ნიშნავს სამუშაოთა გარკვეულ ნაწილს, რომელიც მიმწოდებლის მიერ შესრულდა კონკრეტული ეტაპისათვის და რომელზეც მხარეთა შორის შედგა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტი.
- 1.7. „მშენებლობა“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტი (ხელშეკრულების საგანი).
- 1.8. „ტექნიკური დავალება“ (**SPA220002297**) ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც არის ხელშეკრულების, განუყოფელი ნაწილი.

2. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და ღირებულება

- 2.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მაღალ დონეზე და სრულფასოვნად, განახორციელოს **მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჯილაურაში (მიწის ნაკვეთის საკ.კოდი 72.01.14.909) სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიანი ეზოს მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების** მიწოდება (SPV 45210000 - შენობების მშენებლობა) სატენდერო დოკუმენტაციისა და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 2.2. მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და ხარჯის გათვალისწინებით (დღგ-ს გარდა) შეადგენს **260 796.95 (ორასსამოცათს შვიდასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 95 თეთრი) ლარს.**

- 2.3. სამუშაოების ჩამონათვალი, ერთეულის და საერთო ღირებულება გაწერილია შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობათა უწყისში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი №1 შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა).
- 2.4. შესყიდვა ხორციელდება სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების შესაბამისად, სააგენტოსათვის გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში.
- 2.5. პროექტის ფულადი სახსრები განთავსებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დ.ღ.გ-ს გადასახადისაგან. <https://www.rs.ge/TaxPrivileges>

3. ხელშეკრულების შესრულების ინსპექტირება და სამუშაოთა ზედამხედველობა

- 3.1. შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, განახორციელოს სამუშაოთა ზედამხედველობა, რომელსაც ახორციელებს სამუშაოთა ზედამხედველობის ჯგუფი.
- 3.2. სამუშაოთა ზედამხედველობის ჯგუფის ფუნქციები:
 - 3.2.1 გაუწიოს ინსპექტირება სამუშაოს განხორციელების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას.
 - 3.2.2 დაადგინოს შესაბამეობა, თუ არა განხორციელებული სამუშაო ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
 - 3.2.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით, რომლის აღმოფხვრის ხარჯების დაფარვა სრულად ეკისრება მიმწოდებელს.
 - 3.2.4 უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
 - 3.2.5 შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი და უხარისხო შესრულების, ხარვეზებისა და დეფექტების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ აღმოფხვრის ან ვადების დარღვევის შემთხვევაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესაბამისი საჯარიმო ღონისძიებების გამოყენება, დოკუმენტაციის შედგენა. საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხის დასმა.
 - 3.2.6 შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის ინსპექტირება.
 - 3.2.7 საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრისათვის საკითხის დროულად დაყენება და შესრულებაზე ინსპექტირება. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის საფუძველზე მომზადებული მშენებლობის წარმოების პროექტის გადამოწმება, შეთანხმება და ინსპექტირება მის შესრულებაზე.
 - 3.2.8 მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერტიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობის შემოწმება.
 - 3.2.9 მონაწილეობა სამშენებლო ინსპექტირებისა და მშენებლობის ცალკეული ეტაპის სამშენებლო სამუშაოთა ხარისხის შემოწმება შეფასებაში და პროექტთან შესაბამისობის დადგენაში.
 - 3.2.10 პირველადი სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოებაზე ინსპექტირება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ნაკლოვანებებისა და დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის ოპერატიულად აღმოფხვრისათვის ღონისძიებების გატარება და საჭიროების შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანაზე საკითხის დასმა/შეტყობინება შემსყიდველისათვის.
 - 3.2.11 მონაწილეობა მუშა კომისიების მიერ ცალკეული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხზე და საპროექტო მონაცემთა შესაბამისობაზე ჩატარებულ შემოწმებებში.
 - 3.2.12 სამუშაოთა ცალკეული ეტაპის დასრულების შემდეგ ტესტირების ჩატარების მოთხოვნა.
 - 3.2.13 საჭიროების შემთხვევაში პროექტსა და ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და აუცილებლობის შესახებ შემსყიდველ მხარეზე არგუმენტირებული წინადადებების/განმარტების წარდგენა.
 - 3.2.14 სამუშაოების დასრულებამდე, დასრულების შემდგომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საგრანტო ვადაში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოჩენა.
 - 3.2.15 მშენებლობის ხარისხის შესაბამისობის დოკუმენტური ანალიზი. პროექტის მიმდინარეობის საერთო ანგარიში.
 - 3.2.16 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა ზედამხედველობის და ინსპექტირების განმახორციელებელი ჯგუფის წევრები არიან **თენგიზ ივანელაშვილი** - სააგენტოში მიმდინარე

მშენებლობების ტექნიკური ზედამხედველი, სამუშაოთა ზედამხედველობის განმახორციელებელი; **მირიან ოდიშელიძე** - მცხეთის სატყეო უბანის უფროსი, სამუშაოთა კონტროლის განმახორციელებელი; **გიორგი მამულაშვილი** - მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის სპეციალისტი-სამუშაოთა კონტროლის განმახორციელებელი;

4. სამუშაოთა შესრულების პირობები

- 4.1. სამუშაოს შესრულება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების თანდართული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 4.2. სამუშაოს შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ურთიერთშეთანხმებით, წერილობითი ფორმით, ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მოტივირებული და დასაბუთებული წერილობითი ინიციატივის საფუძველზე.
- 4.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ.
- 4.4. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოთა წარმოების შეჩერება გარკვეული დროით (აღნიშნული დროის სავარაუდო ან ზუსტი მითითებით), რისი მიზეზიც შეიძლება იყოს წინამდებარე ხელშეკრულების ფინანსური უზრუნველყოფის საორგანიზაციო საკითხები. ასეთ შემთხვევაში ეს დრო არ ჩაითვლება ვადაგადაცილებაში.
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით, საპროექტო დოკუმენტაციითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა.
- 4.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისას გამოყენებული მასალების ტექნიკური მახასიათებლები როგორცაა ფერი, ფაქტურა, ზომები და ფორმები გამოყენებამდე ნიმუშის სახით შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან.
- 4.7. სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. ამასთან, შემსყიდველის მოთხოვნისას მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე წარმოადგინოს შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სერტიფიკატები).
- 4.8. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მოიპოვოს „შემსყიდველის“ თანხმობა ნებისმიერ გადახვევაზე მასთან შეთანხმებული გეგმებიდან, ნახაზებიდან და მასალებიდან, რომელთა ნიმუშები უკვე შეთანხმდა „შემსყიდველთან“. ამასთან, „მიმწოდებელი“ არ არის უფლებამოსილი დამატებით საზღაურსა და შესრულების ვადის გაგრძელებაზე, თუ არ განხორციელდა შესაბამისი დამატება ან არ იქნა მიღებული შემსყიდველის წერილობითი თანხმობა (განკარგულება ან შესაბამისი წესით გაფორმებული შეთანხმების აქტი) აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე.
- 4.9. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია, „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს მას სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაყენებელი მასალის ნიმუში, აღნიშნული მასალის გამოსაყენებლად თანხმობის მიღების მიზნით.

5. სამუშაოს შესრულების ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

- 5.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მოაზადოს სამუშაოების შესასრულებლად გამოყოფილი ადგილი შესაბამისი წესით და უზრუნველყოს გარემოს დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ:
 - ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები „მიმწოდებლის“ მიერ ამისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე და სამუშაოთა დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენა;
 - ბ) პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით, ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
 - გ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
 - დ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ, საბოლოო ცდების პროცედურების დასრულებამდე, საკუთარი ძალებით და სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი (მიმწოდებლის ტერიტორია) სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.

6. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- 6.1. სახელშეკრულებო ობიექტზე „მიმწოდებელმა“ უფლებამოსილია აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოებს, შემსრულებელი

პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცესებს და სხვა.

- 6.2. „მიმწოდებელი“ და „შემსყიდველი“ ჟურნალში აღნიშნავენ თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.
- 6.3. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.
- 6.4.

7. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

- 7.1. სამშენებლო სამუშაოების ადგილია მცხეთის მუნიციპალიტეტ, სოფელი ჯილაურა (მიწის ნაკვეთის საკ.კოდი 72.01.14.909).
- 7.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღისა უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება.
- 7.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 7.4. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს შეასრულებს დადგენილ ვადაზე ადრე „შემსყიდველი“ ვალდებულია მიიღოს აღნიშნული სამუშაო.

8. შესყიდვის მიღება-ჩაბარების წესი

- 8.1. **შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

ა) სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ორგანოს მიერ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების დადგენის მიზნით გაცემული დასკვნა (აუცილებელი პირობა: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოში დასკვნის მომზადების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი);

ბ) ფორმა #2 რომელიც დადასტურებული იქნება სამუშაოთა შემსრულებლისა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) ხელმოწერით;

გ) ფარული სამუშაოების შესრულების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის - ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) და სამუშაოთა შემსრულებლის წარმომადგენლის ხელმოწერით;

დ) ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) განმახორციელებელი პირის/ორგანოს დასკვნა;

ე) საპროექტო ზედამხედველი კომპანიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისობის დასკვნა;

ვ) საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შედგენილი ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად.

- 8.2. **საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

ა) სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ორგანოს მიერ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების დადგენის მიზნით გაცემული დასკვნა (აუცილებელი პირობა: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული ორგანოში დასკვნის მომზადების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი);

ბ) ფორმა #2 რომელიც დადასტურებული იქნება სამუშაოთა შემსრულებლისა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) ხელმოწერით;

გ) ფარული სამუშაოების შესრულების აქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის - ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) და სამუშაოთა შემსრულებლის წარმომადგენლის ხელმოწერით;

დ) ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრის (წევრების) განმახორციელებელი პირის/ორგანოს დასკვნა;

ე) ხელშეკრულების 10.3. პუნქტით განსაზღვრული, სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფი საბანკო გარანტია;

ვ) საპროექტო ზედამხედველი კომპანიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისობის დასკვნა;

ზ) საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შედგენილი ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად.

- 8.3. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მისი დამთავრების შემდეგ, წინამდებარე მუხლის 8.1 და 8.2 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.
- 8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების **აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირია მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის უფროსი - ლევან ზადაგაძე.**
- 8.5. სამუშაოების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 8.6. შემსყიდველის საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს/ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ს წარუდგინოს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას.
- 8.7. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, (დასაშვებია ელ.ფოსტის საშუალებითაც) შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში მითითებულ მისამართზე აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს რაოდენობის და წუნდების მიზეზის მითითებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებული ასეთი შეტყობინების მიღებიდან შემსყიდველთან შეთანხმებით განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას საკუთარი ძალებითა და სახსრებით დეფექტი.
- 8.8. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ - ს მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნულ საექსპერტო დაწესებულებაზე სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“ - ს მიერ გაცემული აკრედიტაციის მოწმობა. მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპერტიზის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას.
- 8.9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა ჩამონათვალში (ფორმა №2) მითითებული შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა და ღირებულება განსხვავდება ექსპერტიზის დასკვნაში დაფიქსირებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ღირებულებისაგან, ანგარიშსწორება განხორციელდება უმცირესი ფასის თანახმად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულებისა.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 9.1. **შემსყიდველი ვალდებულია:**
 - 9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 9.1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;
 - 9.1.3. აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
 - 9.1.4. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით (სამუშაოების შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადებში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი).
- 9.2. **შემსყიდველს უფლება აქვს:**
 - 9.2.1. ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ინსპექტირება და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
 - 9.2.2. განახორციელოს მიმდინარე/შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატენდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების გათვალისწინებით;
 - 9.2.3. ხელი მოაწეროს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს და მასთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციას;
 - 9.2.4. მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

- 9.2.5 საჭიროების შემთხვევაში მოსთხოვოს მიმწოდებელს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები (აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას).
- 9.3. **მიმწოდებელი ვალდებულია:**
- 9.3.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.3.2 სამშენებლო/სადემონტაჟო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულების 7.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადებში;
- 9.3.3 ფარული სამუშაოები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით/სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ;
- 9.3.4 სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 9.3.5 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
- 9.3.6 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად;
- 9.3.7 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
- 9.3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელი შეუწყოს შემსყიდველს, ტექნიკურ ზედამხედველ(ებ)ს და საავტორო ზედამხედველ(ებ)ს შემოწმების-ზედამხედველობის ჩატარების დროს.
- 9.3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან სამუშაოების პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი, ფერი და სხვა ძირითადი მახასიათებლები.
- 9.3.10 შემსყიდველის საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს/ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ს წარუდგინოს მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტები, სერტიფიკატები, ხარისხის დამადასტურებელი ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები და სხვა დოკუმენტები. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა წარმოადგენს მიმწოდებლის ვალდებულებას.
- 9.3.11 მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით შეადგინოს ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც საჭირო გახდება ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩასატარებლად. ამავდროულად ესპერტიზაზე წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა დასტურდებოდეს ტექნიკური ზედამხედველ(ებ)ის მიერ.
- 9.3.12 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოთა ცალკეული ეტაპ(ებ)ის დასრულების შემდეგ განახორციელოს ტესტირება/შემოწმება და ტესტირების/შემოწმების შედეგები წერილობით აცნობოს შემსყიდველს.
- 9.4. მხარეების მიერ ხარვეზების არსებობის შესახებ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტი და განახორციელონ ხარვეზის შეფასება (ექსპერტიზის ხარჯს ხარვეზის დადასტურების შემთხვევაში დაფარავს მიმწოდებელი).
- 9.5. ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე და ხარვეზის აღმოფხვრის შესახებ „მიმწოდებლის“ მიერ უარის თქმის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით მოიწვიოს მესამე მხარე და ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობა დაუქვითოს „მიმწოდებელს“ საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან.
- 9.6. პროექტში ცვლილების საჭიროების დადგომის შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ ზემოაღნიშნული საკითხის დასმის შემდეგ, შესაბამის სამუშაოებზე, მიმწოდებელზე პირგასამტეხლოს დაკისრება არ განხორციელდება საკითხის გადაწყვეტისათვის გამოყენებულ დღეებზე იმ შემთხვევაში, თუ საკითხი შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან.

10. გარანტია

- 10.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **1 (ერთი) წელი**.
- 10.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუწის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუწი (ნაკლოვანებები,

- დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.
- 10.3. **სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 3 % სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისას,** საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.
- 10.4. მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 10.5. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 10.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 10.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
- 10.6. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ერთი თვის ვადაში გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

11. ანგარიშსწორება

- 11.1. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად:
- 11.2. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს კონკრეტული ეტაპისათვის, მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების, ხელშეკრულების მე-8 მუხლის შესაბამისად კონკრეტული სამუშაოების დასრულების შესახებ შედგენილი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 11.3. საბოლოო ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება ხელშეკრულების მე-8 მუხლის შესაბამისად სამუშაოების დასრულების შესახებ შედგენილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 11.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე.
- 11.5. შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სავალდებულო საავანსო ანგარიშსწორება არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების **40%-ის** ოდენობით. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების მიერ) საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 11.6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსად მიღებული თანხა გამოიყენოს მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის.
- 11.7. მიმწოდებელს ავანსის წარმოდგენის დღისათვის ბიუჯეტის მიმართ არ უნდა გააჩნდეს 1000 ლარზე მეტი ოდენობის დავალიანება.
- 11.8. **საავანსო ანგარიშსწორება განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს სახელშეკრულებო ღირებულების 60 %-ს.**

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებების შეტანა

- 12.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წაწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლის ან მათი შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

- 12.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ემუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ფასების ცვლილების შესახებ ამ ხელშეკრულების მხარემ (ინიციატორმა) უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით 10 დღით ადრე. თუ მხარეები არ შეატყობინებენ ერთმანეთს ფასების ცვლილების შესახებ, ფასი რჩება უცვლელი, მიუხედავად ამ ხელშეკრულების 12.2. პუნქტით და განსაზღვრული პირობების დადგომისა.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და შეწყვეტა

- 13.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 13.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების ამ მუხლში.
- 13.3. თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- 13.4. შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 13.5. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (მათ შორის გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შესრულების ვადის გასვლიდან 20 კალენდარულ დღეში) სამუშაოთა შეუსრულებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის შესაბამისი წინასწარი შეტყობინების გაგზავნის გარეშე და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 13.6. „მიმწოდებელს“ დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (მათ შორის გეგმა გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში) შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.
- 13.7. თუ 13.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 13.8. თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე შემსყიდველი მივა დასკვნამდე, რომ შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და „მიმწოდებელი“ დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.
- 13.9. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა ან/და საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 13.10. „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- 13.10.1 თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- 13.10.2 „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;
- 13.10.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 13.10.4 ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

14. ფორს-მაჟორი

- 14.1. ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არასათანადოდ (ნაწილობრივ) შესრულებისათვის მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ იგი გამოწვეულია მათი ნებისაგან დამოუკიდებელი დაუძლეველი გარემოებით (ფორს-მაჟორი).

- 14.2. ფორს-მაჟორად ჩაითვლება მათ შორის, სტიქიური მოვლენები (ასეთ შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს კომპეტენტური ორგანოს ცნობა/ დასკვნა ასეთი მოვლენის შესახებ);
- 14.3. ფორს-მაჟორული მოვლენების წარმოშობის შესახებ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული საკომუნიკაციო საშუალებით (ტელეფონი, ფოსტა, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, კურიერი და სხვა).
- 14.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობა ავტომატურად არ იწვევს ხელშეკრულების გაუქმებას. მხარეებმა შესაძლებელია განსაზღვრონ წინამდებარე ხელშეკრულების ფორს-მაჟორულ მოვლენებთან მისადაგების საკითხი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ „შემსყიდველი“ ინტერესს დაკარგავს შესრულებისადმი.
- 14.5. ფორს-მაჟორული გარემოებების შეწყვეტისთანავე მხარეები დაუყოვნებლივ აგრძელებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
- 14.6. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1. მხარეებმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა მოლაპარაკებების გზით მიაღწიონ შეთანხმებას ყველა უთანხმოებასა თუ დავაზე. სხვა შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 15.2. ყველა სხვა საურთიერთობო პირობები, ან საურთიერთობო რეგულაციები, რაც პირდაპირ არ არის მითითებული ამ ხელშეკრულებაში, წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

- 16.1. იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, აღნიშნულ ხელშეკრულებაში გამოიყენება ს.ს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“-ს მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია NFG/22 004677, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის (5216 ლარი) ოდენობით, რომელიც ძალაშია 2023 წლის მარტის ჩათვლით.
- 16.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი არ დაუბრუნებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას და იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში.

17. ხელშეკრულების დამატებითი პირობები

- 17.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნაწილობრივი, ან სრული შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას ამ ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 17.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების შესრულების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების (წყალი, ელ. ენერგია და სხვა) საფასური დაფაროს საკუთარი ხარჯებით.
- 17.3. მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის #1-1/1463 ბრძანებისა და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
- 17.4. მხარეები ვალდებული არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.
- 17.5. ხელშეკრულებას დანართის სახით ახლავს და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტები:
 დანართი #1 – შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობათა უწყისი/ხარჯთაღრიცხვა (ფასების ცხრილი).
 დანართი #2 – თითოეული ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია.

- 17.6. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, **ელექტრონულად**, რომლის თითოეული გვერდი ორიგინალია. წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია შეთანხმების ელექტრონული ფორმით გაფორმებისა და ხელმოწერის შემდეგ.
- 17.7. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს **2023 წლის 31 იანვრამდე**, გარდა ხელშეკრულების მე-10 მუხლით განსაზღვრული პირობებისა.
- 17.8. სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის საბანკო გარანტია შესრულებულ სამუშაოებზე ძალაშია ამავე გარანტიის ვადის შესაბამისად.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

მიმწოდებელი:

შპს „NEW GEORGIA“

დირექტორი

ლერი მახარაძე

შემსყიდველი:

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო

გიორგი ჭაჭიაშვილი



სააგენტოს უფროსის მოადგილე



ობიექტის დასახელება: მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჯიდაურაში მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 72.01.14.909) სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს საქმიანი ეზოს მოწყობა

მშენებლობის ღირებულების კრებისითი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

რიგითი №	ხარჯთ. №	თავეების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი
1	2	3	8
		თავი 2	
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	
1	ხარჯთ. №1-1	ხის კოტეჯის სამშენებლო სამუშაოები	75496.11
2	ხარჯთ. №1-2	წყალ-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები	8599.50
3	ხარჯთ. №1-3	ელ.ქსელის და სუსტი დენების მოწყობის სამუშაოები	42051.10
4	ხარჯთ. №1-4	ტერიტორიის კეთილმოწყობის და დამხმარე შენობების მოწყობის სამუშაოები	122231.34
5		ჯამი	248378.04
6		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე - 5%	12418.90
7		ჯამი	260796.95

ხარჯთაღრიცხვა №1-1
ხის კოტეჯის სამშენებლო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ტანხ. ერთ.	ნორმატიული, ხარჯი		ხელფასი		მასალა		მანქანა მქონე მშენებელი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. საბირკველისა და ძირის სვეტების მოწყობა										
1	1-80-8	მიწის დამუშავება ხელით გრუნტში წერტილოვანი საბირკველის მოსაწყობად	10083		0.107							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	615.00	65.68	4.00	262.73					262.73
2	1-81-2	გრუნტის უკუზაყრა	10083		0.07							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	99.30	6.62	4.00	26.49					26.49
3	თ.15	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	ბ		4.80					15.00	72.00	72.00
4	8-3-2	წერტილოვანი საბირკველის ქვეშ, ქვიშა-ლორღის საფუძვლის მოწყობა	გ		0.97							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.89	0.87	4.00	3.46					3.46
		სხვა მანქანები	ღარი	0.370	0.36					4.00	1.44	1.44
	სრფ 3.1-246	ქვიშა-სრეშოვანი ნარევი	გ	1.15	1.12			15.00	16.77			16.77
		სხვა მასალები	ღარი	0.02	0.02			4.00	0.08			0.08
5	6-1-5	წერტილოვანი საბირკველის მოწყობა მიწისქვეშა რეტონით	10083		0.031							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	666.00	20.38	4.00	81.52					81.52
		სხვა მანქანები	მან	59.00	1.81					4.00	7.22	7.22
	სრფ 1.1-17	არმატურა დ-10-12 მმ	ბ		0.03			2500.00	257.10			257.10
	სრფ 1.1-16	არმატურა დ-8 მმ	ბ		0.051			2500.00	128.10			128.10
	სრფ 3.1-352	ბეტონი მ-250	მ3	101.50	3.11			220.00	683.30			683.30
	სრფ 4-106	ფარი ფიცრის კედლის სისქ. 25 მმ	მ2	160.00	4.90			750.00	3672.00			3672.00
	სრფ 4-26	ფიცარი ჩამოყალიბებული III ხარისხის სისქ. 40 მმ	მ3	1.83	0.06			750.00	42.00			42.00
		სხვა მასალები	მან	40.00	1.22			4.00	4.90			4.90
		2. იატაკის და კიბის მოწყობა										
6	10-4-1	ხის შემკრავი კოჭების მონტაჟი	83		2.47							
		შრომითი რესურსები	კაც-სთ.	24.0	59.28	4.00	237.12					237.12
		სხვა მანქანები	ღარი	1.300	3.21					4.00	12.84	12.84
	სრფ 4-1	ხის კოჭები	მ3	1.05	2.59			900.00	2334.15			2334.15
		ჭანჭიკი ქანით	კმ	7.500	18.53			10.00	185.25			185.25
	სრფ 4-1	ხის ძეგლები (რეიკა) 4X4სმ	მ3		0.100			900.00	90.00			90.00
	სრფ 1.4-34	კუთხოვანა 100X100X6სმ	ტონა		0.373			4200.00	1568.20			1568.20
	სრფ 1.4-34	კუთხოვანა 70X70X5სმ	ტონა		0.261			4200.00	1096.20			1096.20
	სრფ 3.2-7	ანტისეპტიკური ხსნარი	კმ	3.010	7.435			15.00	111.52			111.52
		ნაჭედი	კმ	3.080	7.608			5.00	38.04			38.04
		სხვა მასალები	ღარი	1.380	3.409			4.00	13.63			13.63
7	11-7-3	იატაკების თბოიზოლაცია, სისქით 150 მმ	10082		0.48							
		შრომითი რესურსები	კაც-სთ.	27.1	13.01	4.00	52.03					52.03
		სხვა მანქანები	ღარი	2.300	1.10					4.00	4.42	4.42
	სრფ 3.2-465	ქვა-ბაზა, სისქით 5სმ	მ2	309.00	148.32			5.00	741.60			741.60
8	11-27-3	თბოიზოლაციის დამკვეთი ფანერის მოწყობა	10082		0.492							
		შრომითი რესურსები	კაც-სთ.	43.1	21.21	4.00	84.82					84.82
		სხვა მანქანები	ღარი	2.240	1.10					4.00	4.41	4.41
	სრფ 1.9-2	ლურსმანი	კმ	5.33	2.62			5.00	13.11			13.11
	სრფ 4-32	ოსპზ წესტეამბლე ფანერა, სისქით 14 - 15 მმ	მ2	102.70	50.53			30.00	1515.85			1515.85
		სხვა მასალები	ღარი	10.700	5.26			4.00	21.06			21.06
9	11-27-2	ხის იატაკის მოწყობა	10082		0.492							
		შრომითი რესურსები	კაც-სთ.	85.1	41.87	4.00	167.48					167.48
		სხვა მანქანები	ღარი	4.830	2.38					4.00	9.51	9.51
	სრფ 1.9-2	ლურსმანი	კმ	23.30	11.46			5.00	57.32			57.32
	სრფ 4-109	იატაკის ფიცარი შიპით, სისქით 35-40მმ	მ2	102.97	50.66			45.00	2279.82			2279.82
	სრფ 4-73	ხის საპირები, პლინტუსები	გ.მ.		62.48			15.00	937.20			937.20
10	11-27-4	ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსით	82		40.23							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.536	21.56	4.00	86.25					86.25
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0365	1.47					4.00	5.87	5.87
	სრფ 4-88	ღამინირებული პარკეტი ac5 ა33 კლასი 10-12 მმ	მ2	1.0499	42.24			80.00	3379.15			3379.15
	სრფ 4-90	ღამინირებული მდი პლინტუსი 7 სმ	მ	1.07	43.05			10.00	430.46			430.46
	სრფ 4-85	ღამინირებული პარკეტის დრუბელი (2-3 მმ)	მ	1.05	42.24			5.00	211.21			211.21
		სხვა მასალები	ღარი	0.107	4.30			4.00	17.22			17.22
11	11-8-1,2	ბაფეზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 2088	82		2.05							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1	2.05	50.00	102.50					102.50
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0095	0.0195					4.00	0.08	0.08
	სრფ 3-349	ბეტონის ხსნარი მ100	მ3	0.0204	0.04			95.00	3.97			3.97
		ღითონის ბაფე ფ-3მმ	მ²	1.015	2.08			8.00	16.65			16.65
		სხვა მასალები	ღარი	0.0636	0.13			4.00	0.52			0.52
		3. კედლების მოწყობა										
12	10-4-1	ხის გარკასის პორიზირებული და გერტიკალური ძეგლების მოწყობა	83		1.800							
		შრომითი რესურსები	კაც-სთ.	24.0	43.20	4.00	172.80					172.80
		სხვა მანქანები	ღარი	1.300	2.34					4.00	9.36	9.36
	სრფ 4-1	ხის პორიზირებული ძეგლები	მ3	1.05	1.890			900.00	1701.00			1701.00
	საბაზო	ღითონის საპირები (კუთხე)	ც		450.00			8.00	3600.00			3600.00
		სამშენებლო კანკივი	ც		80.00			5.00	400.00			400.00
		ნაჭედი	კმ	3.080	5.544			5.00	27.72			27.72
	სრფ 3.2-7	ანტისეპტიკური ხსნარი	კმ	3.010	5.418			5.00	27.09			27.09

		სხვა მასალები	ღარი	1.380	2.484			4.00	9.94		9.94
13	10-6-2	ხის კარკასზე ფანერის მოწყობა	10082		0.84						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	19.4	16.30	4.00	65.18				65.18
		სხვა მანქანები	ღარი	1.820	1.53				4.00	6.12	6.12
	სრუ 4-32	ოსპ3 ნესტამბლე ფანერა, სისქით 14 - 15 მმ	მ2	105.00	88.20			30.00	2646.00		2646.00
	სრუ 1.9-2	ღურსმანი	კმ	3.70	3.11			5.00	15.54		15.54
		სხვა მასალები	ღარი	3.170	2.663			4.00	10.65		10.65
14	10-6-1	გარე მისახვის ხის ღამფა სისქით 18-32მმ -ბლოკპლუსი ანტისეპტიკული	10082		0.780						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	39.10	30.50	4.00	121.99				121.99
		სხვა მანქანები	ღარი	2.84	2.22				4.00	8.86	8.86
	სრუ 4-123	გარე მისახვის ღამფა სისქით 18-32მმ - ბლოკპლუსი ანტისეპტიკული	მ2	110.00	85.80			25.00	2145.00		2145.00
	სრუ 1.9-2	ღურსმანი	კმ	7.20	5.62			5.00	28.08		28.08
	სრუ 3.1-399	ორთღსაიზოლაციო მემბრანა	მ2	105.00	81.90			8.00	655.20		655.20
		სხვა მასალები	ღარი	0.55	0.429			4.00	1.72		1.72
15	11-7-3	კედლების თბოიზოლაცია ქვაბამბით, სისქით 100მმ	10082		1.400						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	27.1	37.94	4.00	151.76				151.76
		სხვა მანქანები	ღარი	2.300	3.22				4.00	12.88	12.88
	სრუ 3.2-465	ქვაბამბა, სისქით 5სმ	მ2	206.00	288.40			5.00	1442.00		1442.00
16	10-6-1	შიდა კედლების მისახვის ღამფა	10082		1.750						
		შრომის რესურსები	კაც.სთ.	39.1	68.43	4.00	273.70				273.70
		სხვა მანქანები	ღარი	2.840	4.97				4.00	19.88	19.88
	სრუ 4-114	შიდა კედლის მისახვის ღამფა -12.5 მმ სისქით	მ2	110.0	192.50			25.00	4812.50		4812.50
	სრუ 1.9-2	ღურსმანი	კმ	7.200	12.60			5.00	63.00		63.00
		სხვა მასალები	ღარი	0.550	0.96			4.00	3.85		3.85
17	გურ 5-52	გარე და შიდა დეკორატიული საპირფარეოს მოწყობა	გ.მ.		105.00						
		მუშათა ხელფასი	გრ.მ.	0.162	17.01	15.00	255.15				255.15
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0003	0.03				4.00	0.13	0.13
	სრუ 4-73	ხის საპირფარეო, კუთხოვანები	გ.მ.	1.05	110.25			10.00	1102.50		1102.50
		თვითმტკნელი ხრახნები	ცალი	2.00	210.00			5.00	1050.00		1050.00
18		გარე და შიდა ხის მოპირკეთების დამუშავება ზუმფარით და დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით	82		189.00						
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.0	189.00	4.00	756.00				756.00
		ზუმფარა	მ2	0.050	9.45			20.00	189.00		189.00
	სრუ 3.2-7	ანტისეპტიკური ლაქი	კმ	0.100	18.90			5.00	94.50		94.50
		4. ჰერისა და სახურავის მოწყობა									
19	10-11	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	83		1.860						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	23.8	44.27	4.00	177.07				177.07
		სხვა მანქანები	ღარი	2.100	3.91				4.00	15.62	15.62
	სრუ 4-1	ხის მასალა	მ3	1.05	1.953			750.00	1464.75		1464.75
	სრუ 3.2-7	საღებავი ანტისეპტიკური	კმ	1.960	3.646			5.00	18.23		18.23
	სრუ 1.9-2	ღურსმანი	კმ	7.200	13.39			5.00	66.96		66.96
		სხვა მასალები	ღარი	3.440	6.398			4.00	25.59		25.59
20	10-36-4	სახურავის შეფიცვრა	10082		0.60						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	22.7	13.62	4.00	54.48				54.48
		სხვა მანქანები	ღარი	2.760	1.66				4.00	6.62	6.62
	სრუ 1.9-2	ღურსმანი	კმ	7.00	4.20			5.00	21.00		21.00
	სრუ 4-1	ფიცვარი, სისქით 25-32მმ	მ3	3.00	1.80			750.00	1350.00		1350.00
		სხვა მასალები	ღარი	4.440	2.664			4.00	10.66		10.66
21	12-9-6	ჰერის ორთქლსაიზოლაციო შრის მოწყობა	82		49.00						
		-შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	0.160	7.84	4.00	31.36				31.36
		სხვა მანქანები	ღარი	0.003	0.16				4.00	0.63	0.63
		-სკოლი	ცალი		2.00			15.00	30.00		30.00
	სრუ 3.1-399	-ორთქლსაიზოლაციო მემბრანა	მ2	1.110	54.39			10.00	543.90		543.90
22	11-7-3	ჰერის თბოიზოლაცია, სისქით 100მმ	10082		0.49						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	27.1	13.28	4.00	53.12				53.12
		სხვა მანქანები	ღარი	2.300	1.13				4.00	4.51	4.51
	სრუ 3.2-465	ქვაბამბა, სისქით 5სმ	მ2	206.00	100.94			5.00	504.70		504.70
23	10-10-1	ჰერის მისახვის ღამფა	10082		0.480						
		შრომითი რესურსები	კაც.სთ.	23.60	11.33	4.00	45.31				45.31
		სხვა მანქანები	ღარი	2.25	1.08				4.00	4.32	4.32
	სრუ 4-114	ჰერის მისახვის ღამფა - 12.5 მმ სისქის	მ2	105.00	50.40			25.00	1260.00		1260.00
		სხვა მასალები	ღარი	1.28	0.614			4.00	2.46		2.46
24	გურ 5-52	ჰერის პლენტუსების მოწყობა	გ.მ.		59.50						
		მუშათა ხელფასი	გრ.მ.	0.162	9.64	15.00	144.59				144.59
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0003	0.02				4.00	0.07	0.07
	სრუ 4-73	ხის საპირფარეო	გ.მ.	1.05	62.48			10.00	624.75		624.75
		თვითმტკნელი ხრახნები	ცალი	2.00	119.00			5.00	595.00		595.00
25	10-38-3 კ2	ხის შეფიცვრისა და ხის ღამფის დამუშავება ზუმფარით და დაფარვა ანტისეპტიკური ხსნარით 2-ჯერ	10082		0.480						
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	8.5	4.07	4.00	16.28				16.28
		სხვა მანქანები	ღარი	0.420	0.20				4.00	0.81	0.81
		ზუმფარა	მ2	0.050	0.02			20.00	0.48		0.48
	სრუ 3.2-7	საღებავი ანტისეპტიკური	კმ	30.00	14.40			5.00	72.00		72.00
26	12-8-5	მეტალოგრაფიის სახურავის მოწყობა	82		60.90						
		შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	0.83	50.55	4.00	202.19				202.19
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0041	0.25				4.00	1.00	1.00
	სრუ 1.5-19	მეტალოგრაფიის სახურავი სისქით 0.4780 - ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან	მ2	1.17	71.25			20.00	1425.06		1425.06
		სხვა მასალები	ღარი	0.078	4.75			4.00	19.00		19.00
		5. აქსესუარების მოწყობა									
27	10-20-3	ხის კარები	მ2		9.22						

ხარჯთაღრიცხვა №1-2
წყალ-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატიული, ხარჯი		ხელფასი		მასალა		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16-24-2	პოლიპროპილენის მილები, თბოიზოლაციით (სისქე 10 მმ), გადამყვანებითა, ფიტინგებით და სამაგრებით, Ø20x2.8	გრძ.მ		24							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	143	34.32	4.00	137.28					137.28
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0257	0.6168					4.00	2.47	2.47
	სრფ 2.5-14	პოლიპროპილენის მილი ფიტინგებით, გადამყვანებით და სამაგრებით Ø20x2.8	გრძ.მ	0.929	22.296			5.00	111.48			111.48
		სხვა მასალა	ღარი	0.0457	1.0968			4.00	4.39			4.39
2	22-8-1	წყლის რეზინის მილი Ø25	გრძ.მ		650							
	სრფ 2.5-28	წყლის რეზინის მილი Ø25	გრძ.მ	1.010	656.5			5.00	3282.50			3282.50
		სხვა მასალა	ღარი	0.0006	0.39			4.00	1.56			1.56
3	17-1-10	ტრაპი თუჯის დ=100მმ	ც		1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	1.85	4.00	7.40					7.40
		სხვა მანქანა	ღარი	0.03	0.03					4.00	0.12	0.12
	სრფ 5.44	ტრაპი თუჯის დ=100მმ	ც		1.0			50.00	50.00			50.00
		სხვა მასალა	ღარი	0.18	0.18			4.00	0.72			0.72
4	17-3-4	სარკის მონტაჟი	ც		1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	0.34	4.00	1.36					1.36
	საბაზრო	სარკე ზომებით	მ2		1.0			100.00	100.00			100.00
		სხვა მასალა	ღარი	0.02	0.02			4.00	0.08			0.08
5	17-1-5	სამზარეულოს ხელსაბანი შემრევით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილებით "არკო", დრეკადი შლანგებით, სიფონით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.		1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.19	2.19	4.00	8.76					8.76
		სხვა მანქანა	ღარი	0.07	0.07					4.00	0.28	0.28
		მასალა:										
	სრფ 5.-10	სამზარეულოს ხელსაბანი შემრევით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილებით "არკო", დრეკადი შლანგებით, სიფონით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.	1	1			300.00				300.00
		სხვა მასალა	ღარი	0.37	0.37			4.00	1.48			1.48
6	17-1-5	საბაზანოს ხელსაბანი შემრევით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილებით "არკო", დრეკადი შლანგებით, სიფონით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.		2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.19	4.38	4.00	17.52					17.52
		სხვა მანქანა	ღარი	0.07	0.14					4.00	0.56	0.56
		მასალა:										
	სრფ 5.-10	საბაზანოს ხელსაბანი შემრევით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილებით "არკო", დრეკადი შლანგებით, სიფონით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.	1	2			300.00	600.00			600.00
		სხვა მასალა	ღარი	0.37	0.74			4.00	2.96			2.96
7	16-12-1	ჩამკეტი ვენტილები წყლის ტემპერატურის 0-100 C და წყნის 10 ატმ-დე სამუშაოდ, საჭირო მისაერთებელი ფიტინგებით დ=20,25მმ	ც		10							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.51	15.1	4.00	60.40					60.40
		სხვა მანქანა	ღარი	0.13	1.3					4.00	5.20	5.20
		მასალა:										
		ჩამკეტი ვენტილი DN20	ც		6			20.00	120.00			120.00
		ჩამკეტი ვენტილი DN25	ც		2			20.00	40.00			40.00
		ფოლადის მილტუჩი	ც	2	20			10.00	200.00			200.00
		ჭანტუკი ქანით	კმ	1.1	11			5.00	55.00			55.00
		სხვა მასალა	ღარი	0.07	0.7			4.00	2.80			2.80
8	17-4-4	უნიტაზი აგზით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილით "არკო", დრეკადი შლანგით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.		2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.66	7.32	4.00	29.28					29.28
		სხვა მანქანა	ღარი	0.28	0.56					4.00	2.24	2.24
	სრფ 5.1-13	უნიტაზი აგზით, სრული კომპლექტაციით (ჩამკეტი ვენტილით "არკო", დრეკადი შლანგით, სამაგრი ელემენტებით და სხვა საჭირო ფიტინგებით და მასალებით)	კომპლ.	1	2			500.00	1000.00			1000.00
		სხვა მასალა	ღარი	1.24	2.48			4.00	9.92			9.92
9	16-6-2	გოფირებული კანალიზაციის მილი დ=150 მმ მოწყობა	მ		15.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.58	8.75	4.00	34.98					34.98
	სრფ 2.5-63	გოფირებული კანალიზაციის მილი დ=150 მმ	მ	1.00	15.00			20.00	300.00			300.00
		მანქანები	მან	0.005	0.07					10.00	0.69	0.69
		სხვა მასალები	მან	0.2080	3.12			10.00	31.20			31.20
10	16-6-1	კანალიზაციის PVC მილი სქელკედლანის, ფიტინგებით, და სამაგრებით Ø50mm	გრძ.მ		5.0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	3.045	4.00	12.18					12.18

[illegible]

ხარჯთაღრიცხვა №1-3
ელ.კსელის და სუსტი დენების მოწყობის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განს. ერთ.	ნორმატიული, ხარჯი		ხედეუბი		მასალა		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8-612-10	გარდა ავტომატური ამოშრთვებით	ც		3.00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	3.37	10.11	4.00	40.44					40.44
		მანქანები	ლარი	0.095	0.285					4.00	1.14	1.14
	საბაზრო	კარდა 4 ადგილიანი გარე მონტაჟის ლითონის	ც		2.00			50.00	100.00			100.00
	საბაზრო	კარდა 6-12 ადგილიანი გარე მონტაჟის ლითონის	ც		1.00			50.00	50.00			50.00
	სრფ 7.12-63	ავტომატური ამოშრთველი 10ა 1 პოლუსა (სუსტი დენების)	ც		2			20.00	40.00			40.00
	სრფ 7.12-63	ავტომატური ამოშრთველი 16ა 1 პოლუსა (შედა განათება)	ც		3			20.00	60.00			60.00
	სრფ 7.12-63	ავტომატური ამოშრთველი MCB C 32A 1 პოლუსა (გარე განათების)	ც		4			20.00	80.00			80.00
	სრფ 7.12-64	ავტომატური ამოშრთველი MCB C 32A 1 პოლუსა	ც		6			20.00	120.00			120.00
	სრფ 7.12-69	ავტომატური ამოშრთველი MCB C 32a 2 პოლუსა (წაღლაპყენებელისთვის) გარე გარსაცმით	ც		1			20.00	20.00			20.00
	სრფ 7.12-72	ავტომატური ამოშრთველი MCB C 63a 2 პოლუსა (კორტეჯში შემოსავალი (ენერგულური))	ც		2			20.00	40.00			40.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.985	2.955			4.00	11.82			11.82
2	8-472-9	კორტეჯის დამიწების მოწყობა (დამიწების გლინულა)	მ		4.5							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	0.26	1.17	4.00	4.68					4.68
		მანქანები	ლარი	0.017	0.0765					4.00	0.31	0.31
	სრფ 1-1-20	დამიწების გლინულა 18მმ გაღლიანიზირებული	მ	1	4.5			20.00	90.00			90.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.422	1.899			4.00	7.60			7.60
3	8-472-7	კორტეჯის დამიწების მოწყობა (დამიწების ზოლფანა)	მ		6							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	0.24	1.44	4.00	5.76					5.76
		მანქანები	ლარი	0.018	0.108					4.00	0.43	0.43
	სრფ 1-6-63	ზოლფანა	მ	1	6			10.00	60.00			60.00
		განსაკუთრებით და საუფლორით	ც	1	3			0.50	1.50			1.50
		სხვა მასალა	ლარი	0.49	2.94			4.00	11.76			11.76
4	8-409-2	საილუმინაციო კაბელები	გრძმ		87.3786408							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.05	4.368932039	4.00	17.48					17.48
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0285	2.490291262					4.00	9.96	9.96
	სრფ 7.3-70	საილუმინაციო როლად ალუმინადი H2XH-FE 180 ტიპის კაბელი კეითი 3X1.5მმ2	გრძმ	1.03	90			4	360.00			360.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0027	0.23592233			4.00	0.94			0.94
5	8-409-3	საილუმინაციო კაბელები	გრძმ		813.72549							
	სრფ კ-4.60	შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.07	56.96078431	4.00	227.84					227.84
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0484	39.38431373					4.00	157.54	157.54
	სრფ 7.3-71	საილუმინაციო როლად ალუმინადი H2XH-FE 180 ტიპის კაბელი კეითი 3X2.5მმ2	გრძმ	1.02	340			4.00	1360.00			1360.00
	სრფ 7.3-72	საილუმინაციო როლად ალუმინადი H2XH-FE 180 ტიპის კაბელი კეითი 3X4 მმ2	გრძმ	1.02	490			8.00	3920.00			3920.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0035	2.848039216			4.00	11.39			11.39
6	8-409-4	ალუმინის კაბელები	გრძმ		166.6666667							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.1	16.66666667	4.00	66.67					66.67
		სხვა მანქანა	ლარი	0.063	10.5					4.00	42.00	42.00
	სრფ 7.3-48	ალუმინის კაბელი NAVY ტიპის კეითი 3X10+6 მმ2	გრძმ	1.02	170			10.00	1700.00			1700.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0049	0.816666667			4.00	3.27			3.27
7	8-417-1	გაუმანწილებელი მილი დ-16 (გვცხლგამბლე)	გრძმ		1068							
		შრომითი რესურსები	კაც/სო	0.26	277.6204074	2.00	555.24					555.24
		მეტრული რესურსი	ლარი	0.082	87.55720541			5.00	437.79			437.79
		მანქანები	ლარი	0.122	130.2680373					4.00	521.07	521.07
	სრფ 7.12-377	გაუმანწილებელი მილი დ-16 (გვცხლგამბლე)	გრძმ	1.03	1099.804			2.00	2199.61			2199.61
8	8-609-1	ლუდ პოლიკარბონის მოწყობა	ც		24							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	2.55	61.2	4.00	244.80					244.80
		სხვა მანქანა	ლარი	0.86	20.64					4.00	82.56	82.56
	საბაზრო	ლუდ პოლიკარბონული სანათი 100 გრ: IP66	ც	1	24			50.00	1200.00			1200.00
		სხვა მასალა	ლარი	2.1	50.4			4.00	201.60			201.60
9	8-599-2	შეკიდული ჭერის დიოფორი სანათი სიმბლავრე 12გრ	ც		15							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	1.54	23.1	4.00	92.40					92.40
		სხვა მანქანა	ლარი	0.29	4.35					4.00	17.40	17.40
	სრფ 7.12-217	შეკიდული ჭერის ლუდ სანათი წერტილოვანი 12გრ	ც	1	15			10.00	150.00			150.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.58	8.7			4.00	34.80			34.80
10	8-414-1	გამანაწილებელი კოლოფი გარე განათების დამონტაჟებისთვის	ც		12							
		შრომის დანახარჯები	ც	1.35	16.2	4.00	64.80					64.80
		სხვა მანქანა	ლარი	0.031	0.372					4.00	1.49	1.49
	სრფ 7.12-370	გამანაწილებელი კოლოფი გარე მონტაჟის IP 65-66	ც	1	12			20	240.00			240.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.291	3.492			4.00	13.97			13.97
11	8-414-1	გამანაწილებელი კოლოფი	ც		10							
		შრომის დანახარჯები	ც	1.35	13.5	4.00	54.00					54.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.031	0.31					4.00	1.24	1.24
	სრფ 7.12-370	გამანაწილებელი კოლოფი გარე მონტაჟის	ც	1	10			20	200.00			200.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.291	2.910			4.00	11.64			11.64
12	8-418-1	პლასტმასის საკაბელო არხი 16-168მ. სამაგრი. სუსტი დენებისთვის	გრძმ		70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.15	10.50	4.00	42.00					42.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0017	0.12					4.00	0.48	0.48
		მასალა										
	სრფ 7.12-392	საკაბელო არხი 16-168მ. სამაგრი.	გრძმ	1	70.00			2.00	140.00			140.00

		სხვა მასალა	ლარი	0.0115	0.81			4.00	3.22			3.22
13	8-418-1	პლასტმასის საკაბელო არხი 16-2588. სამაგრიით.	გრძმ		60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.15	9.00	4.00	36.00					36.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0017	0.10				4.00	0.41		0.41
		მასალა:										
	სრფ 7.12-394	საკაბელო არხი 16-2588. სამაგრიით.	გრძმ	1	60.00			2.00	120.00			120.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0115	0.69			4.00	2.76			2.76
14	8-418-3	პლასტმასის საკაბელო არხი 40-2588. სამაგრიით.	გრძმ		52							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.17	8.84	4.00	35.36					35.36
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0053	0.28				4.00	1.10		1.10
		მასალა:										
	სრფ 7.12-398	საკაბელო არხი 40-2588. სამაგრიით.	გრძმ	1	52.00			2.00	104.00			104.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0379	1.97			4.00	7.88			7.88
15	21-10-1 ზამთ.	კედლის ელექტრო რადიატორი თერმოსტატით, სიმძლავრე 2 კვტ	ც		6							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	2.28	13.68	4.00	54.72					54.72
		სხვა მანქანა	ლარი	0.2	1.2				4.00	4.80		4.80
	სრფ 6-56	კედლის ელექტრო რადიატორი თერმოსტატით, სიმძლავრე 2 კვტ	ც	1	6			3.00	1800.00			1800.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.55	3.300				4.00	13.20		13.20
16	20-22-1.	გამწოვი გენტილატორი, ღ=100 მმ, ავტომატური თავსასურით	ცალი		1.0							
		შრომითი რესურსები	კაც/სო	3.800	3.800	4.00	15.20					15.20
		მანქანები	ლარი	0.080	0.080					4.00	0.32	0.32
	სრფ 6,1-6	გამწოვი გენტილატორი, ღ=100 მმ, ავტომატური თავსასურით	ცალი	1.000	1.000			50.00	50.00			50.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.66	0.660				4.00	2.64		2.64
17	8-591-3	ჩამოთვლილი ერთკლავიშანი	ც		10							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.68	6.8	4.00	27.20					27.20
		სხვა მანქანა	ლარი	0.011	0.11					4.00	0.44	0.44
	სრფ 7.12-244	ერთკლავიშანი ჩამოთვლილი 10ა. 250გ.	ც		10			10.0	100.00			100.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.103	1.030			4.00	4.12			4.12
18	საბაზრო	მანათობელი აბრა - მოცულობითი ასოები	კომპ		1			1000	1000.00			1000.00
19	8-591-8	ელექტრო რიზტი დამიწების კონტაქტით 250გ.	ც		15							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.34	5.1	4.00	20.40					20.40
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0113	0.1695					4.00	0.68	0.68
	სრფ 7.12-245	ელექტრო რიზტი 250გ.	ც	1	15			10	150.00			150.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0937	1.406			4.00	5.62			5.62
		ჯამი					1604.99		16241.13		843.36	18689.47
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	2%								324.82	324.82
		ჯამი					1604.99		16241.13		1168.18	19014.30
		ზედნაწილი ხარჯები მონტაჟზე	75%				1203.74					1203.74
		ჯამი					2808.73		16241.13		1168.18	20218.04
		გაგებიური მოცუბა	8%				224.70		1299.29		93.45	1617.44
		ჯამი					3033.42		17540.42		1261.64	21835.48
1	საბაზრო	სახანძრო/დაცვის პანელი.	ც		1							
		შრომის დანახარჯები	ც	1	1.00	4	4.00					4.00
		მასალა:										
	სრფ 8.2-3	სახანძრო/დაცვის პანელი.	ც	1	1			500.0	500.00			500.00
2	10-743-3	თბური დეტექტორი	ც		4							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	2	8.00	4.00	32.00					32.00
	სრფ 8,1-58	თბური დეტექტორი	ც	1	4.00			50	200.00			200.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.28	1.12			4.00	4.48			4.48
3	10-743-3	კეპლის დეტექტორი	ც		5							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	2	10.00	4.00	40.00					40.00
	სრფ 8,1-58	კეპლის დეტექტორი	ც	1	5.00			50	250.00			250.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.28	1.40			4.00	5.60			5.60
4	10-744-5	ხელის საგანგაშო დილაკი	ც		1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	2	2.00	4.00	8.00					8.00
	საბაზრო	ხელის საგანგაშო დილაკი	ც	1	1.00			50.0	50.00			50.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.14	0.14			4.00	0.56			0.56
5	10-744-6	სირენა	ც		2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	3	6.00	4.00	24.00					24.00
	საბაზრო	სირენა	ც	1	2.00			50	100.00			100.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.14	0.28			4.00	1.12			1.12
6	10-54-1	ინტერნეტის ოპტიკური კაბელის მოწყობა	გრძმ		1050							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.22	231.00	2.00	462.00					462.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0382	40.11					4.00	160.44	160.44
	სრფ 7,5-2	4 წვრილი ოპტიკური კაბელი	გრძმ	1	1050.00			2.00	2100.00			2100.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0658	69.09			4.00	276.36			276.36
7	8-417-1	გოფირებული მილი დ-16 ცვეცხლგამაძლე	გრძმ.		1050							
		შრომითი რესურსები	კაც/სო	0.26	273	2.00	546.00					546.00
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.082	86.1			4.00	344.40			344.40
		მანქანები	ლარი	0.122	128.1					4.00	512.40	512.40
	სრფ 8.14-354	გოფირებული მილი დ-16 ცვეცხლგამაძლე	გრძმ	1.03	1081.500			2.00	2163.00			2163.00
8	8-612-10	IP65 კარადა	ც		4							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	3.37	13.48	4.00	53.92					53.92
		მანქანები	ლარი	0.095	0.38					4.00	1.52	1.52
	სრფ 7.12-359	IP65 კარადა 350*500*190	ც		4.00			500.00	2000.00			2000.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.985	3.94			4.00	15.76			15.76
9	10-54-1	სახანძრო კაბელი	გრძმ		60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სო	0.22	13.20	4.00	52.80					52.80
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0382	2.29					4.00	9.17	9.17
	სრფ 7,6-3	სახანძრო კაბელი 4X2X0,9 მმ2	გრძმ	1	60.0			3.00	180.00			180.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.0658	3.95			4.00	15.79			15.79
		ვიდეოსამეთვალყურეო ქსელი										
1	საბაზრო	კომპიუტერის ქსელის კომუტატორი (switch) 16 პორტიანი 10/100/1000 მბ	ც		1							
		შრომის დანახარჯები	1	1.000	1	4	4.00					4.00
		მასალა:										0.00
		კომპიუტერის ქსელის კომუტატორი (switch) 16 პორტიანი	ც	1	1			500	500.00			500.00
2	საბაზრო	უწყვეტი კვების ბლოკი აკუმულიატორით UPS 480 W	კომპლ.		1							
		შრომის დანახარჯები	კომპლ.	1	1	4	4.00					4.00
		მასალა:										
	სრფ 8,1-104	უწყვეტი კვების ბლოკი აკუმულიატორით UPS 480 W	კომპლ.	1	1			200.0	200.00			200.00

[illegible]

ხარჯთაღრიცხვა №1-4
ტერიტორიის კეთილმოწყობის და დამხმარე შენობების მოწყობის სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატიული, ხარჯი		ხელფასი		მასალა		მანქანა შეკონს.შეგი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	9	10	7	8	11	12	13
კორექციის ასენიზაციის ობიექტის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები												
1	1-78-3	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ქვის მოსაწყობად ხელით	მ3		5.2							
		შრომის დანახარჯი 2.78*1.2*1.15	კაც.ბით	2.7800	14.456	4.00	57.82					57.82
2	ვზერ 1-76	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3		5.2							
		შრომის დანახარჯი 0.99*1.2*1.15	კაც.ბით	0.99	5.148	4.00	20.59					20.59
3	23-12-1	მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ქსის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1.08 ანაკრები კონსტრუქცია	მ3		0.942							
		შრომის დანახარჯი (6.42+1.97)X1.2*1.15=	კაც.ბით	12.6000	11.87	4.00	47.48					47.48
		მანქანები 0.385X1.2*1.25=	ლარი	5.0800	4.79					4.00	19.14	19.14
	სრფ 3,1-118	მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ქსის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1.08 ანაკრები კონსტრუქცია	ცალი		2.00			150.00	300.00			300.00
		სხვადასხვა მასალა	ცალი	7.01	6.60			4.00	26.41			26.41
4	23-1-3	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	მ3		1.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სით	1.78	1.78	4.00	7.12					7.12
	სრფ 3,1-246	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	მ3	1.10	1.10			15.00	16.50			16.50
	131 ა18	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	კ/სით	1.60	1.60					5.00	8.00	8.00
5	23-23	საკანალიზაციო ჰაერის თუჯის ღრუი 0700 ანაკრები რკინა/ბეტონის ფილით	მ		1.0							
		შრომის დანახარჯი 1.54*1.2*1.15=	კაც.ბით	1.5400	1.54	4.00	6.16					6.16
		მანქანები 0.09X1.2*1.25	ლარი	0.09	0.09					4.00	0.36	0.36
	სრფ 3,1-124	საკანალიზაციო ჰაერის თუჯის ღრუი 700 ანაკრები რკინა/ბეტონის ფილით 1.20X1.20	მ	1.00	1.00			350.00	350.00			350.00
გარე საბირთვობის ასენიზაციის ობიექტის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები												
1	1-78-3	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ქვის მოსაწყობად ხელით	მ3		5.2							
		შრომის დანახარჯი 2.78*1.2*1.15	კაც.ბით	2.7800	14.456	4.00	57.82					57.82
2	ვზერ 1-76	საბირთვობის მოწყობის შემდეგ უკუ ჩაყრა და ზედნეტი გრუნტის მოსწორება ტერიტორიაზე	მ3		5.2							
		შრომის დანახარჯი 0.99*1.2*1.15	კაც.ბით	0.99	5.148	4.00	20.59					20.59
3	23-12-1	მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ქსის რგოლები ზომით დ=1.5 მ, H=1.08 ანაკრები კონსტრუქცია	მ3		0.942							
		შრომის დანახარჯი (6.42+1.97)X1.2*1.15=	კაც.ბით	12.6000	11.87	4.00	47.48					47.48
		მანქანები 0.385X1.2*1.25=	ლარი	5.0800	4.79					4.00	19.14	19.14
	სრფ 3,1-118	მონოლითური რ/ბეტონის საკანალიზაციო ქსის რგოლები ზომით დ=1.0 მ, H=1.08 ანაკრები კონსტრუქცია	ცალი		2.00			150.00	300.00			300.00
		სხვადასხვა მასალა	ცალი	7.01	6.60			4.00	26.41			26.41
4	23-1-3	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	მ3		1.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სით	1.78	1.78	4.00	7.12					7.12
	სრფ 3,1-246	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	მ3	1.10	1.10			15.00	16.50			16.50
	131 ა18	ჭიშხანების საფუძვლის მოწყობა	კ/სით	1.60	1.60					5.00	8.00	8.00
5	23-23	საკანალიზაციო ჰაერის თუჯის ღრუი 0700 ანაკრები რკინა/ბეტონის ფილით	მ		1.0							
		შრომის დანახარჯი 1.54*1.2*1.15=	კაც.ბით	1.5400	1.54	4.00	6.16					6.16
		მანქანები 0.09X1.2*1.25	ლარი	0.09	0.09					4.00	0.36	0.36
	სრფ 3,1-124	საკანალიზაციო ჰაერის თუჯის ღრუი 700 ანაკრები რკინა/ბეტონის ფილით 1.20X1.20	მ	1.00	1.00			350.00	350.00			350.00
ტერიტორიაზე ბაღების საფარის მოწყობა												
1	ხნდაწ IV-2-82 1-22-9	გრუნტის მოჭრა დაბეშვება გესპაგატორით და ადგილზე მოსწორებით	მ²		750.00							
-		შრომის დანახარჯები	კაც.ბით	0.0132	9.900	4.00	39.60					39.600
-	სრფ 12-112	გესპაგატორი 0.65 მ²	მანქ.სით	0.0295	22.125					50.000	1,106.250	1,106.250
-		სხვადასხვა შეკონს.შეგი	ლარი	0.0021	1.575					4.000	6.300	6.300
-	სრფ 3,1-252	დორღი ფრანკი 20-40 მმ	მ³	0.00005	0.038			20.00	0.75			0.750
2	27-7-2	დორღ-ბაღების ფენილის მოწყობა ტკეპნით	კუბ.მ.		2,600.00							
		შრომითი რესურსები	კაც.ბით	0.15	375.00	4.00	1500.00					1,500.00
	სრფ 3,1-260	ბაღისტი	კუბ.მ.		1,800.00			9.00	16,200.00			16,200.00
	სრფ 3,1-257	დორღი ფრანკი 20-40 მმ	კუბ.მ.		700.00			20.00	14000.00			14,000.00
	სრფ 12-175	აგროტექნიკური 79 კვტ.	მ/სით	0.0216	54.00					50.00	2,700.000	2,700.00
	სრფ 12-192	საღზავი მტკეპ. თეთრი. პრესტელაზი 18ტ.	მ/სით	0.0273	68.25					50.00	3,412.500	3,412.50
	სრფ 12-201	სარწყავი მანქანა	მ/სით	0.0097	24.25					25.00	606.250	606.25
		სხვა მასალა	ლარი	0.0700	175.00			4.00	700.00			700.00
ღობის საბირთვობები												
1	1-80-3	წერტილოვანი საბირთვობისთვის გრუნტის დაბეშვება და ადგილზე მოსწორება 40X60X40 სმ	მ3	-	21.024							
		შრომის დანახარჯი	კაც.ბით	2.06	43.309	4.00	173.24					173.24
2	6-1-2	ღობის ბეტონის წერტილოვანი საბირთვობები 40X60X40 სმ (219 ცალი)	100მ3	-	0.210							
		შრომის დანახარჯი	კ/სით	450.00	94.608	4.00	378.43					378.43
		მანქანები	მან	37.00	7.779					4.00	31.12	31.12
	სრფ 3,1-351	ბეტონი 815	მ3	102.00	21.444			115.00	2466.12			2466.12
	სრფ 4,1-108	კაღების ფარი 25-40(მმ)	მ2	161.00	33.849			25.00	846.22			846.22
	სრფ 4-1	სის მასალა	კმ.მ	1.72	0.362			750.00	271.21			271.21
		სხვა მასალა	ლარი	28.00	5.887			4.00	23.55			23.55
ღობის მოწყობა												
3	1-80-3	ჭიშხანის საბირთვობისთვის გრუნტის დაბეშვება და ადგილზე მოსწორება	მ3	-	1.810							
		შრომის დანახარჯი	კაც.ბით	2.06	3.729	4.00	14.91					14.91
4	6-26-3	ჭიშხანის საბირთვობის მოწყობა	100მ3		0.020							
		შრომის დანახარჯი	კ/სით	1460	29.20	4.00	116.80					116.80
		მანქანები	მან	93	1.86					4.00	7.44	7.44
	სრფ 1,1-17	არმატურა დ-10-12 მმ ა-III	კ/სით		0.05			2500.00	135.00			135.00
	სრფ 1,1-16	არმატურა დ-8 მმ ა-I	კ/სით		0.04			2500.00	87.50			87.50
	სრფ 3,1-351	ბეტონი 815	მ3	101.5	2.03			115.00	233.45			233.45
	სრფ 4,1-108	კაღების ფარი 25-40(მმ)	მ2	288	5.76			25.00	144.00			144.00
	სრფ 4-26	ფიკარი ნიჟარული III ხარისხის სისქი 25-32 მმ	მ3	0.92	0.02			750.00	13.80			13.80

		სხვა მასალები	მან	296	592			4.00	23.68			23.68
1	9-32-12	ლითონის ტიშტების მოწყობა (კომპლექტი შედის საფეხმავლო და სამანქანო კაბი-მილკეფარტებით, ანჯამებით, საგეტებით)	ბ		0.464							
		შრომის დანახარჯები	კ/ც/სთ	53.8	24.94	4.00	99.77					99.77
	სრუ 12-40	აშწ საფეხმავლო 25ტ	ლარი	0.350	0.162				50.00	8.11		8.11
		სხვა მანქანა	ლარი	18.4	8.53				4.000	34.122		34.12
	სრუ 2.3-1	მილკეფარტი	ბ		0.380			4200.00	1596.00			1596.00
	სრუ 2.1-1	ფუადის მილი 60x102 მმ, სისქით 4 მმ	ბ		0.059			4200.00	246.20			246.20
	სრუ 1.6-49	ლითონის ფურცელი	ბ2		0.620			80.00	49.60			49.60
	სრუ 1.9-24	კანკარა, საფეხური და ქანში	კმ		7.60			5.00	38.00			38.00
	სრუ 1.9-22	ფლუქტროი	კმ	24.4	11.31			5.00	56.56			56.56
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	1.29			4.00	5.16			5.16
2	15-164-8	ლითონის ტიშტების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	ბ2		10.00							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.68	6.80	4.00	27.20					27.20
		სხვა მანქანები	მან	0.0003	0.00				4.00	0.01		0.01
	სრუ 3.2-37	საღებავი ანტიკოროზიული	კმ	0.246	2.46			10.00	24.60			24.60
	სრუ 3.2-16	ოლიფა	კმ	0.03	0.270			5.00	1.35			1.35
		სხვა მასალები	მან	0.0019	0.02			4.00	0.08			0.08
3	7-21-9	მეტალის დიშ 2.3 მ სიმაღლის დიშე (კომპლექტი: სამაგრი ბეჭდებით-შედებით, უდინგები მათუხლართით და დამჭერი აქსესუარებით-ი.ნ. პროექტი)	1008	-	4.388							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	249.00	1092.61	4.00	4370.45					4370.45
	სრუ 12-36	აშწ საფეხმავლო 10 ტ	მან	18.10	79.42				4.00	317.69		317.69
		სხვა მანქანები	ლარი	6.00	26.328				4.00	105.31		105.31
	საბაზო	მეტალის შხა დიშე (კომპლექტით-სარეკტი)	მ	100.00	438.80			50.00	21940.00			21940.00
		სხვა მასალები	ლარი	4.00	17.552			4.00	70.21			70.21
განათების მოწყობის მიწის სამუშაოები												
1	1-12-6	ტრანშეის გათხრა ექსკავატორით, მუხლუხა სფლაზე, ჩამის მოც. 0.25კმმ	ბ		41.28							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.0154	0.64	4.00	2.54					2.54
	კოდი-0916	ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	0.0726	3.00				50.00	149.846		149.85
2	1-961	გრუნტის დამუშავება ხელოთ	ბ		8.00							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	2.06	16.48	4.00	65.92					65.92
3	1-969	გრუნტის უკონაყრა	ბ		27.52							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.21	33.30	4.00	133.20					133.20
4	8-3-2	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	ბ		6.88							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.89	6.12	4.00	24.49					24.49
		მანქანები	ლარი	0.370	2.55				4.00	10.18		10.18
	სრუ 3.1-246	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	ბ	1.15	7.91			15.00	118.68			118.68
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.02	0.14			4.00	0.55			0.55
5	23-1-1	ქვიშის ბაღის მოწყობა	ბ		6.88							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.8	12.38	4.00	49.54					49.54
	სრუ 3.1-245	ქვიშა ბუნებრივი შავი	ბ	1.1	7.57			45.00	340.56			340.56
6	22-8-6	კაბელის ჩადება თხრილში	ბ		430.00							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.245	105.35	4.00	421.40					421.40
		მანქანები	ლარი	0.109	46.87				4.00	187.48		187.48
განათების სვეტების საბირკელები												
1	1-80-3	წერტილგანი საბირკელებისთვის გრუნტის დამუშავება და აღდგენა მისწორება 40X80X40 სმ	ბ3	-	1.536							
		შრომის დანახარჯი	კ/ც/სთ	2.06	3.164	4.00	12.66					12.66
2	კრ. 6-1-2	ლითონის განათების ბოძის ჩაბეტონება 40X80X40 სმ	10083	-	0.0154							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	450.00	6.912	4.00	27.65					27.65
		მანქანები	მან	37.00	0.568				4.00	2.27		2.27
	სრუ 3.1-351	ბეტონი 015	ბ3	102.00	1.567			115.00	180.17			180.17
	სრუ 4.1-108	კვადრის ფარი 40 მმ	ბ2	161.00	2.473			25.00	61.82			61.82
	სრუ 4.1	სიმაღლე III ხარ. 400მ	კმ/მ	1.72	0.026			750.00	19.81			19.81
		სხვა მასალები	ლარი	28.00	0.430			4.00	1.72			1.72
3	9-8-1	ლითონ ბოძის მონტაჟი სიმაღლით 5.08	ბ		0.452							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	9.15	4.14	4.00	16.56					16.56
	სრუ 2.3-1	კვადრული მილი 80X80X3 მმ	ბ		0.707			4200.00	2969.40			2969.40
	სრუ 1.1-7	არმირება დ-12 მმ ა-III	მ		12.00			4.00	48.00			48.00
	სრუ 1.9-22	ფლუქტროი	კმ	3.30	1.49			5.00	7.46			7.46
		მანქანები	მან	2.78	1.26				4.00	5.03		5.03
4	15-164-7	ლითონის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	ბ2		19.20							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.68	13.06	4.00	52.22					52.22
		სხვა მანქანები	მან	0.0003	0.01				4.00	0.02		0.02
	სრუ 3.2-37	საღებავი ანტიკოროზიული	კმ	0.246	0.52			10.00	5.18			5.18
	სრუ 3.2-16	ოლიფა	კმ	0.03	0.518			5.00	2.59			2.59
		სხვა მასალები	მან	0.0019	0.04			4.00	0.15			0.15
წყლის მიღის მოწყობის მიწის სამუშაოები												
1	1-12-6	ტრანშეის გათხრა ექსკავატორით, მუხლუხა სფლაზე, ჩამის მოც. 0.25კმმ	ბ		97.50							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.0154	1.50	4.00	6.01					6.01
	კოდი-0916	ექსკავატორის ექსპლუატაცია	მ/სთ	0.0726	7.08				50.00	353.925		353.93
2	1-961	გრუნტის დამუშავება ხელოთ	ბ		14.00							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	2.06	28.84	4.00	115.36					115.36
3	1-969	გრუნტის უკონაყრა	ბ		65.00							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.21	78.65	4.00	314.60					314.60
4	8-3-2	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	ბ		16.25							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.89	14.46	4.00	57.85					57.85
		მანქანები	ლარი	0.370	6.01				4.00	24.05		24.05
	სრუ 3.1-246	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	ბ	1.15	18.69			15.00	280.31			280.31
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.02	0.33			4.00	1.30			1.30
5	23-1-1	ქვიშის ბაღის მოწყობა	ბ		16.25							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	1.8	29.25	4.00	117.00					117.00
	სრუ 3.1-245	ქვიშა ბუნებრივი შავი	ბ	1.1	17.88			45.00	804.38			804.38
6	22-8-6	პლასტიკის სახმელი წყლის მიღების ჩადება თხრილში	ბ		625.00							
		შრომის ხარჯი	კ/სთ	0.245	153.13	4.00	612.50					612.50
		მანქანები	ლარი	0.109	68.13				4.00	272.50		272.50
დაცვის ჯიხურის მოწყობა												
მიწის სამუშაოები												
1	სნდაწ IV-2-82 1-22-9	გრუნტის დამუშავება აღდგენა მისწორებით	ბ		8.22							
-		შრომის დანახარჯები	კ/ც/სთ	0.0132	0.122	4.00	0.49					0.487

-	13 3.119	კლსკადრები 0,65 მ ³	მანქ/სთ.	0.0295	0.272					50.00	13.594	13.594
-		სხვადასხვა შეძენისები	ღარი	0.0021	0.019					4.000	0.077	0.077
-	სრუ 3.1-252	ღარი ფარავთა 20-40 მმ	მ ³	0.00005	0.000			20.00	0.01			0.009
1	27-7-2.	საბირველი										
		ღორღის ფენის მოწყობა	კუბ.მ.		9.22							
		შრომითი ტესურები	კაც/სთ	0.15	1.38	4.00	5.53					5.53
	სრუ 3.1-252	ღარი ფარავთა 20-40 მმ	კუბ.მ.	1.22	11.24			20.00	224.87			224.87
	სრუ 12-175	ავტორეიდერი 79 კმ/ტ.	მ/სთ	0.0216	0.20					50.00	9.953	9.95
		საეზო მტკვ. თვითმ. პრესტელაჟ 18ტ.	მ/სთ	0.0273	0.25					50.00	12.580	12.58
		სარწყავი მანქანა	მ/სთ	0.0097	0.09					25.00	2.235	2.23
		სხვა მასალა	ღარი	0.0700	0.65			4.00	2.58			2.58
2	1-118-11	ღორღის დატეხვა პეფმისატეხვით	მ³		9.22							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	0.134	1.23	4.00	4.94					4.94
		მანქანები	მანქ/სთ	0.13	1.20					50.00	59.904	59.90
		კომპრესორი	მანქ/სთ	0.065	0.60					25.00	14.976	14.98
3	6-16-8	არმირებული ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 20 სმ	მ³		3.84							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	12.1	46.46	4.00	185.86					185.86
		სხვა მანქანა	ღარი	1.1	4.22					4.000	16.896	16.90
	სრუ 3.1-354	ბეტონი B25	მ ³	1.015	3.90			220.00	857.47			857.47
	სრუ 4.1-108	კვადრის ფარი 25-40(მმ)	მ ²	1.85	7.10			25.00	177.60			177.60
	სრუ 4-26	ფიკარი ნამოვანული III ხარისხის სისქ. 25-32 მმ	მ ³	0.0761	0.29			750.00	219.17			219.17
	სრუ 1.1-7	არმირება ღმ12 A500c	ტ ^მ		0.171			2500.00	427.20			427.20
	სრუ 1.9-22	კლექტროდი	კმ	1.8	6.91			5.00	34.56			34.56
		სხვა მასალა	ღარი	0.98	3.76			4.00	15.05			15.05
		სვეტები										
1	6-12-7.	მონტაჟ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტ. B25	მ³		0.84							
		შრომითი ხარჯი	კ/სთ	19.5	16.38	4.00	65.52					65.52
		მანქანები	ღარი	3.21	2.6964					4.00	10.79	10.79
	სრუ 3.1-354	ბეტონი B25	მ ³	1.015	0.8526			220.00	187.57			187.57
	სრუ 4.1-108	კვადრის ფარი 25-40(მმ)	მ ²	2.42	2.0328			25.00	50.82			50.82
	სრუ 4-26	ფიკარი ნამოვანული III ხარისხის სისქ. 25-32 მმ	მ ³	0.0576	0.048384			750.00	36.29			36.29
	სრუ 1.9-22	კლექტროდი	კმ	2.5	2.1			5.00	10.50			10.50
	სრუ 1.1-16	A500C კლასის არმირება (ღმ8მმ)	ტ ^მ		0.026			2500.00	66.00			66.00
	სრუ 1.1-7	არმირება ღმ12 A500c	ტ ^მ		0.057			2500.00	142.40			142.40
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.6	0.504			4.00	2.02			2.02
		ფილა										
9	6-1-16.	ფილის მოწყობა 3.00 ნიშნულზე ბეტონით B25	მ³		2.88							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	1.87	5.39	4.00	21.54					21.54
		მანქანები	ღარი	0.77	2.22					4.00	8.87	8.87
	სრუ 3.1-354	ბეტონი B25	მ ³	1.015	2.92			220.00	643.10			643.10
	სრუ 1.1-7	არმირება ღმ12 A500c	ტ ^მ		0.171			2500.00	427.20			427.20
	სრუ 4.1-108	კვადრის ფარი 25-40(მმ)	მ ²	0.0754	0.22			500.00	108.58			108.58
	სრუ 4-26	ფიკარი ნამოვანული III ხარისხის სისქ. 25-32 მმ	მ ³	0.0008	0.00			750.00	1.73			1.73
		სხვა მასალა	ღარი	0.07	0.20			4.00	0.81			0.81
		I. სახურავი										
10	6-15-2.	მონტაჟ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა პარაბეტზე	მ³		0.30							
		შრომითი ხარჯი	კ/სთ	14.70	4.35	4.00	17.40					17.40
		მანქანები	ღარი	1.21	0.36					4.00	1.43	1.43
	სრუ 3.1-354	ბეტონი B25	მ ³	1.00	0.30			220.00	65.12			65.12
	სრუ 4.1-108	კვადრის ფარი 25-40(მმ)	მ ²	2.46	0.73			25.00	18.20			18.20
	სრუ 4-26	ფიკარი ნამოვანული III ხარისხის სისქ. 25-32 მმ	მ ³	0.02	0.01			750.00	5.11			5.11
	სრუ 1.1-16	A500C კლასის არმირება (ღმ8მმ-მდე)	ტ ^მ		0.06			2500.00	160.00			160.00
	სრუ 1.9-22	კლექტროდი	კმ	3.30	0.98			5.00	4.88			4.88
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.90	0.27			4.00	1.07			1.07
9	10-11	სახურავის სის კონსტრუქციების მოწყობა (ნივნივები, ორბანები, ფარები)	მ³		0.84							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	23.8	19.99	4.00	79.97					79.97
		სხვა მანქანა	მან/სთ	2.1	1.76					4.00	7.056	7.06
	სრუ 4.1	სის მასალა	მ ³	1.05	0.88			750.00	661.50			661.50
	სრუ 1.9-2	სამშენებლო ღურსისანი	კმ	7.2	6.05			5.00	30.24			30.24
		კოალი	მ ²	3.38	2.84			35.00	70.98			70.98
		მთელი გლანული	კმ	4.38	3.68			5.00	18.40			18.40
		სხვა მასალა	ღარი	3.44	2.89			4.00	11.56			11.56
10	10-36-5	მოღობრების მოწყობა	მ³		8.40							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	0.242	2.03	4.00	8.13					8.13
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.043	0.36					4.00	1.445	1.44
	სრუ 4.1	სის ფიკარი	მ ³		0.252			750.00	189.00			189.00
	სრუ 1.9-2	ღურსისანი	კმ	0.113	0.95			5.00	4.75			4.75
		სხვა მასალა	ღარი	0.0484	0.41			4.00	1.63			1.63
11	10-39-2	სის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	მ³		8.40							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	0.0997	0.84	4.00	3.35					3.35
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.003	0.03					4.00	0.101	0.10
		ანტისეპტიკური და ანტისახანძრო ხსნარი	კმ	0.0009	0.01			10.00	0.08			0.08
12	10-37-1.	სის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისახანძრო ხსნარით	კუბ.მ.		1.13							
		შრომითი ტესურები	კაც/სთ	0.870	0.987	4.00	3.95					3.95
		მანქანები	ღარი	0.130	0.147					4.00	0.59	0.59
		ხანძრისაწინააღმდეგო ხსნარი	კმ	10.060	11.408			10.00	114.08			114.08
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.100	0.113			4.00	0.45			0.45
13	12-6-3	სახურავის ბურთის მოწყობა მოთუთიბული ქარხნული შედგენილი პროფილირებული თუნუქისაგან სისქით 0.48 მმ	მ²		17.36							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	0.429	7.45	4.00	29.79					29.79
		სხვა მანქანა	მან/სთ	0.0275	0.48					4.00	1.910	1.91
	სრუ 1.5-14	მოთუთიბული პროფილირებული ქარხნული შედგენილი სისქით 0.48 მმ (ფერი დახურული და მკვეთრი)	მ ²	1.15	19.96			20.00	399.28			399.28
		ნაჭი	კმ	0.05	0.87			5.00	4.34			4.34
	სრუ 1.9-2	ღურსისანი სახურავის მოთუთიბული	ღარი	0.106	1.84			5.00	9.20			9.20
55	12-8-5 გამოყენებით	სახურავის პარაბეტის შეფუთვა თუნუქის ფენით	მ²		10.64							
		შრომითი დანახარავები	კაც/სთ	0.83	8.83	4.00	35.32					35.32
		მანქანები	ღარი	0.0041	0.04					4.00	0.17	0.17
	სრუ 1.5-12	შეღებელი თუნუქის ფურცელი სისქით 0.35 მმ	მ ²	1.05	11.17			20.00	223.44			223.44
		სხვა მასალა	ღარი	0.078	0.83			4.00	3.32			3.32
14	12-8-4.	წყალშემკრები ღარის 10088 მოწყობა	1008		0.03							
		შრომითი ტესურები	კაც/სთ	28.600	0.858	4.00	3.43					3.43
		მანქანები	ღარი	0.410	0.012					4.00	0.05	0.05
	სრუ 1.5-12	შეღებელი თუნუქის ფურცელი სისქით 0.35 მმ	მ	105.000	3.150			20.00	63.00			63.00
	სრუ 1.9-2	ღურსისანი	კმ	3.8000	0.114			5.00	0.57			0.57
		განაკვეთი	კმ	3.8000	0.114			5.00	0.57			0.57
		ნაჭი	კმ	169.000	5.070			5.00	25.35			25.35

		ბაბრი	ცალკე	პროექტი	1.000			25.00	25.00			25.00
15	12-8-4.	პლასტიკის წყალდამტარი მილის მოწყობა ღ-100	1008		0.03							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28.600	0.858	4.00	3.43					3.43
		მანქანები	ღარი	0.410	0.012						0.05	0.05
	სრუკ 1.5-12	შედგენითი თუნუქის ყურცელი სისქით 0.35 მმ	მ	105.000	3.150			20.00	63.00	4.00		63.00
	სრუკ 1.9-2	დურისსაჩი	კმ	3.8000	0.114			5.00	0.57			0.57
		მანქ.კ	კმ	3.8000	0.114			5.00	0.57			0.57
		საძვლი	კმ	169.000	5.070			5.00	25.35			25.35
		II. იტაკები										
1	11-8-1,2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4088	გ²		14.54							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	მ2	1	14.54	4.00	58.16					58.16
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0141	0.2050					4.000	0.820	0.82
	სრუკ 3-379	ცემენტის ხსნარი მ100	მ3	0.04	0.58			95.00	55.25			55.25
		სხვა მასალა	ღარი	0.0636	0.92			4.00	3.70			3.70
27	11-20-3	კერამიკური ფილების ღატება	გ²		14.54							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1.08	15.70	4.00	62.81					62.81
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0452	0.66					4.000	2.629	2.63
	სრუკ 3-219	წებო-ცემენტი	კმ	5.00	72.70			5.00	363.50			363.50
	სრუკ 3.5-1	კერამიკური ფილა	მ2	1.02	14.83			35.00	519.08			519.08
		სხვა მასალა	ღარი	0.0466	0.68			4.00	2.71			2.71
4	11-20-3	კერამიკური პლენტის მოწყობა 10 სმ სიმაღლით	გ²		1.860							
		შრომითი რესურსები	მ2	1.08	2.009	4.00	8.04					8.04
		მანქანები	ღარი	0.0452	0.084					4.00	0.34	0.34
	სრუკ 3-219	წებო-ცემენტი	კმ	6.5	12.090			5.00	60.45			60.45
	სრუკ 3.5-1	კერამიკური ფილა	კმ²	1.02	1.897			35.00	66.40			66.40
		სხვა მასალა	ღარი	0.0466	0.09			4.00	0.35			0.35
		III. კედლები										
5	15-168-10	ჭერის შედგება მაღალსართისხოვანი წყალგამუდსიური ფასადის სადგენითი 2-ჯერ	82		3.12							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.535	1.67	4.00	6.68					6.68
		სხვა მანქანა	ღარი	0.012	0.04					4.000	0.150	0.15
		ფილის ფასადის	კმ	0.370	1.15			5.00	5.77			5.77
		საბურთი ფასადის	კმ	0.150	0.47			5.00	2.34			2.34
	სრუკ 3.2-32	ფასადის სიღარიფის სადგენითი	კმ	0.630	1.97			5.00	9.83			9.83
		სხვა მასალა	ღარი	0.016	0.05			4.00	0.20			0.20
6	34-61-14	შეკრული ჭერების მოწყობა ნესტამდე არმსტრონის ფილებით (600*600)-კარკასის მოწყობით	გ²		10.92							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.27	13.87	4.00	55.47					55.47
		სხვა მანქანები	ღარი	0.0194	0.21					4.000	0.847	0.85
	სრუკ 9,4-2	არმსტრონის ნესტამდე ფილა (კომპლექტში დიფიონის საპატრებით)	კმ²	1.05	11.47			25.00	286.65			286.65
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.0518	0.57			4.00	2.26			2.26
		III. კედლები										
1	8-15-2	კედლების და პირაპერტის მოწყობა შვიტრ ზომის საკედლე ბლოკით, (39*19*19)	83		13.26							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.08	40.84	4.00	163.36					163.36
		სხვა მანქანები	ღარი	0.92	12.20					4.000	48.797	48.80
	სრუკ 3-379	ცემენტის ხსნარი მ100	კმ³	0.11	1.46			95.00	138.57			138.57
	სრუკ 3.1-37	ბლოკი 39*19*19სმ	ცალკე	65.00	861.90			1.00	861.90			861.90
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.16	2.12			4.00	8.49			8.49
43	15-52-1	შიდა კედლების ღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (კარ-ფანჯრების ფერდობების გათვალისწინებით)	გ²		52.080							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.730	38.018	4.00	152.07					152.07
		მანქანები	ღარი	0.0260	1.354					4.00	5.42	5.42
	სრუკ 3-379	ცემენტის ხსნარი მ100	კმ³.კ	0.0300	1.562			95.00	148.43			148.43
		ხსნარტუქები	მ/სთ	0.024	1.250					25.00	31.248	31.25
38	ГЭСН 15-02-037-01 54-1	კედლის დაშუშვება ფითხით	გ²		52.08							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.50	26.03	4.00	104.12					104.12
		მანქანები	ღარი	0.080	4.166					4.00	16.67	16.67
	სრუკ 3-205	დეკორატიული ცემენტი	კმ	1.60	83.33			5.00	416.64			416.64
		ფითხი	მ³	0.0270	1.41			500.00	703.08			703.08
		წებო ჰვა	კმ	0.15	7.81			5.00	39.06			39.06
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.0042	0.22			4.00	0.87			0.87
39	15-156-4	კედლების შედგება ფასადის წყალგამუდსიური სადგენითი	გ²		52.08							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	52.08	4.00	208.32					208.32
		სხვა მანქანა	ღარი	0.007	0.36					4.000	1.458	1.46
	სრუკ 3.2-32	ფასადის სიღარიფის სადგენითი	კმ	0.69	35.94			5.00	179.68			179.68
		სხვა მასალა	ღარი	0.0034	0.18			4.00	0.71			0.71
40	15-14-1	სველ წერტილის კედლის მოპირკეთება მოჭიმული ფილებით	გ²		20.720							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.7	35.22	4.00	140.90					140.90
		სხვა მანქანა	ღარი	0.02	0.41					4.000	1.658	1.66
	სრუკ 3-219	წებო-ცემენტი	კმ	5.00	103.60			5.00	518.00			518.00
	სრუკ 3.5-2	კერამიკული ფილები	მ2	1	20.72			35.00	725.20			725.20
		სხვა მასალა	ღარი	0.007	0.15			4.00	0.58			0.58
		IV. ფასადი										
43	15-52-1	გარე კედლების ღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (კარ-ფანჯრების ფერდობების გათვალისწინებით)	გ²		62.560							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.730	45.669	4.00	182.68					182.68
		მანქანები	ღარი	0.0260	1.627					4.00	6.51	6.51
	სრუკ 3-379	ცემენტის ხსნარი მ100	კმ³.კ	0.0300	1.877			95.00	178.30			178.30
		ხსნარტუქები	მ/სთ	0.024	1.501					25.00	37.536	37.54
45	15-54.	კედლზე დეკორატიული ღებვის (მიუნუნენ) მოწყობა	გ²		62.56							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.25	15.64	4.00	62.56					62.56
		მანქანები	ღარი	0.08	5.00					4.00	20.02	20.02
	სრუკ 3-205	დეკორატიული ცემენტი	კმ	1.60	100.10			5.00	500.48			500.48
	სრუკ 3.1-244	ქვიშა კვითელი	მ³	0.0048	0.30			60.00	18.02			18.02
		წებო ჰვა	კმ	0.15	9.38			5.00	46.92			46.92
		სხვა მასალები	ღარი	0.0042	0.26			4.00	1.05			1.05
47	15-156-4	ფასადის შედგება წყალმდგეი სილიკონიანი სადგენებითი	კმ.კ		62.560							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.139	8.696	4.00	34.78					34.78
		მანქანები	ღარი	0.007	0.438					4.00	1.75	1.75
	სრუკ 3.2-32	ფასადის სიღარიფის სადგენითი	კმ	0.690	43.166			5.00	215.83			215.83
		საფითხი	კმ	0.120	7.507			5.00	37.54			37.54
		საბურთი	კმ	0.1500	9.384			5.00	46.92			46.92
		სხვა ხარჯები	ღარი	0.0034	0.213			4.00	0.85			0.85
		V. კარ-ფანჯრები										
3	9-14-5	მეტალოპლასტიკის ფანჯარა ჯავისფერი პრეფილით და ერთკამერითი მიწაპატიტით	გ²		5.880							

[illegible]



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **72.04.14.909**

განცხადების ნომერი: **882022127643**


მომზადების თარიღი: **09/03/2022**

ნაკვეთის დანიშნულება:

ფართობი:

არასასოფლო საშენობო

34657 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

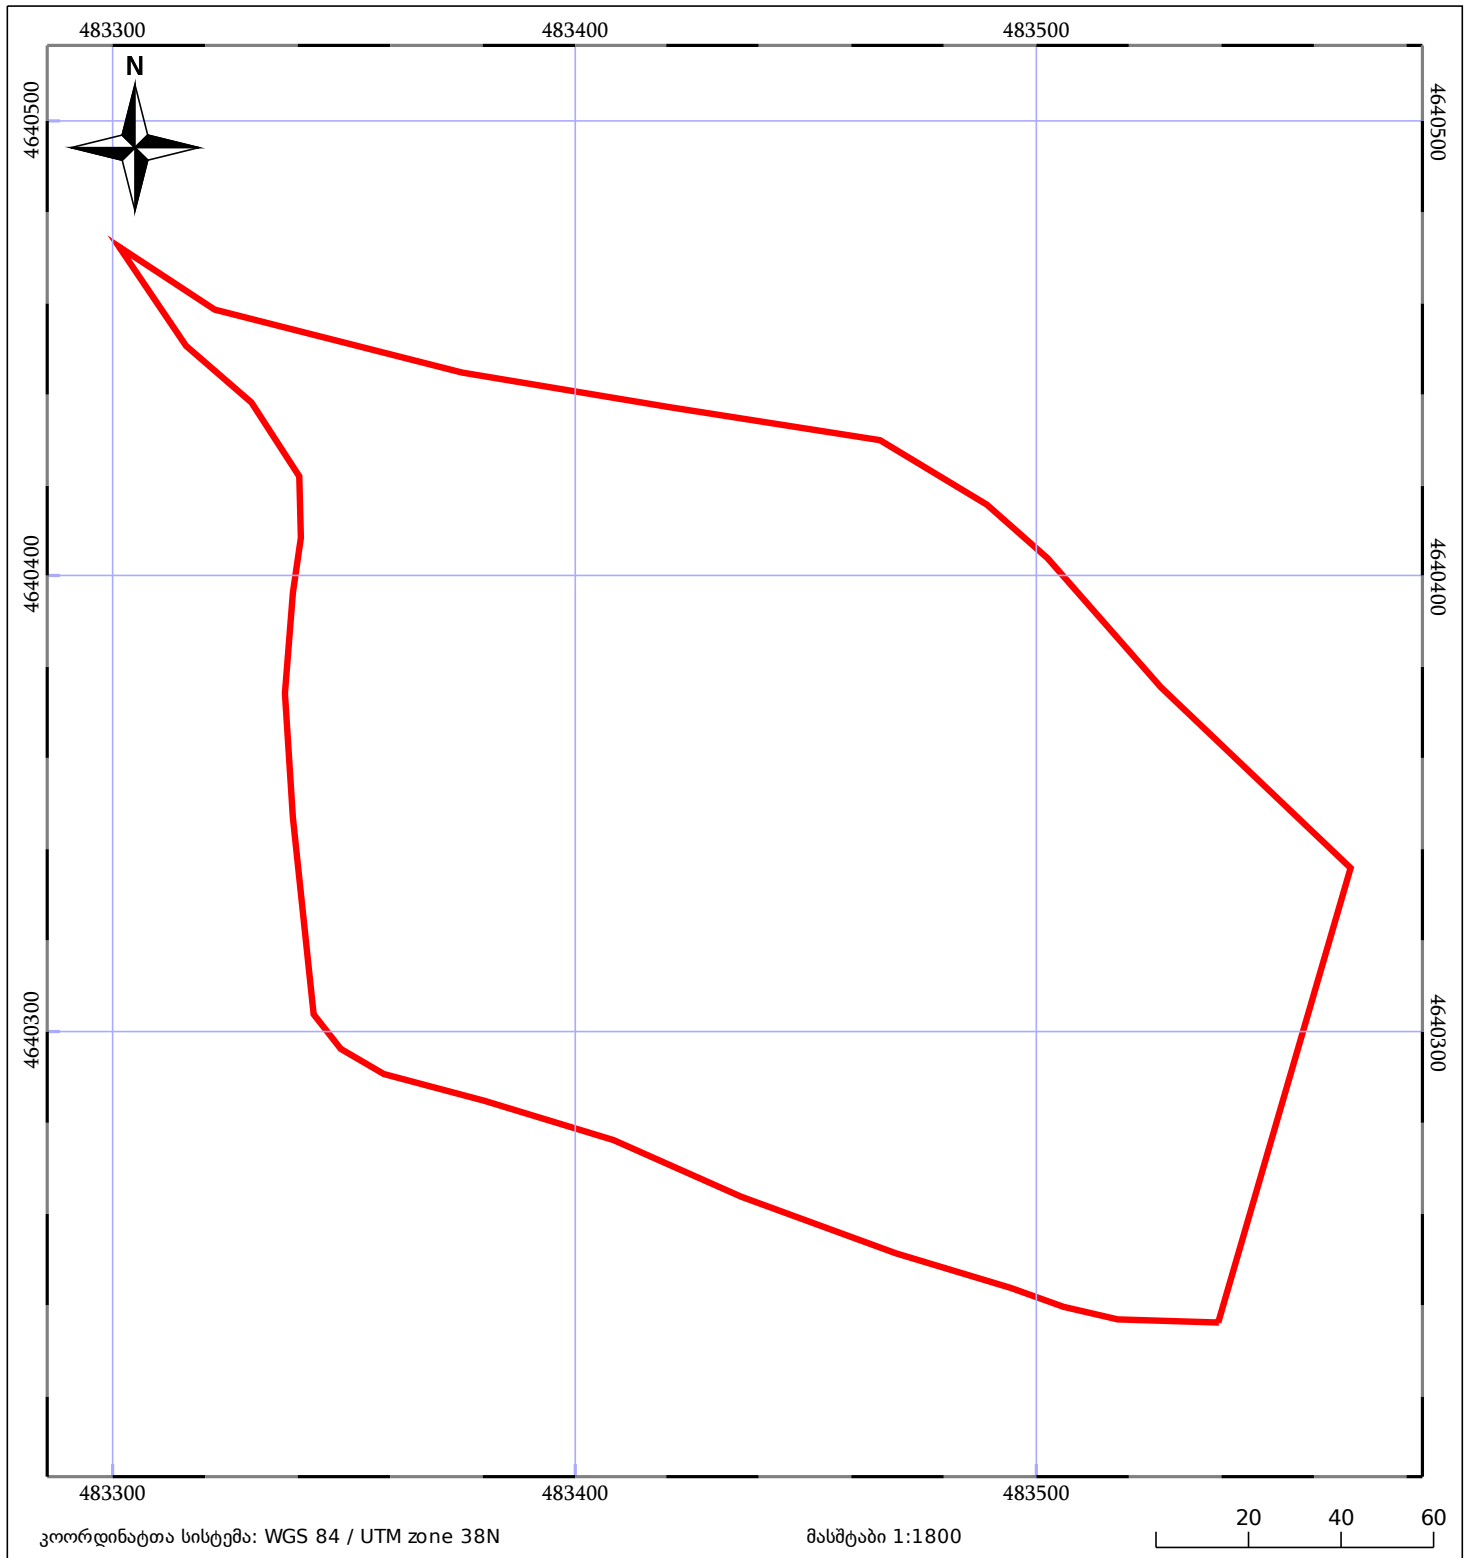

05/25 მშენებარე ნაგებობა	ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი	05/25 შენობა/ნაგებობა
საზოგადოებრივი ნაგებობა	ტყის ფონდი	ვალდებულება



ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882022127643 - 22/02/2022 19:00:52

მომზადების თარიღი
09/03/2022 13:26:36

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
მცხეთა	გალავანი			ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
72	04	14	909	დაზუსტებული ფართობი: 34657.00 კვ.მ.
მისამართი: მუნიციპალიტეტი მცხეთა, სოფელი ჯილაურა				ნაკვეთის წინა ნომერი:

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882022127643 , თარიღი 22/02/2022 19:00:52
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 09/03/2022

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- გადაწყვეტილება N35287 , დამოწმების თარიღი: 28/02/2022 , საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- ბრძანება N1/1-3347 , დამოწმების თარიღი: 08/08/2019 , სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"

მესაკუთრეები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახლო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882022103492
თარიღი 14/02/2022
12:29:30

უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
14/02/2022

მოსარგებლე: სსიპ ეროვნული საგანგებო 204578581;

საგანი: დაზუსტებული ფართობი: 34657.00 კვ.მ. ;

ვადა: 20 წელი;

წერილი, რეგისტრის ნომერი N11/5772, დამოწმების თარიღი 04/02/2022, სსიპ სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო

ვაღიძურებ

ყალბად/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოგალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვაღიძურებების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში გეგმიური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეაესეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგეწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge


არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა




არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა



ორთოფობო

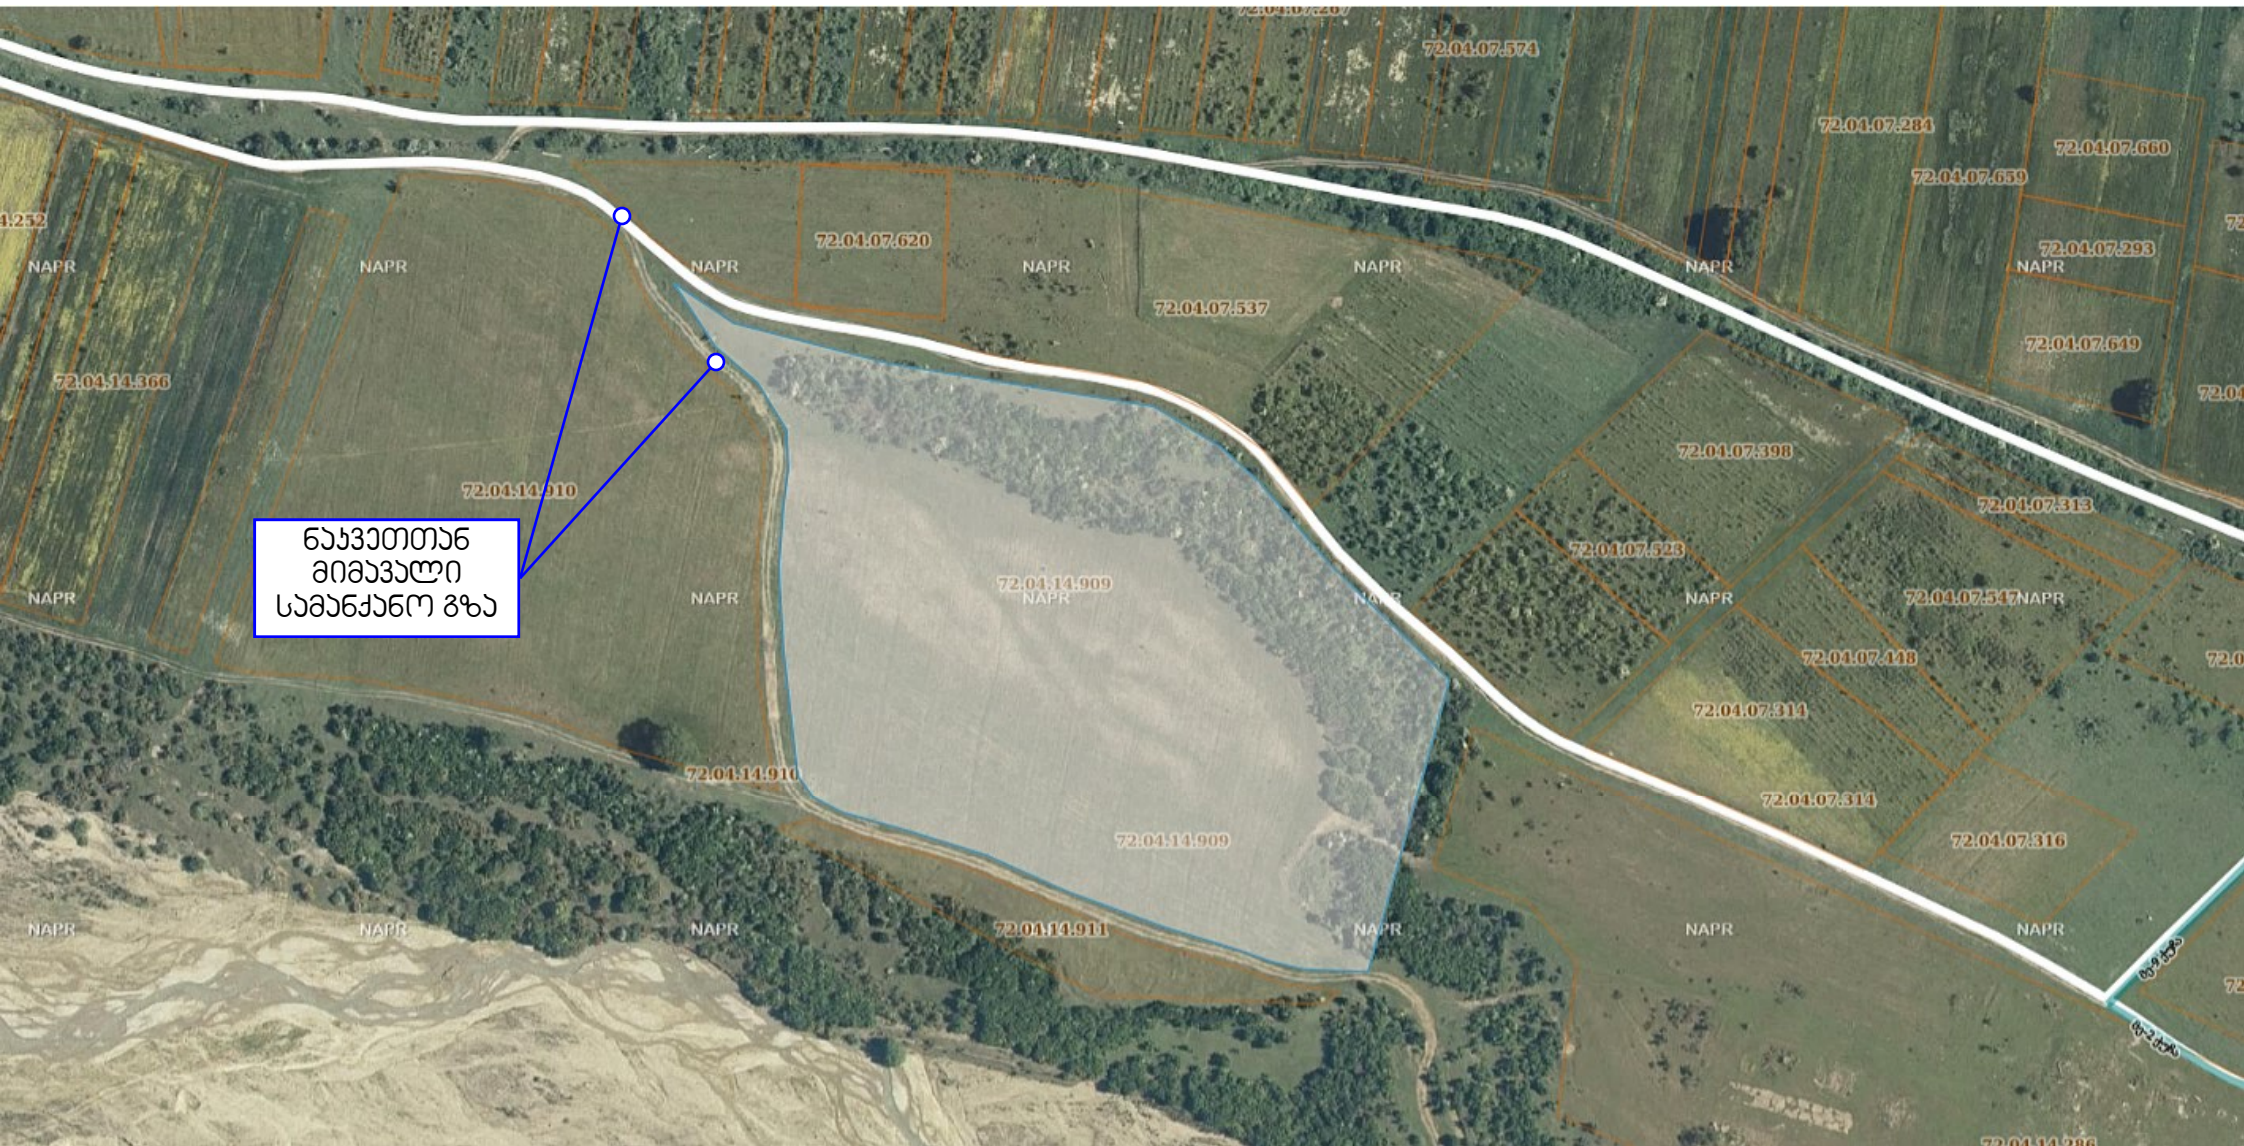

სიტუაციური ნახაზი
რაიონი მცხეთა, სოფელი ჯილაურა
ს/პ 72.04.14.909

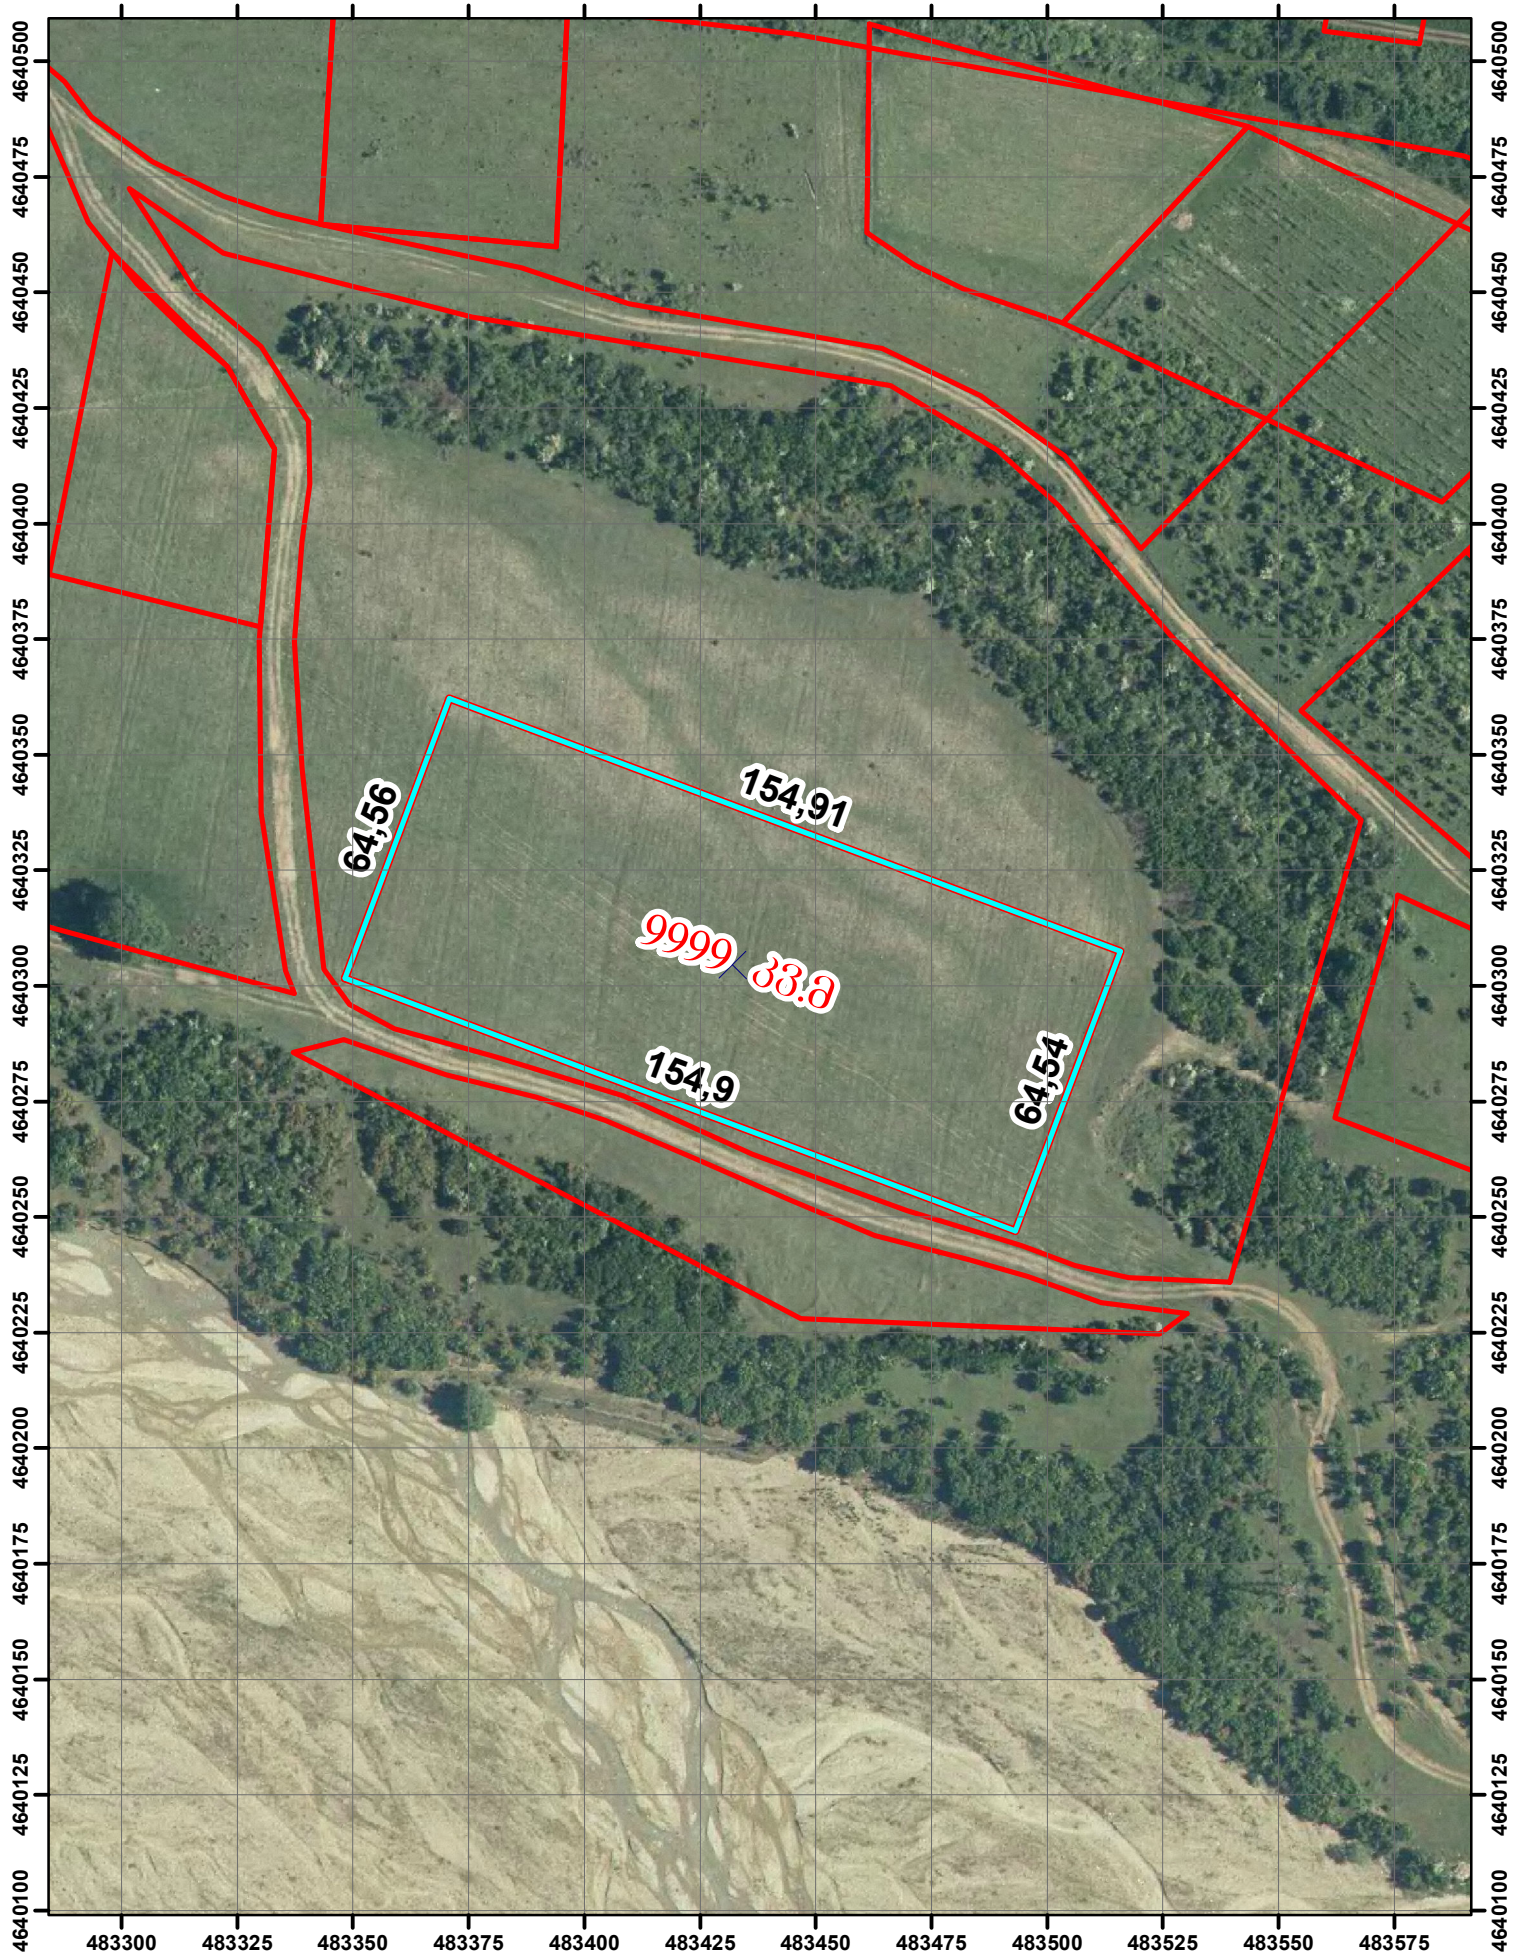

ორთოქობო სავროქობო სავუბოქობო დობონო




დავების ჯიხურო




ხობაჯის მოწყობის საპროექტო გეგმა

მ 1:100

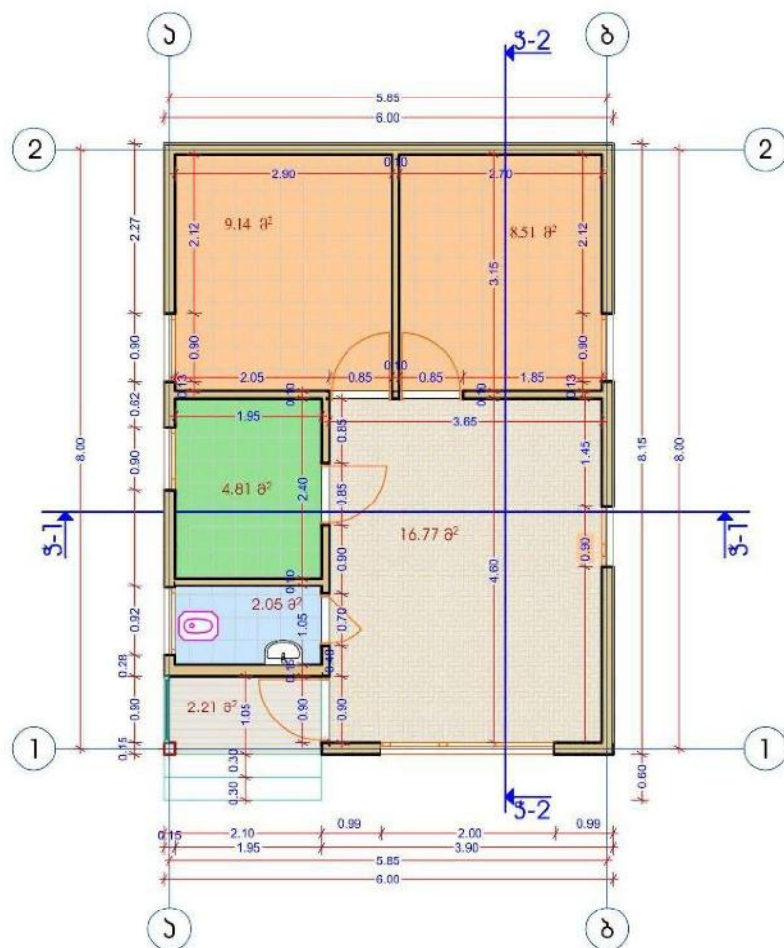


ხობაჯის მოწყობის სახურავის გეგმა

მ 1:100

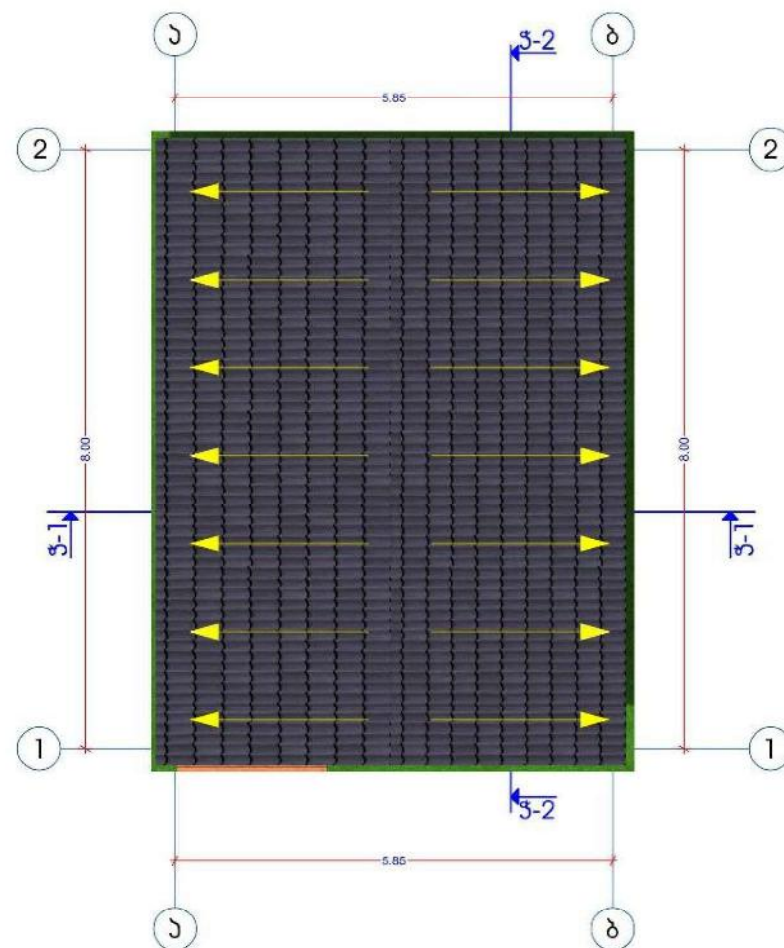


ა-ბ ფასადი
მ 1:100

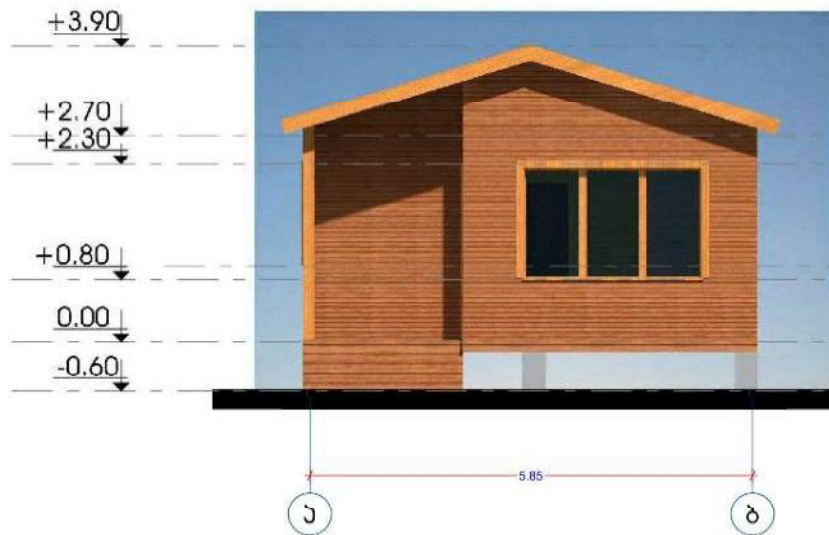

1-2 ფასადი
მ 1:100



ა-ბ ფასადი
მ 1:100

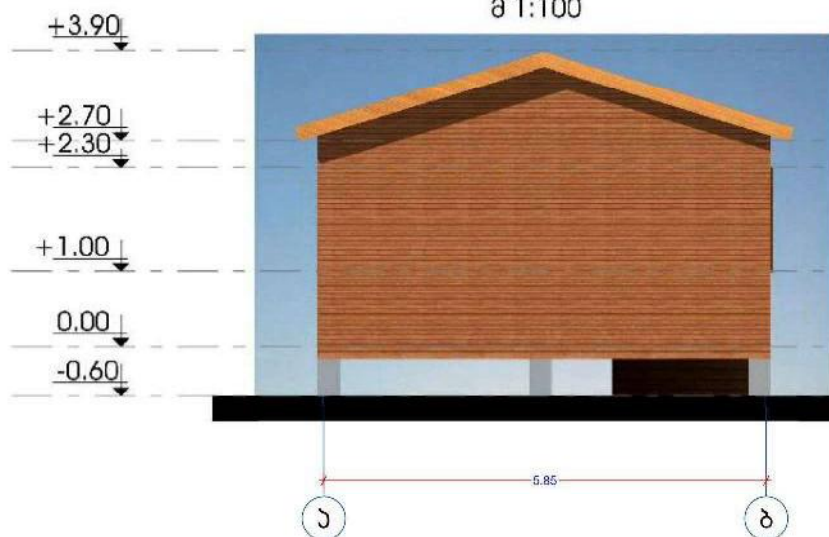


2-1 ფასადი
მ 1:100




ჭრილი 1-1
მ 1:100


ჭრილი 2-2
მ 1:100

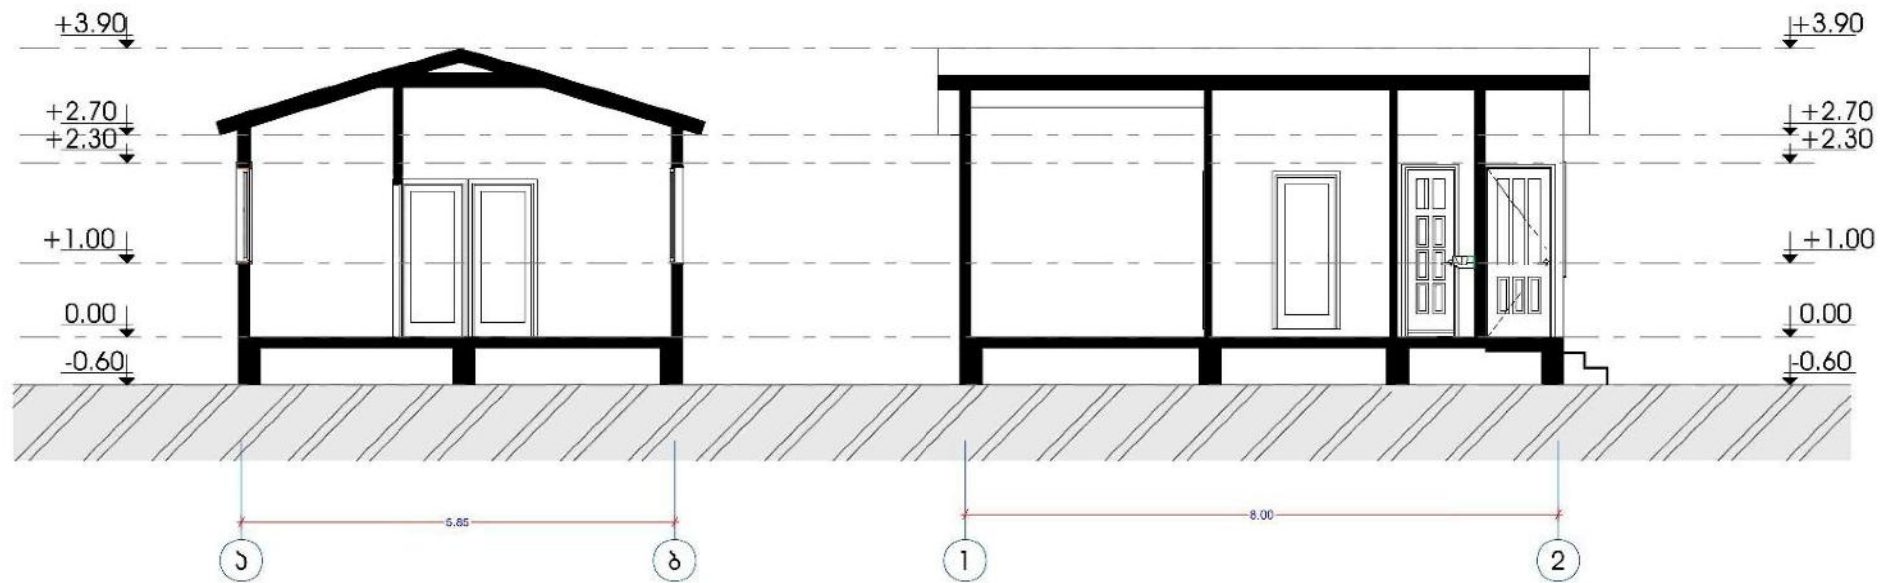

საძირკვლის გეგმა

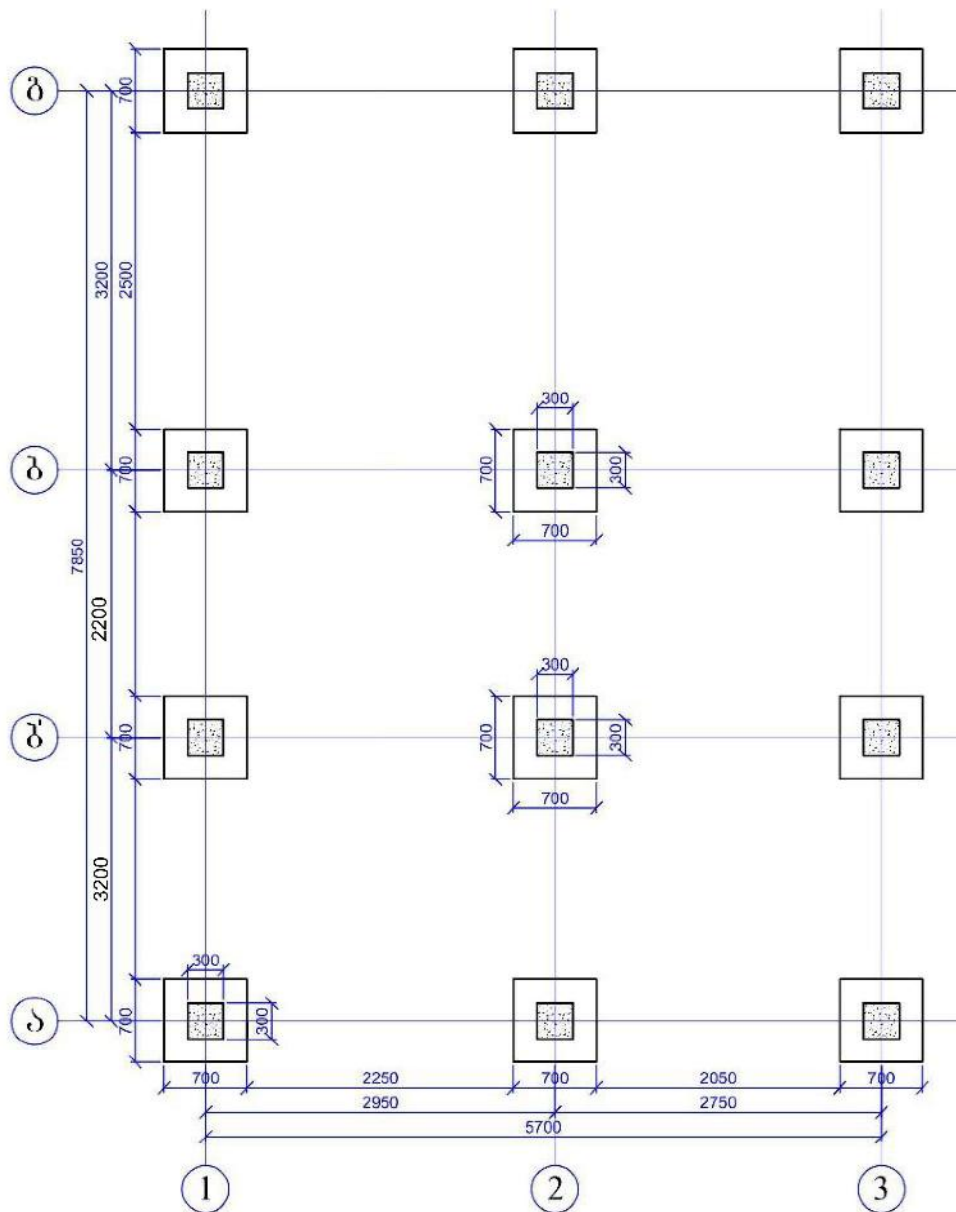


ფარბილოვანი საძირკვლის
მოწყობის სქემა

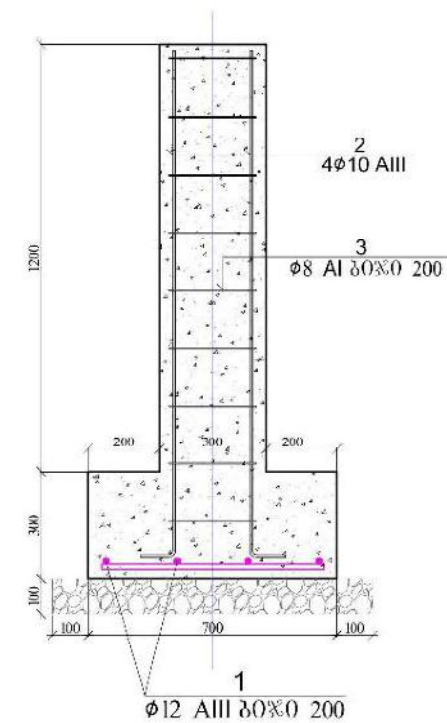


პოზ.	აღნიშვნა	მასალა	ტოლ.	წილი, კვ	
	ფარბილოვანი საძირკვლის		12	ცაფი	
	ფარბილოვანი			მომცემი (კვ)	სულ (კვ)
1	Ø 12 A 500c	ℓ= 650	8	4.62	55.44
2	Ø 10 A 500c	ℓ= 1600	4	3.95	47.4
3	Ø 8 A c-I	ℓ= 1200	9	4.27	51.24
				მომცემი (მ³)	სულ (მ³)
	ბეტონი B25			0.2550	3.06
	გრუნტის მოვლა			0.8910	10.68
	ლორწის ფენა			0.0810	0.972
	გრუნტის შენახვა			0.5550	6.67


ხის კარკასის გეგმის გეგმა 0.00 ნიშნულზე

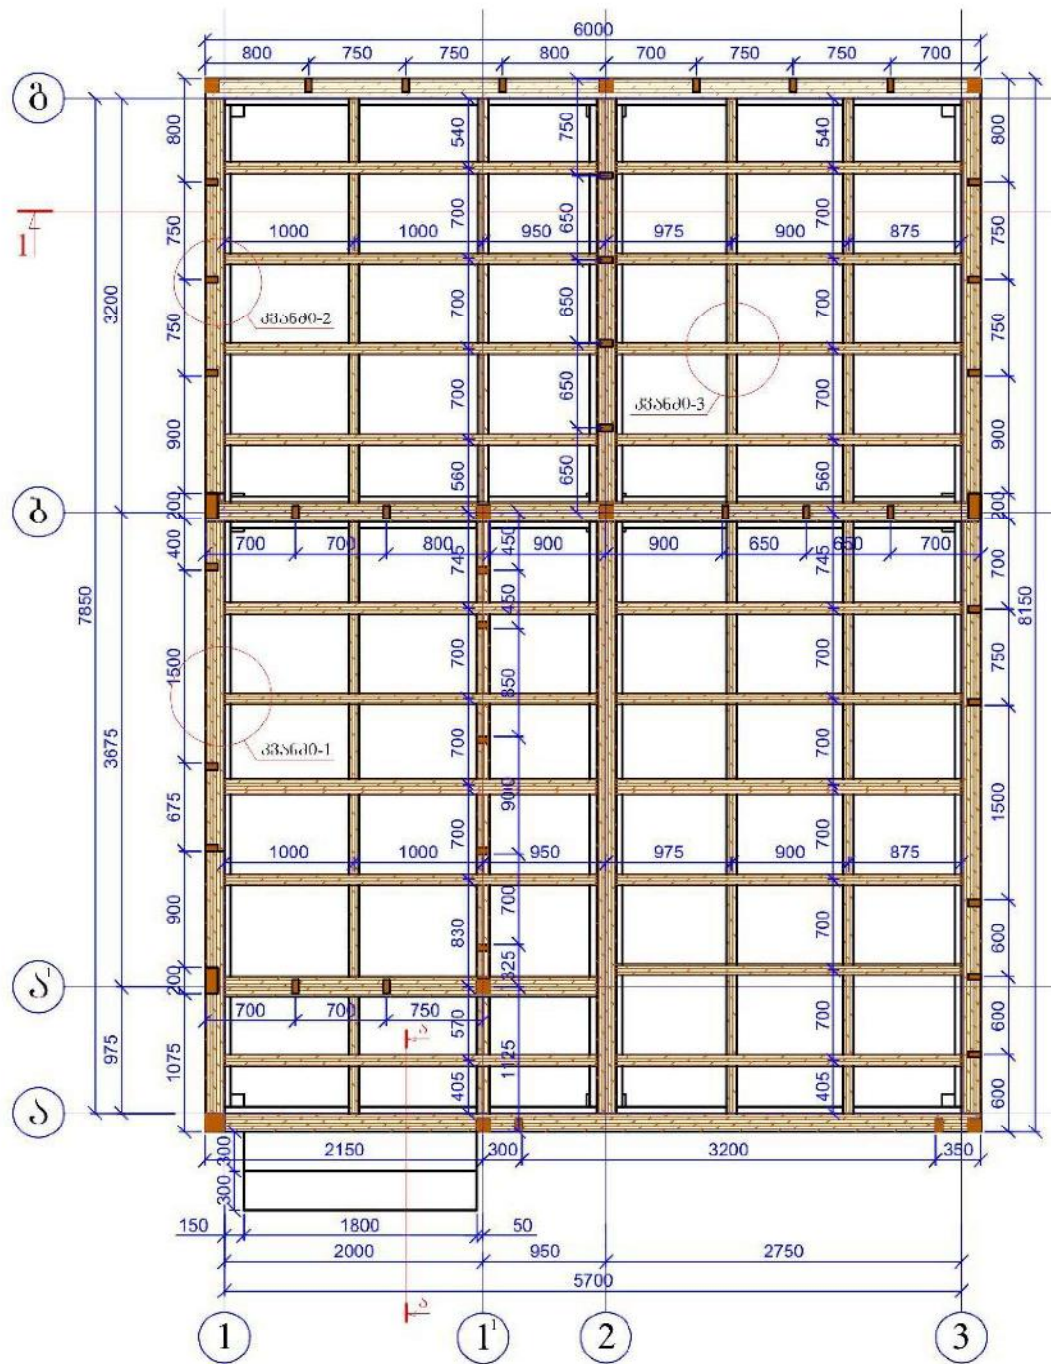


სახეობის გეგმა

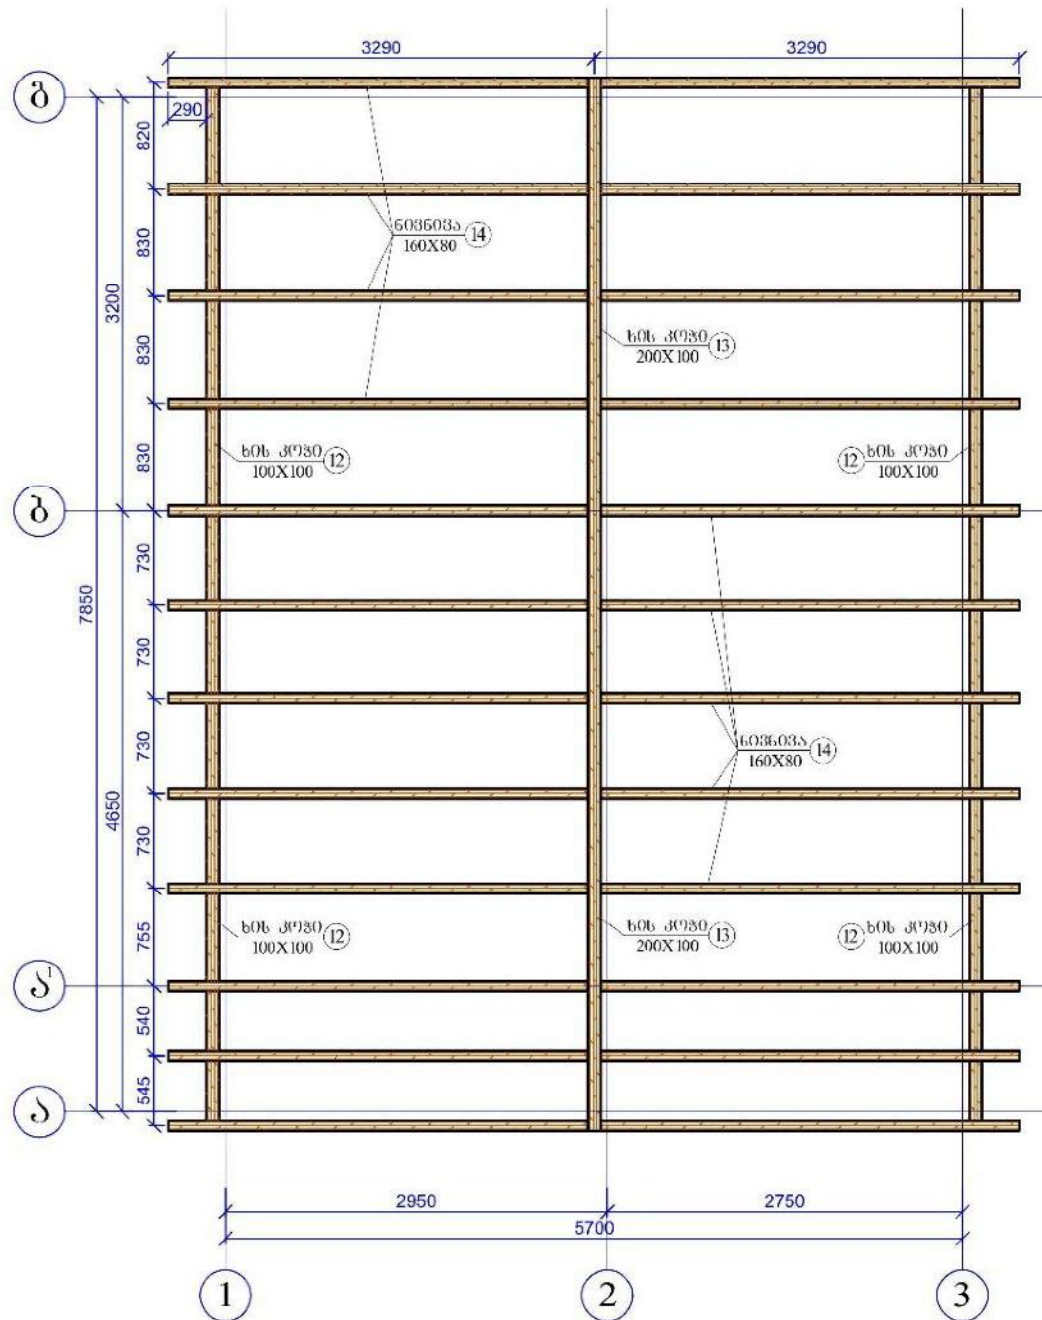


ჭრილი „3“ ღერძზე

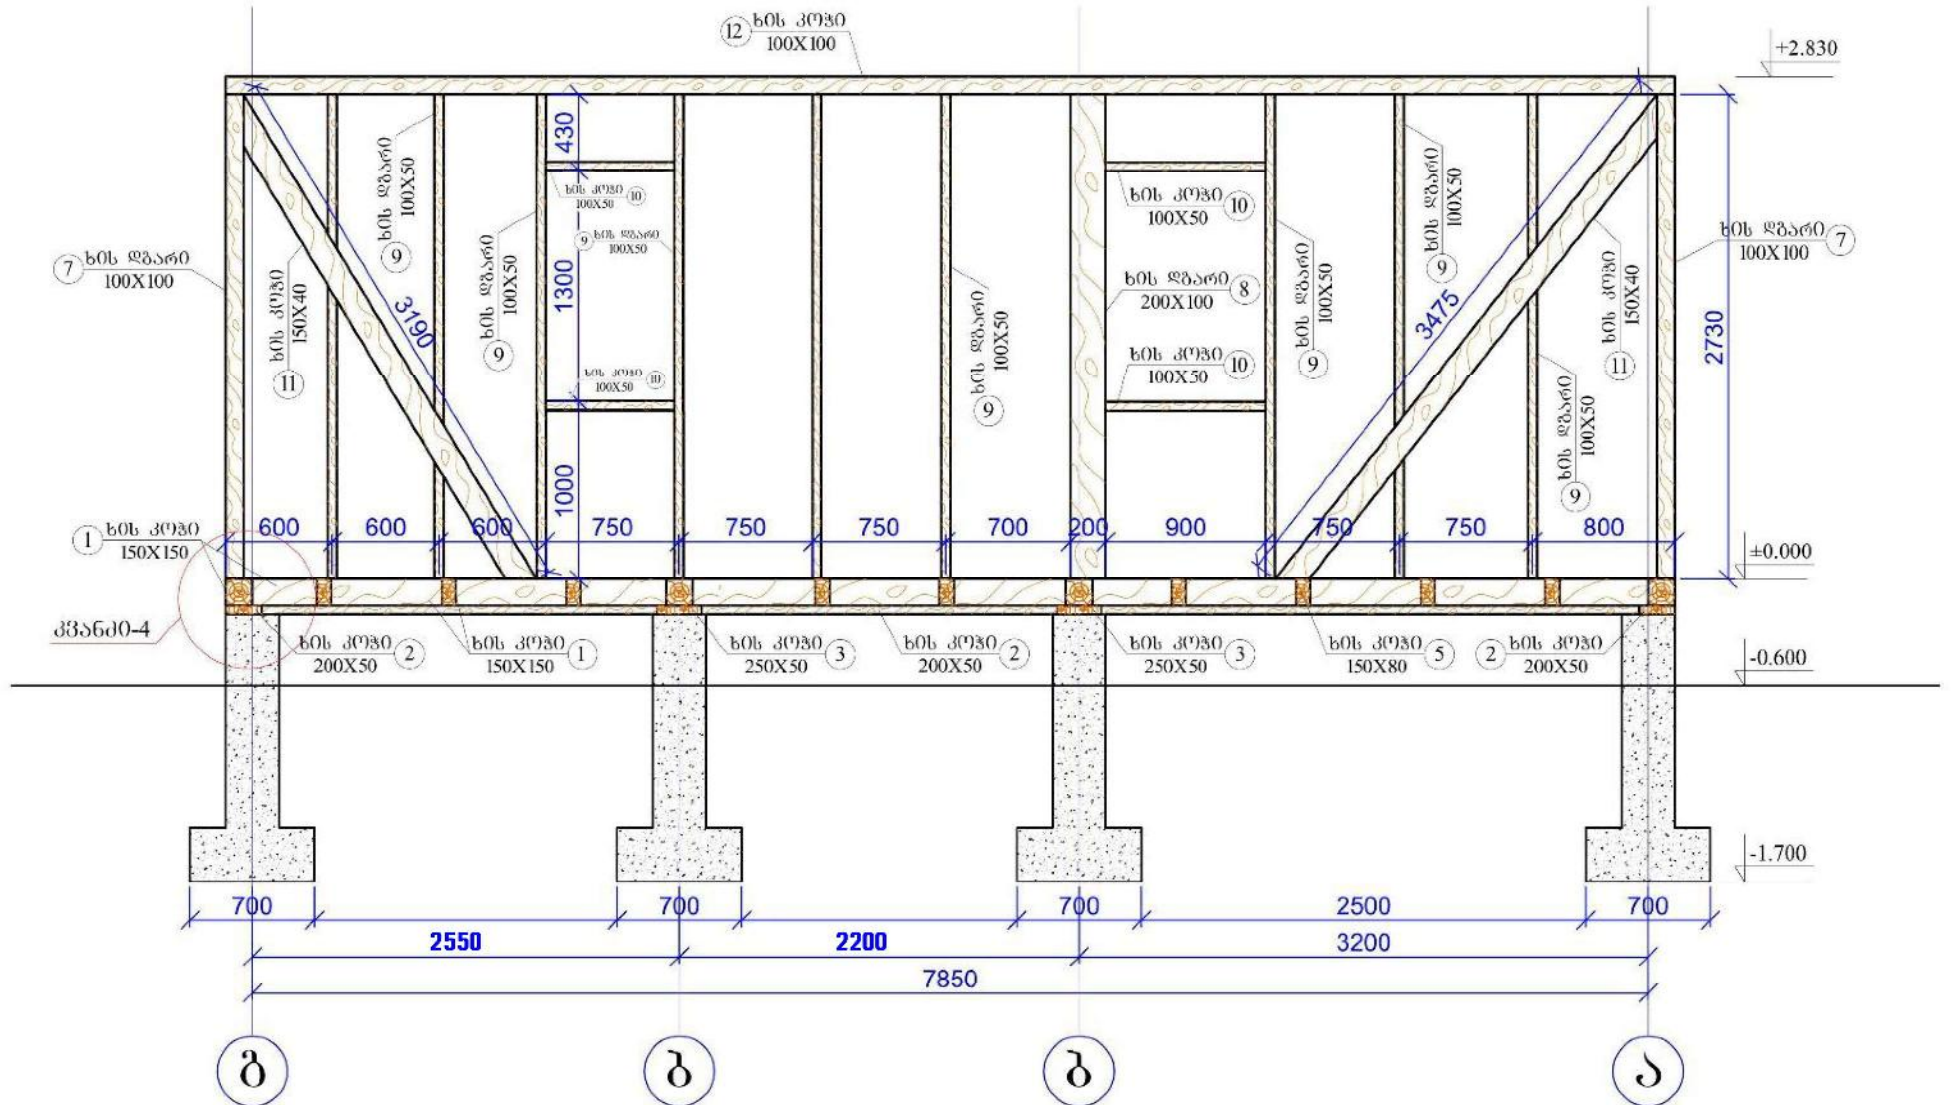

ჭრილი „1“ ღერძზე

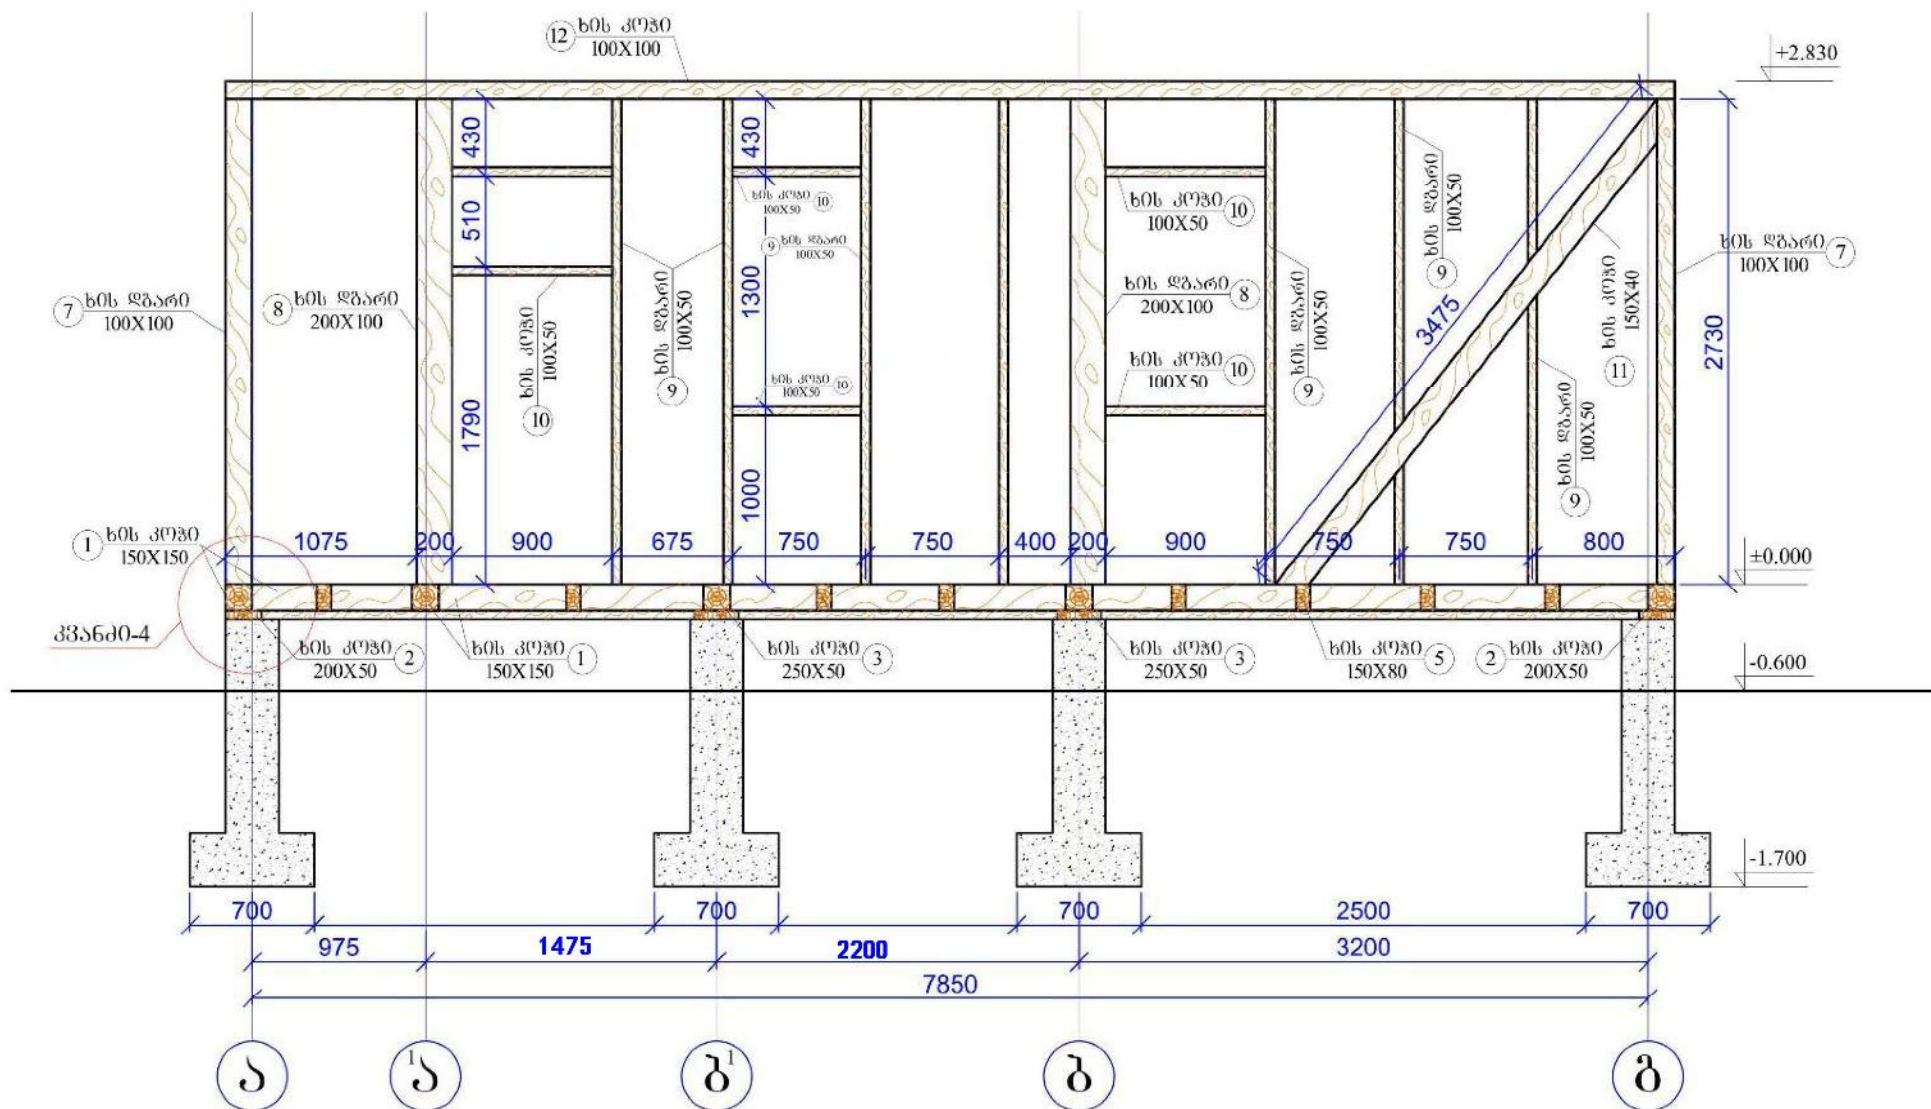


§6020 1 - 1

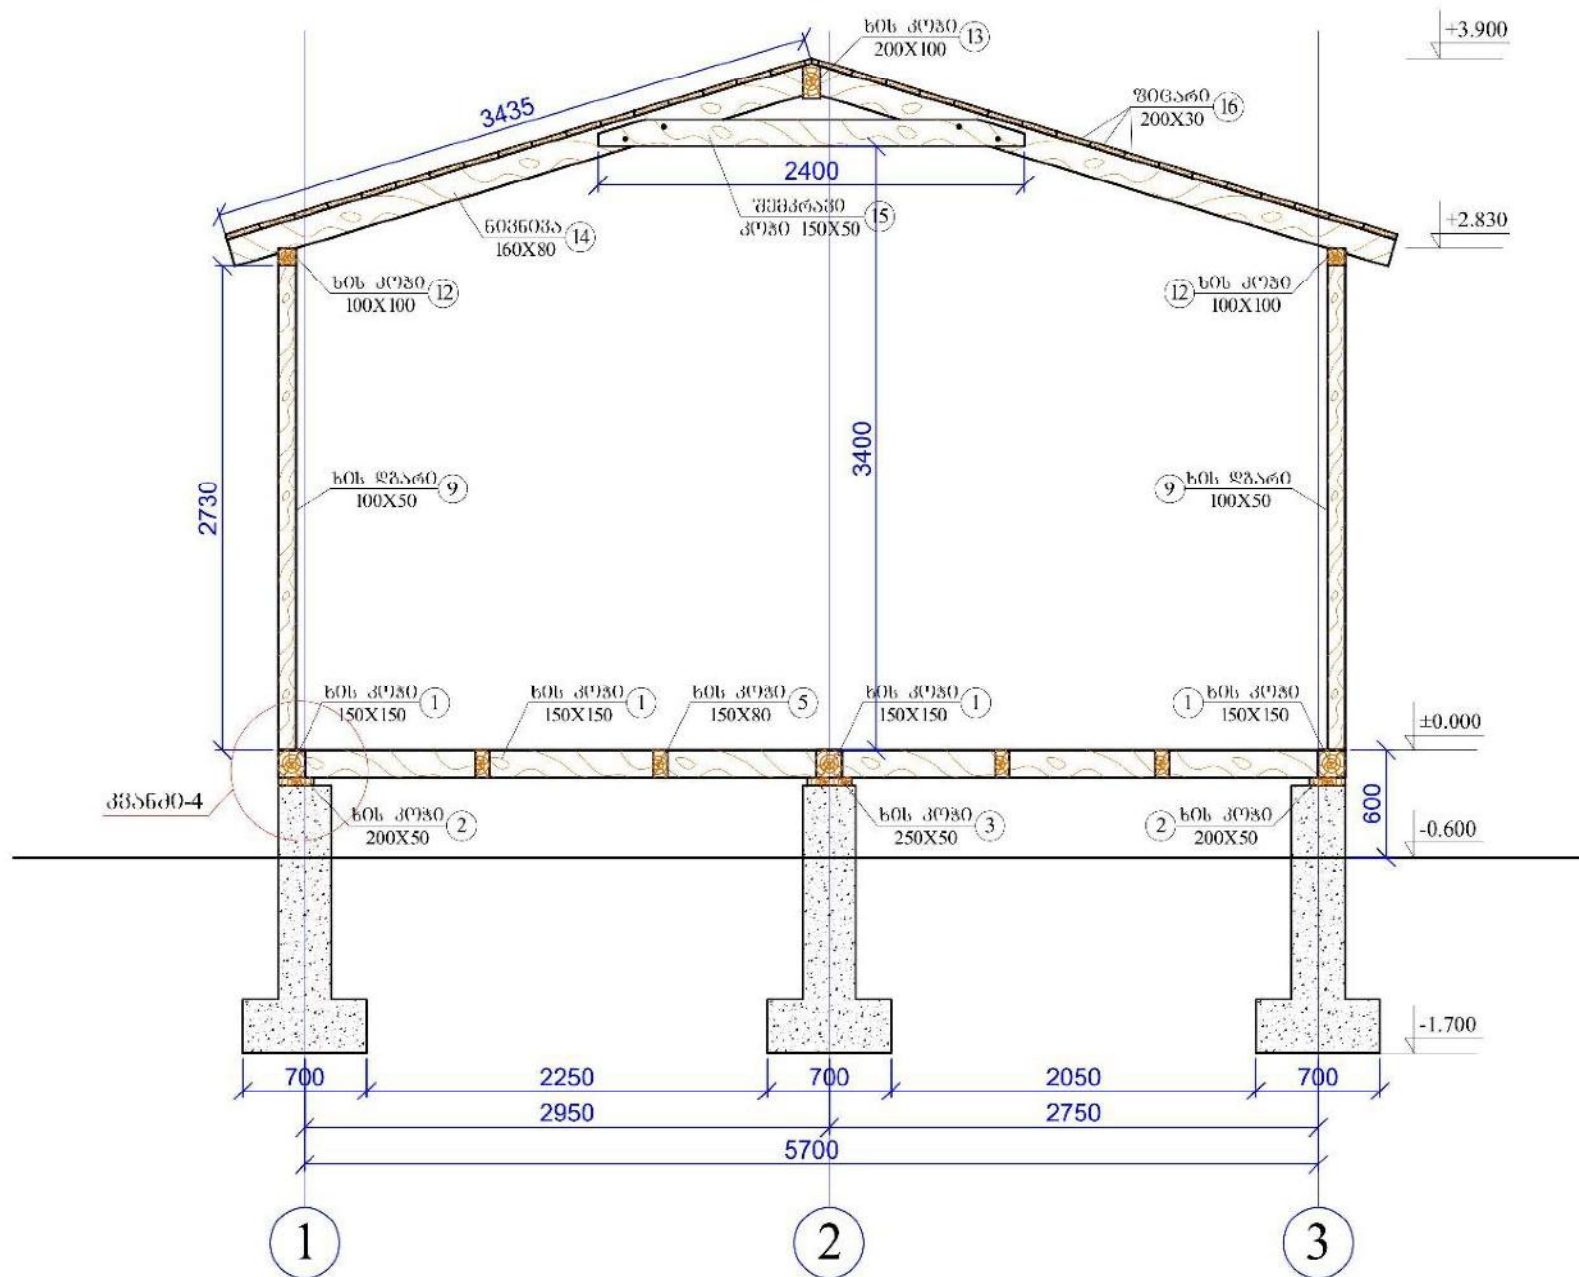


Architectural cross-section drawing of a building with a gabled roof. The drawing shows structural elements like rafters, beams, and columns, along with their dimensions and material specifications. Key dimensions include a total width of 5700mm, a total height of 3400mm, and a roof slope of 3435. Material specifications are given in Georgian, such as 'ბოლ ჰოვბო 100X100' for timber beams and 'ბოლ ჯგაბო 100X100' for timber columns. The drawing also indicates floor levels: +3.900, +2.830, ±0.000, and -1.700.

პროექტი „ბ“ ფერმა

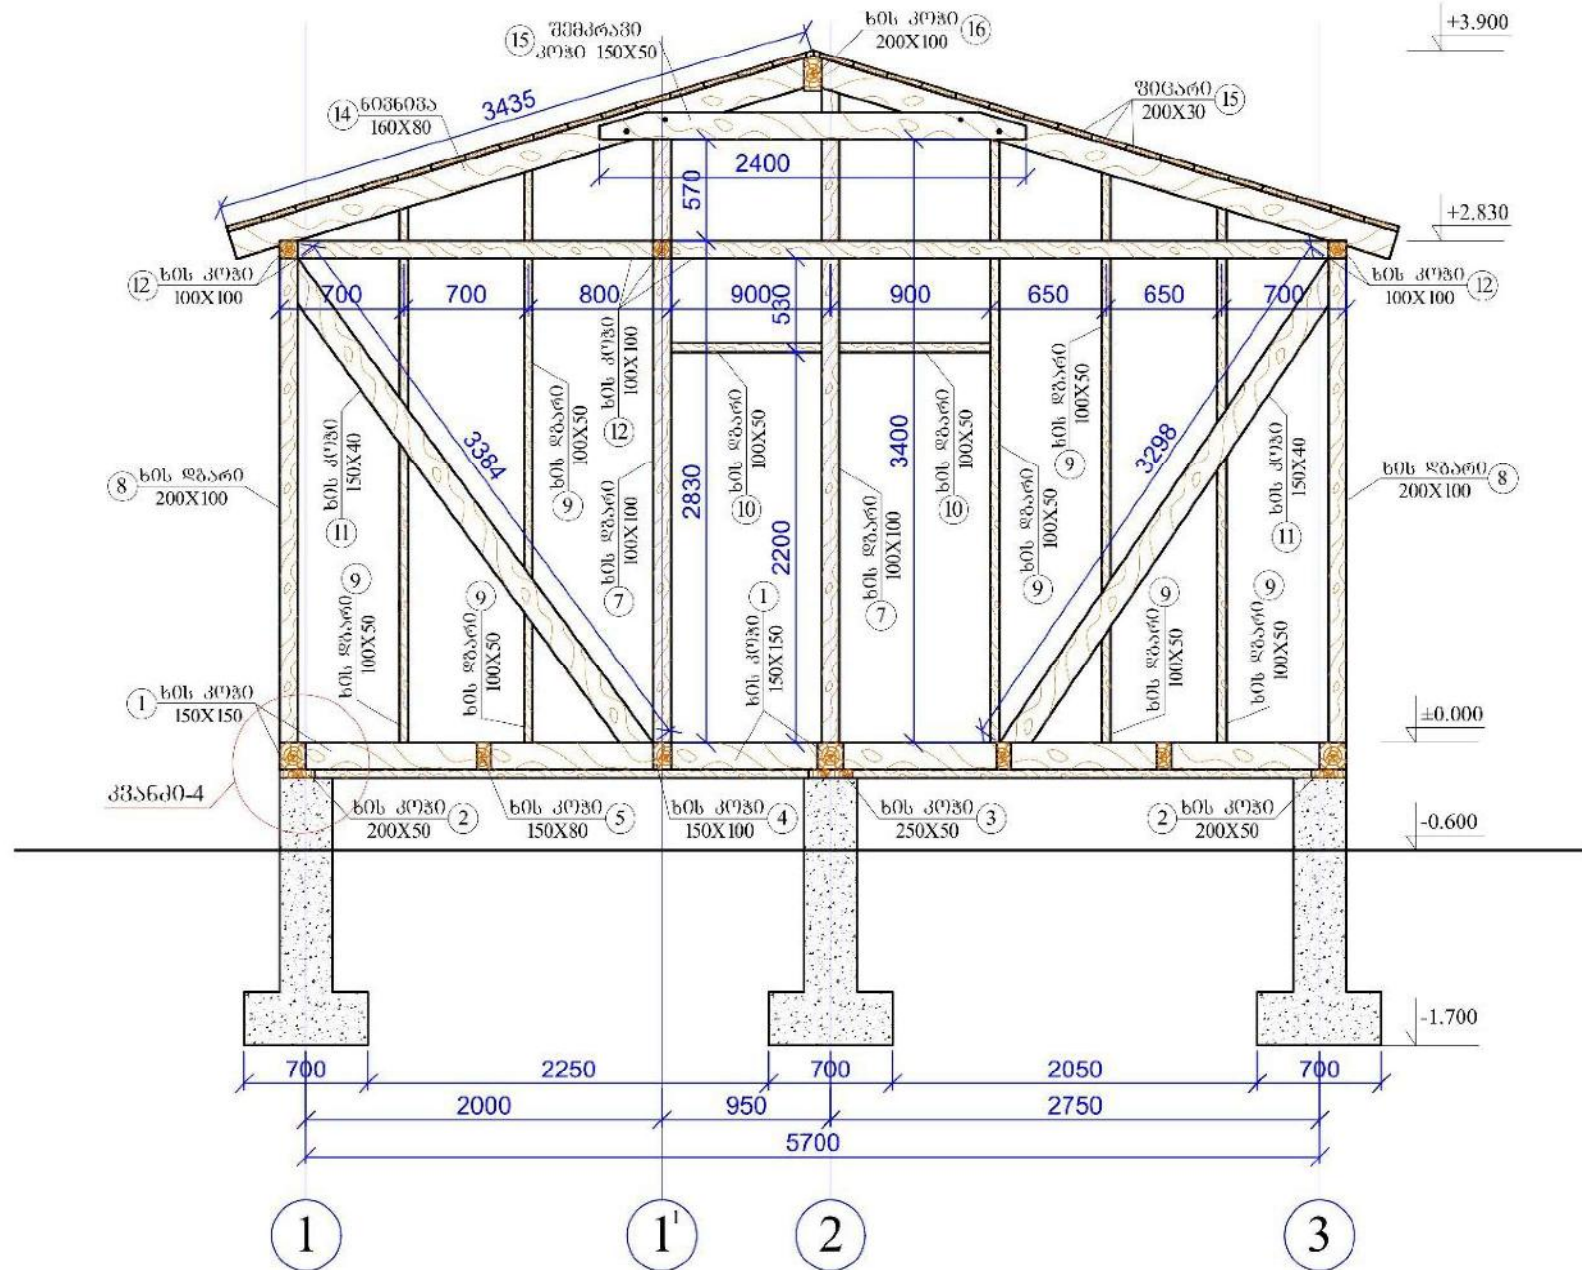


[illegible]


ჭრილი „1“ ღერძზე

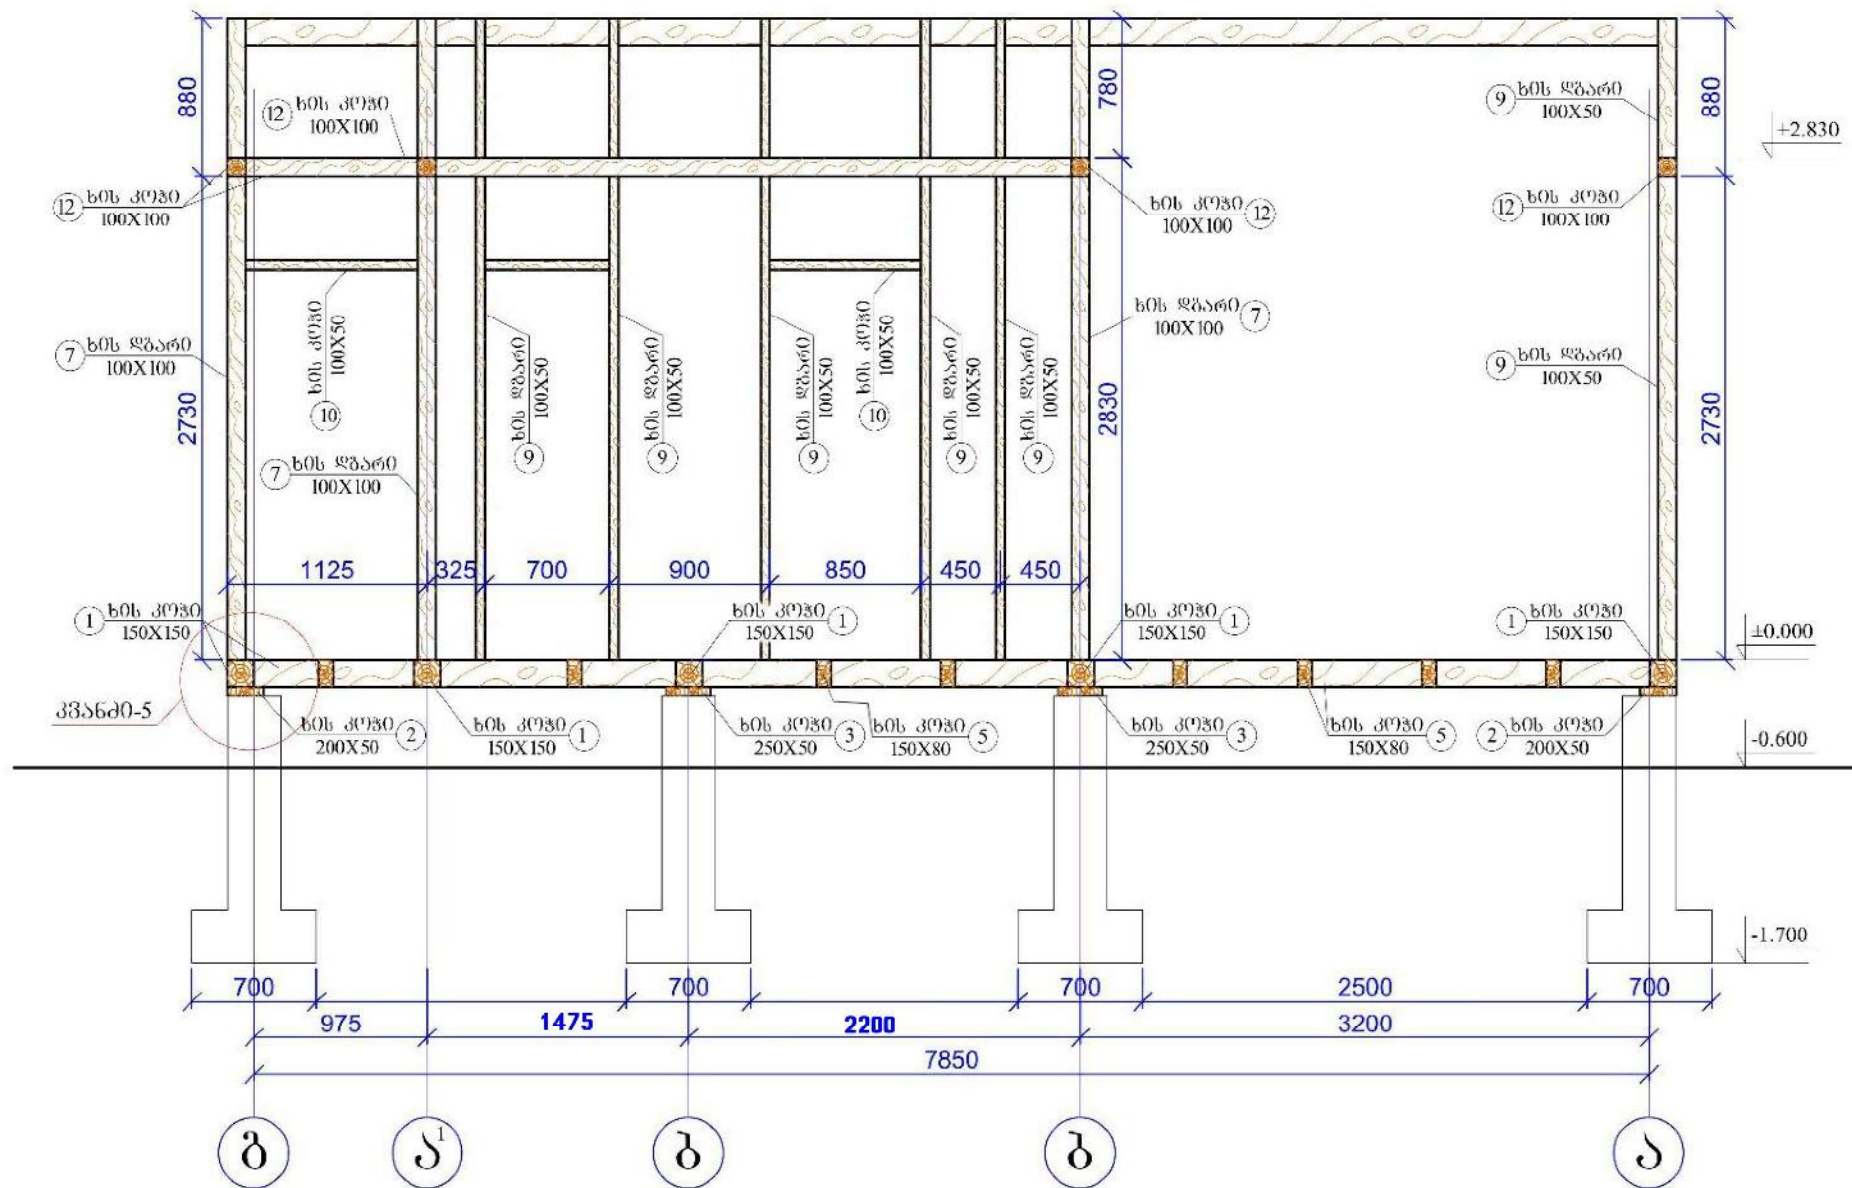


ჭრილი „2“ ღერძზე

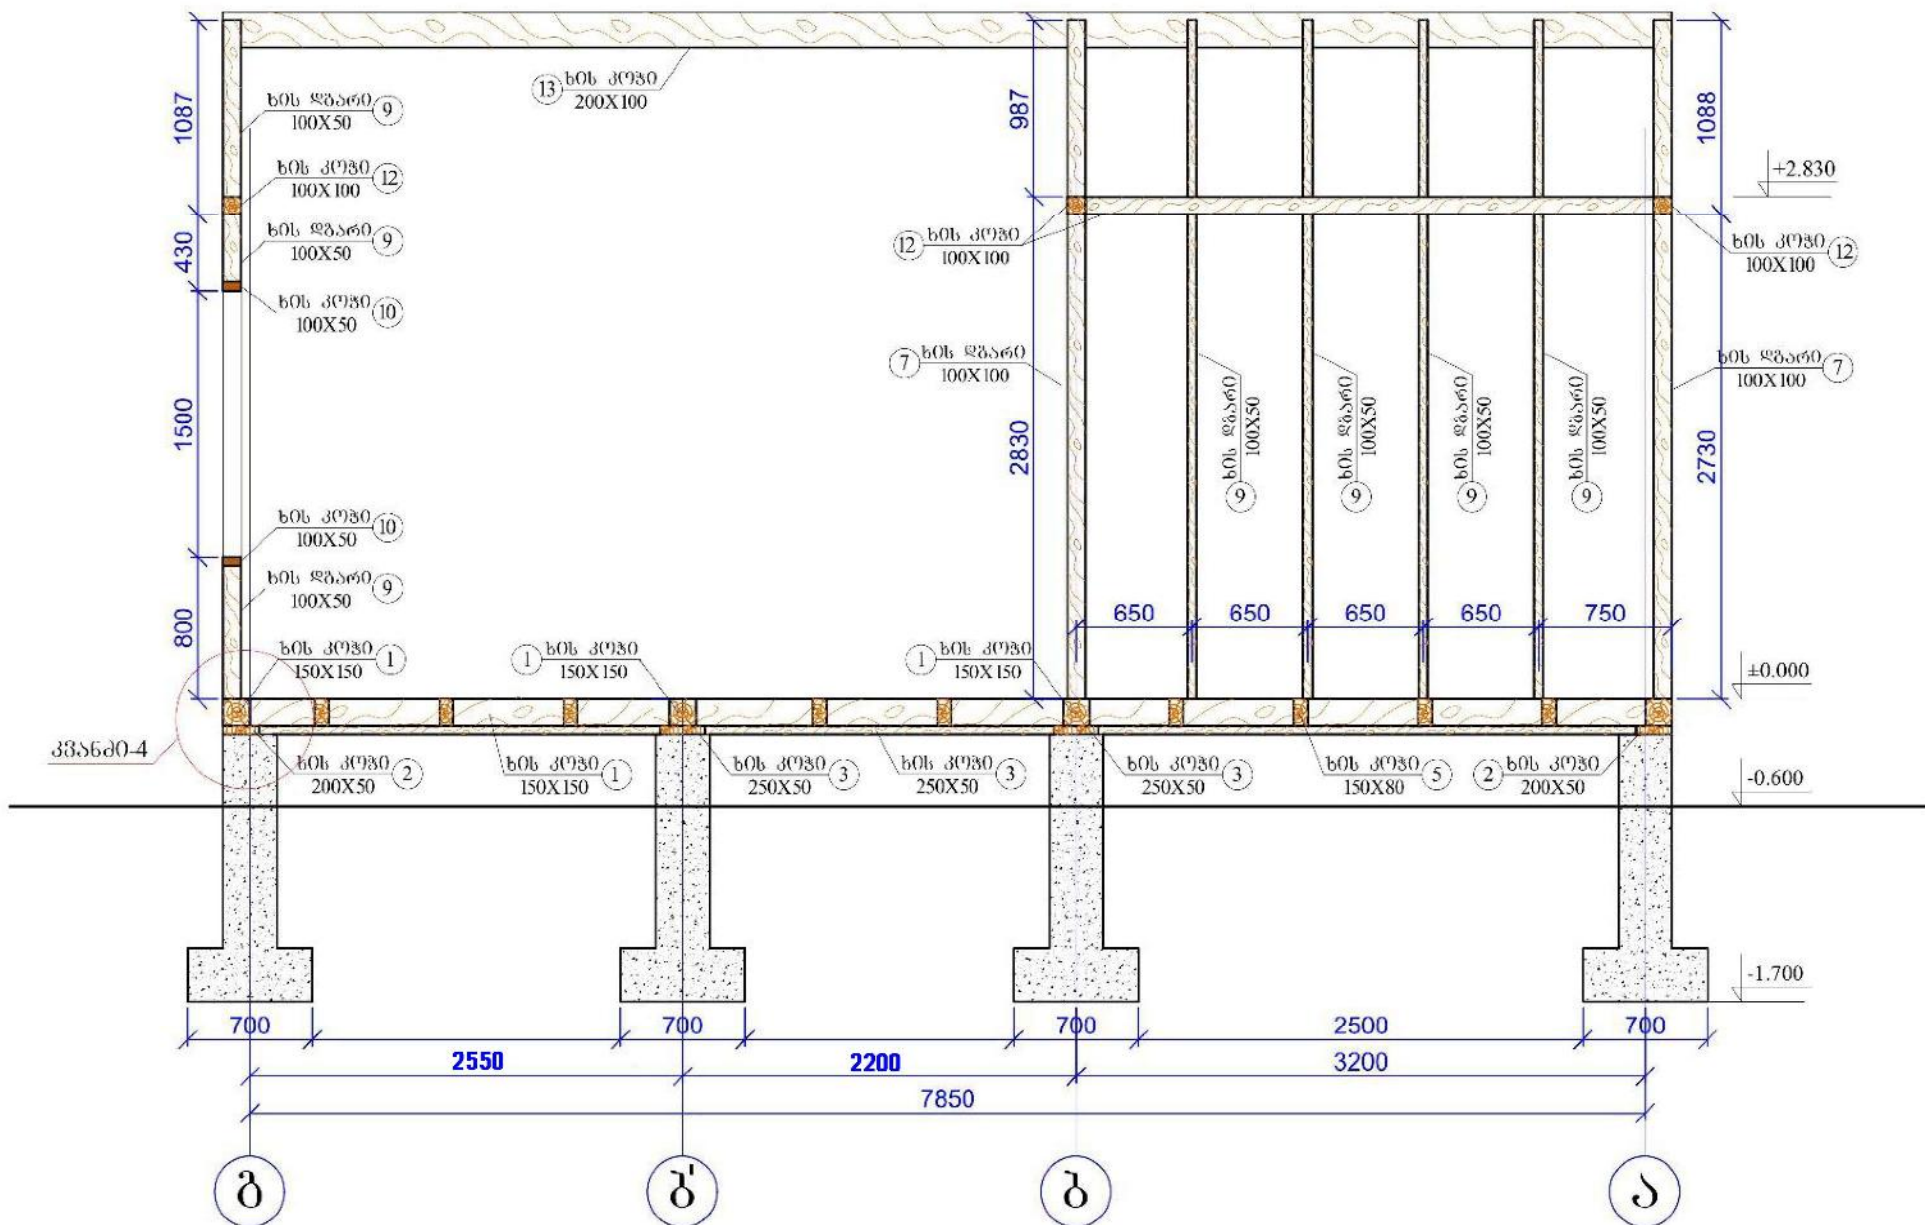


პპანძი-1

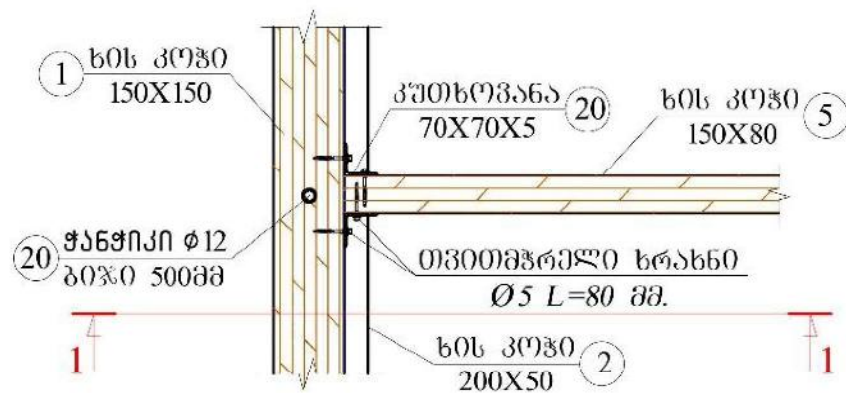


პპანძი-2

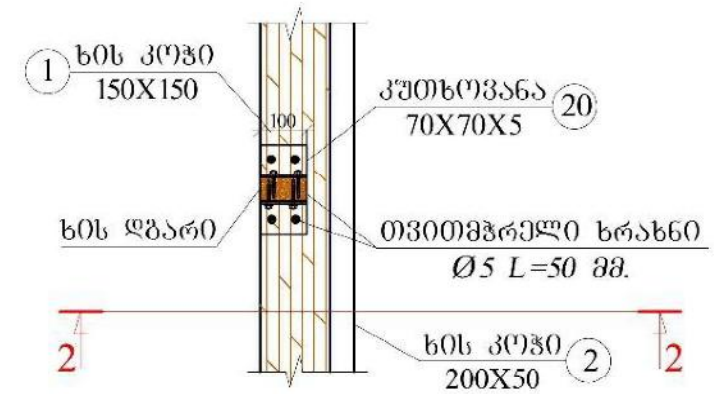


ჭრილი 1-1

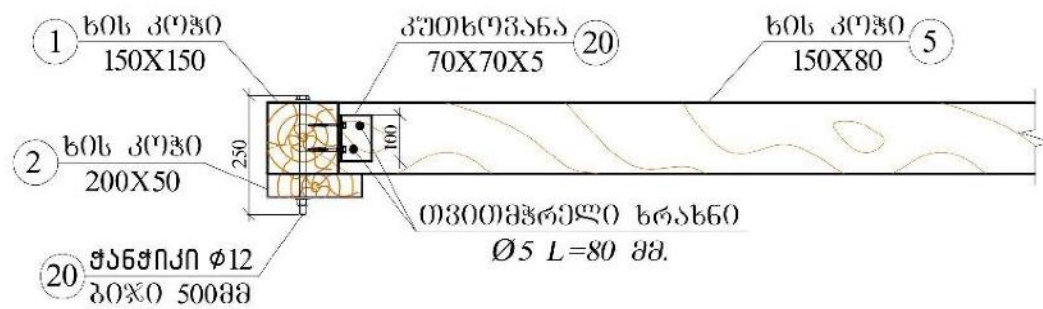


ჭრილი 2-2

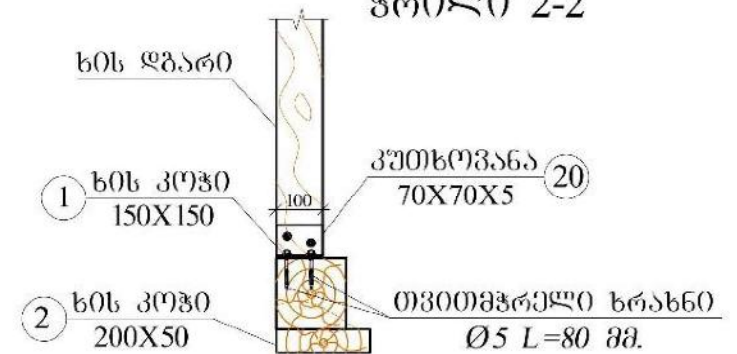


კვანძო-3

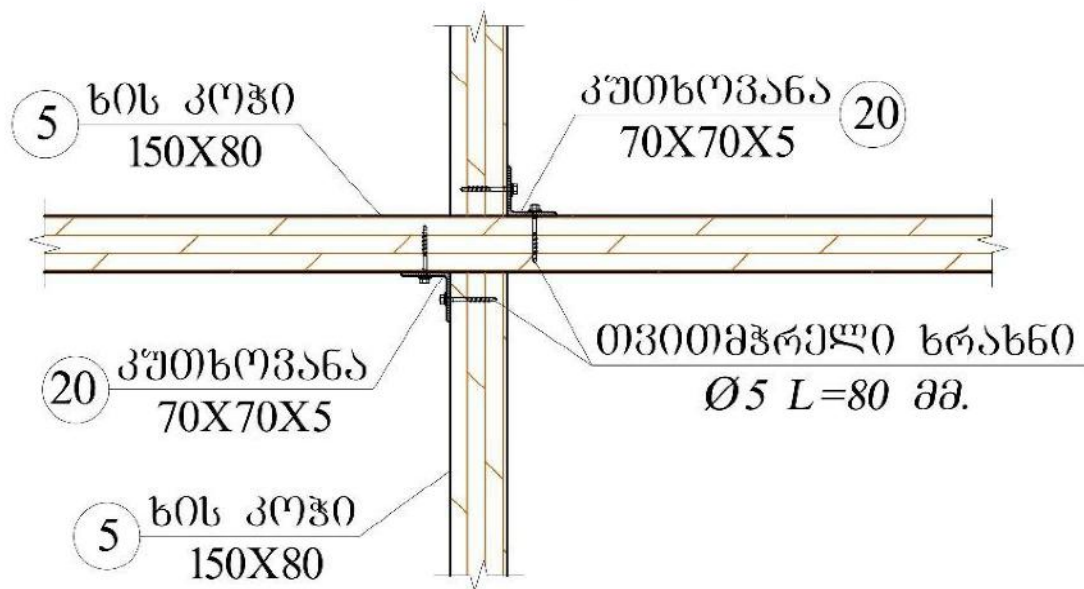


კვანძო-4

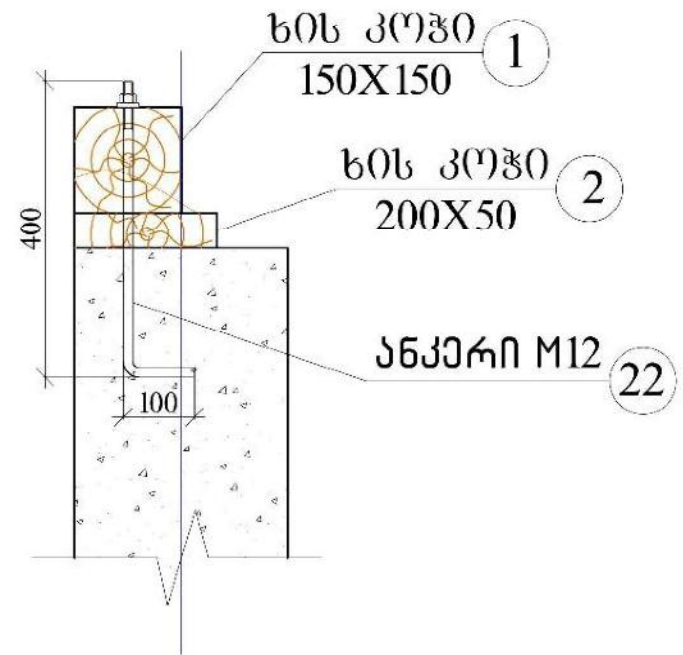

კიბის ჭრილი ა-ა

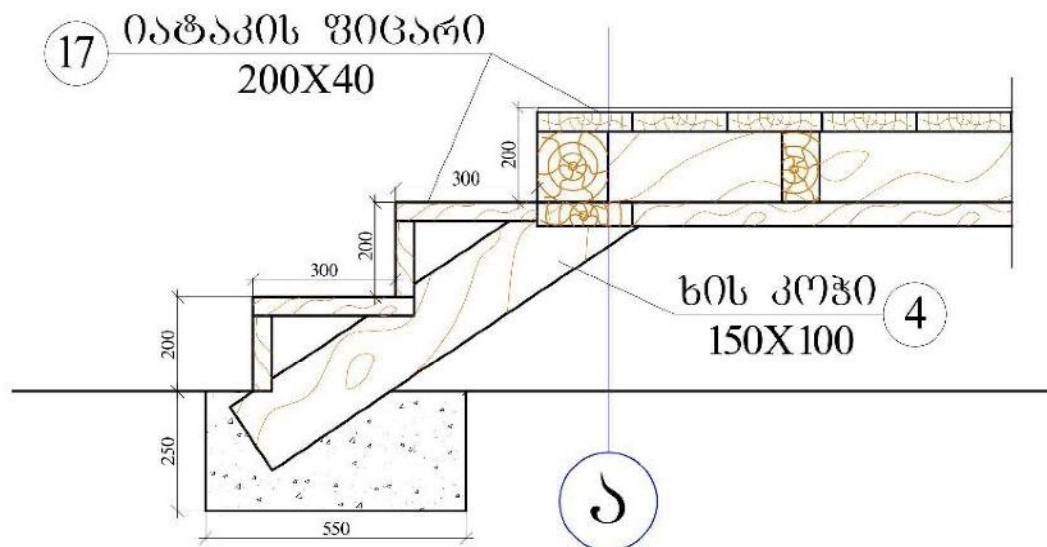


კვანძო-5

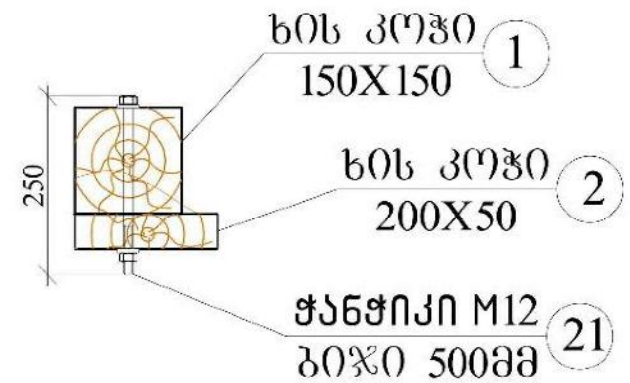


კონსტრუქციის დასახელება	ს ა მ ც ო შ ო კ ა ც ო ა						
	პოზ.	შსპოზი	Ø მმ	სიგრძე მმ	რადიუსი		საპირთ. სიგრძე მ
					პრთ.	სულ	საპირთ. მრც. (მ²)
ხის პარკები	1	ხის კოჭი	150X150	-	-	-	44.0
	2	ხის კოჭი	200X50	-	-	-	27.5
	3	ხის კოჭი	250X50	-	-	-	13.1
	4	ხის კოჭი	150X100	-	-	-	7.5
	5	ხის კოჭი	150X80	-	-	-	76.0
	6	ხის ღბარი	150X150	-	-	-	2.73
	7	ხის ღბარი	100X100	-	-	-	26.3
	8	ხის ღბარი	200X100	-	-	-	8.2
	9	ხის ღბარი	100X50	-	-	-	127.5
	10	ხის კოჭი	100X50	-	-	-	22.5
	11	ხის კოჭი	150X40	-	-	-	28.4
	12	ხის კოჭი	100X100	-	-	-	41.5
	13	ხის კოჭი	200X100	-	-	-	8.2
	14	სივრცე	160X80	-	-	-	81.6
	15	შეშვრის კოჭი	150X50	-	-	-	28.8
	16	ხისშრის შივარი	200X30	-	-	-	60.4
	17	ბაჭყალის შივარი	200X40	-	-	-	50.5
	18	ბაჭყალის OSB შენიშნა	20 მმ	-	-	-	48.0
	19	შენიშნის OSB შენიშნა	20 მმ	-	-	-	77.0
	20	კუთხე	L 70X70X5	100	-	450	45.0
	21	ხისპირა (ხისპირა) და სპეციალური	M 12	250	-	80	
	22	ხისპირა (ხისპირა) და სპეციალური	M 12	500	-	20	

დამხმარა შენობის მოწყობის გეგმა

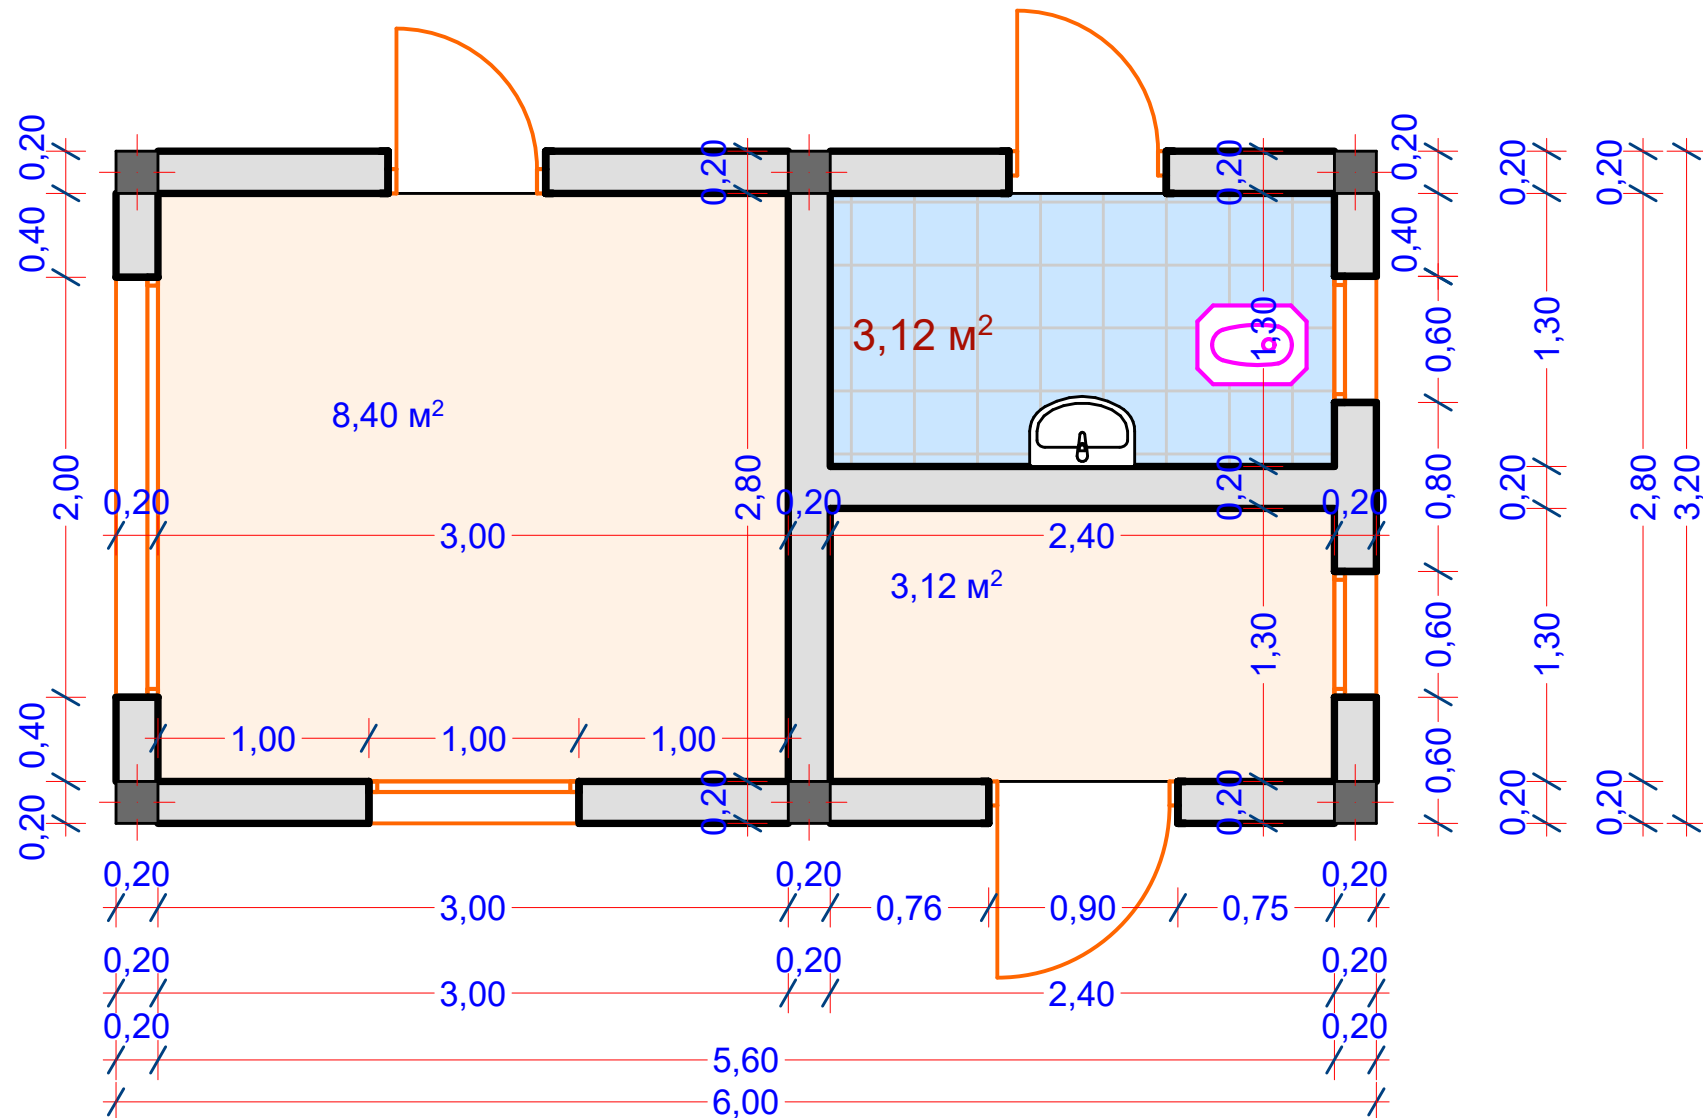


ხობაჯის მოწყობის საპროექტო გეგმა

მ 1:100

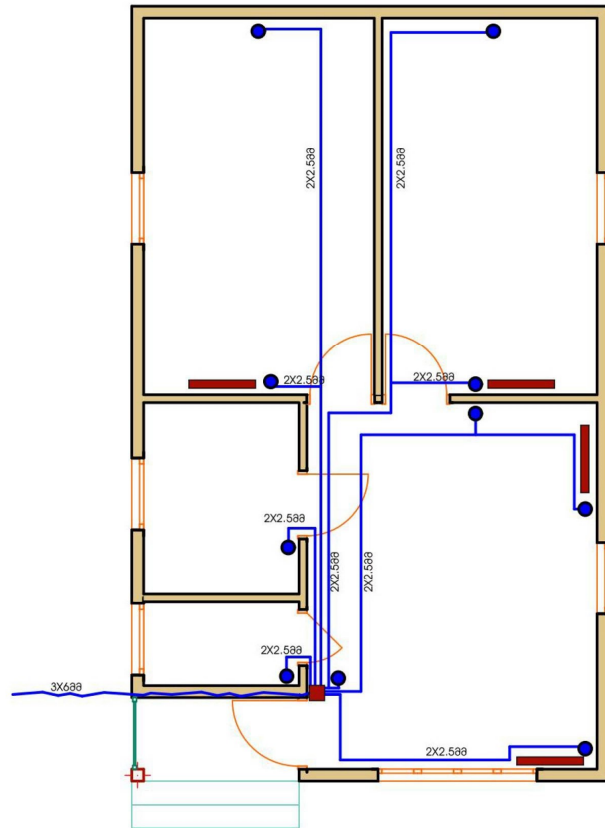

- როზეტი
- ელ.კაბიანობი

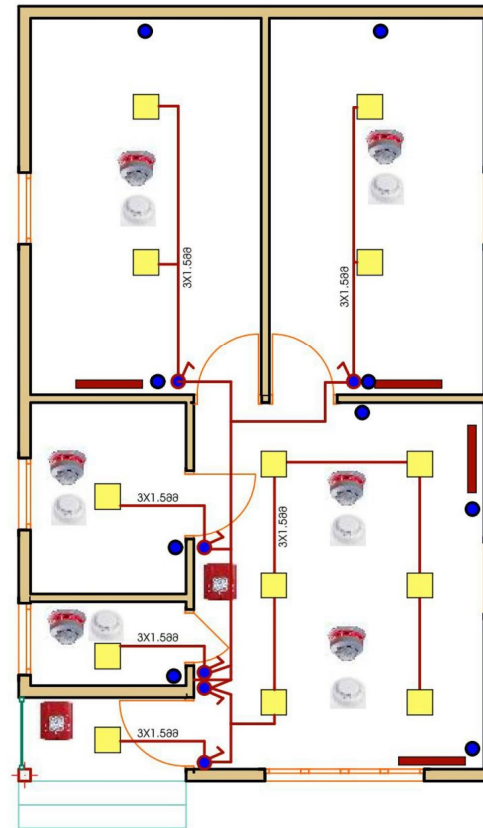

- სირანა
- დიოდური სანათი
- სითბური დაბეჭდორი
- ჰვამლის დაბეჭდორი

საპროექტო ღობე

0.30 მ

უქანბავი ეკალმავთული-
3 კორიზონტალური მწკრივი

0.20 მ

1.80 მ

მავთულბადის საჭივი უქანბავი
გაბიჩი (სისქით $\delta=5$ მმ;
3 კორიზონტალური მწკრივი)

მავთულბადე (სისქით $\delta=3$ მმ; უჯრა 40×40 მმ)
დაფარული ქარხნული ჰმვ მასალით

ღობის სამაგრი
მილკვადრატი $50 \times 50 \times 3$ მმ

2.0 მ

უნიფიკა: საჭიროების უმთხვევათი ღობის პერიმეტრზე კუთხეებში
მოყნოს დიამონალური სამაგრები მილკვადრატით $50 \times 50 \times 3$ მმ

საპროექტო ღამპიონის ნიმუში


შენიშვნა:

მიწის ზედათი სიმაღლით 4 მ.

მიწის სიღრმეში 1 მ.



5.0 მ

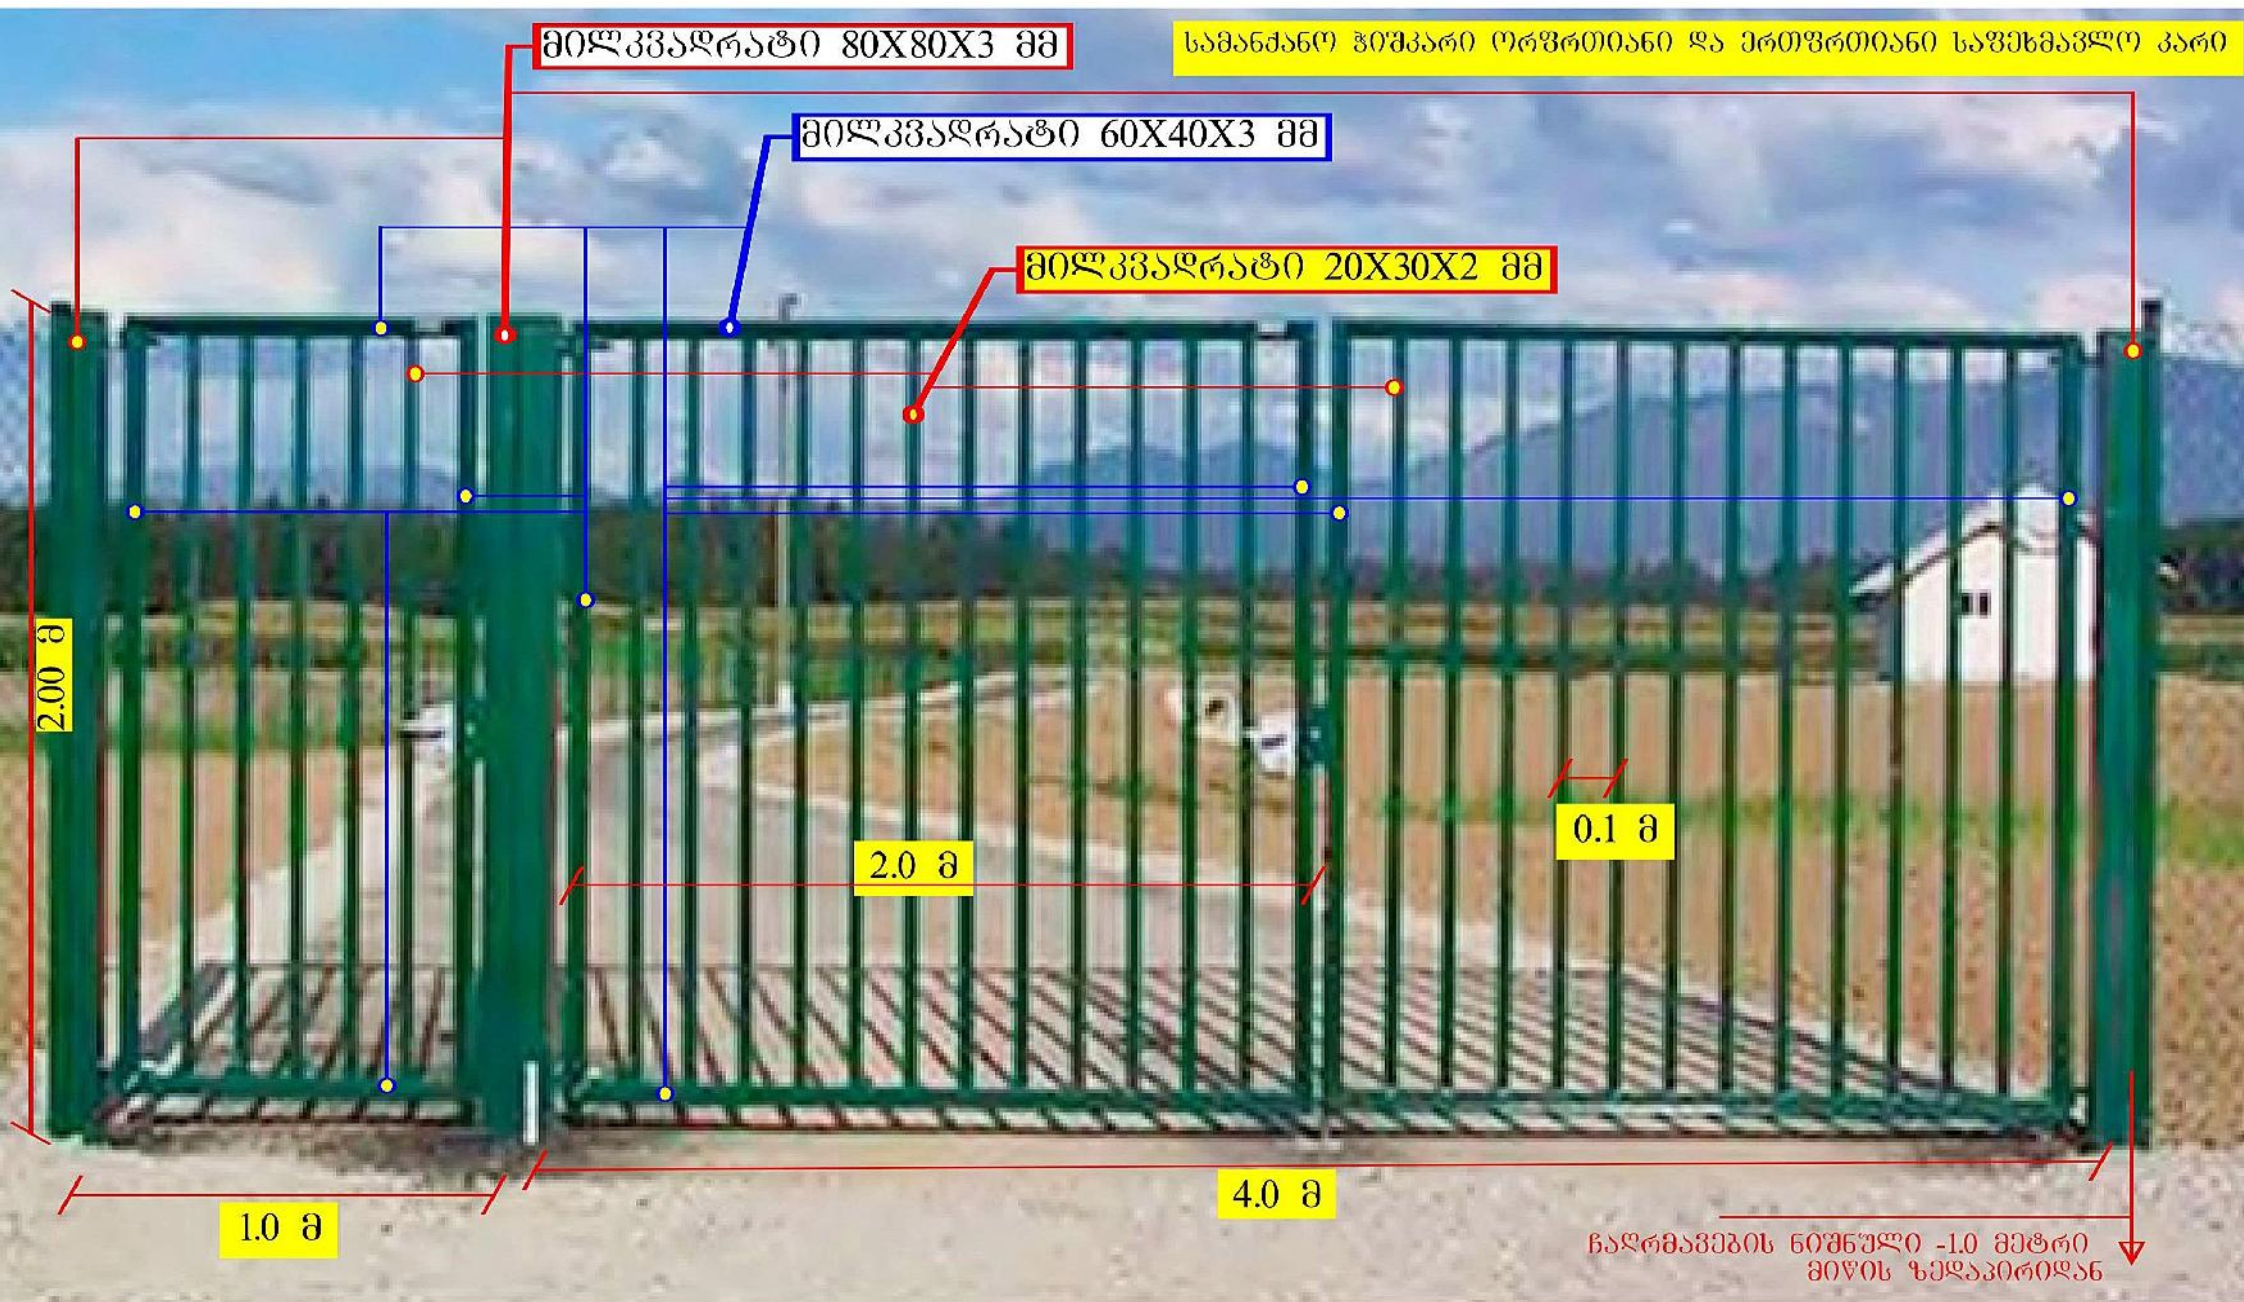

**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანცია)**

FG/22 004677

ვის: სსიპ ეროვნული საცყეო სააგენტოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს NEW GEORGIA-მ (ს/კ:431168265), შემდგომში "მიმწოდებელმა" სსიპ ეროვნული საცყეო სააგენტოს წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანცია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (მცხეთის საცყეო სამსახურის სატეროვებისათვის სოფელ ჭილაურაში საქმიანი ეზოსა და კოტეჯის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. SPA220002297) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანცია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 5 216,00 (ხუთი ათას ორასთექვსმეტი ლარი) და ვკისრულობთ უპირობო, გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ სსიპ ეროვნული საცყეო სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე 10 (ათი) სამუშაო დღის მანძილზე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2022 წლის 02 ნოემბრიდან 2023 წლის 06 მარცის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე სსიპ ეროვნული საცყეო სააგენტოს მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანცია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2022 წლის 23 აგვისტოს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 824/22 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

ბელა ოდოსაშვილი
გენერალური დირექტორის და
ფინანსური დირექტორის მინდობილი
პირი

თარიღი: 02.11.2022

